


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE

JULIO 2012

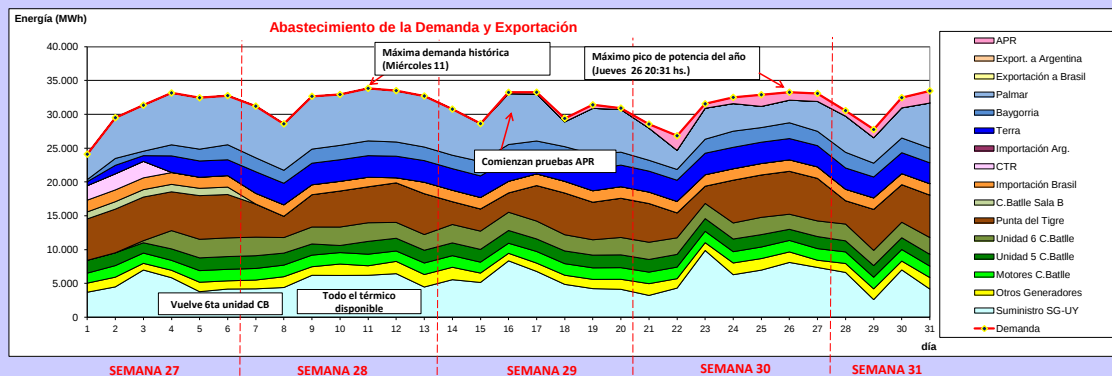

Semana 27 (30 de Junio al 6 de Julio)

Semana 23 (15 de Junio al 26 de Junio)
El Miércoles 4 de junio disponible la 6ta unidad luego de lavado y limpieza de Ljungström. Se superaron los 1700 MW de potencia de pico alcanzando el pico alto (jueves) y además la máxima demanda diaria se obtuvo el Miércoles con 33166 MWh (menos de 30 MWh de diferencia con el pico histórico). Hubieron precipitaciones en la cuenca media del río Uruguay de importancia relativa 30 – 50 mm. En el caso del río Negro las precipitaciones fueron muy importantes y produjeron un cambio importante en las reservas hidráulicas. Durante toda la semana se despacho todo el térmico disponible hasta CTR. Dicha central se sacó de servicio económico a partir del miércoles a 0 hs.
Se continuó con la importación desde Brasil por la convertidora de Rivera ya que la misma había sensiblemente de precio puesto que su origen fue de carbón (128,2 US\$/MWh).
Se cerró la semana con cota de Terra en 77.8 m habiendo comenzado la semana con una cota de 77.35 m y la semana 26 con 77.03 m

Semana 28 (7 al 13 de Julio)

La demanda neta fue de 225,5 GWh en la semana. El miércoles 11/7 se produjo un nuevo pico de potencia de 1735 MW (1704 MW el anterior y 1745 MW el histórico) y el máximo histórico de demanda diaria con 33.8 Gwh (33.2 Gwh el anterior).

No se produjeron precipitaciones durante la semana en la cuenca del río Negro mientras que en la cuenca del río Uruguay se produjeron precipitaciones moderadas en la media y alta. Durante toda la semana se despacho todo el turbo vapor a pleno, mientras que PTA se despachó modulando contra Salto Grande y luego de todo el río Negro a pleno.

Se comenzaron a realizar las pruebas de APR. Se continuó con la importación desde Brasil por la conversora de Rivera, salvo el jueves que se sacó de servicio para un trabajo en la red.

Se cerró la semana con cota en Terra de aprox. 78.2 m.

Se sacó Sala B de servicio debido a los aportes ocurridos en Salto Grande.

Semana 29 (14 al 20 de Julio)

La demanda neta fue de 217,6 GWh. No se produjeron precipitaciones durante la semana. Durante toda la semana se despacho las unidades 5ta, 6ta y motores de C. Batlle a pleno. PTA se despachó modulando contra Salto Grande y Palmar hasta el lunes que se comenzó con su despacho a pleno.

Se continuó con la importación desde Brasil por la convertidora de Rivera.

Se terminó con la cota de Terra en aprox. 78.0 m.

Semana 30 (21 al 27 de Julio)

La demanda neta fue de 218 GWh en la semana. El miércoles 25 se produjo un nuevo pico anual, 1740MW a las 20:26.

El jueves 26 se superó dicho valor con un pico de 1742 MW a las 20:31 hs. No se produjeron precipitaciones durante la semana.

Durante toda la semana se despachó las unidades 5ta, 6ta y motores de C. Battle a pleno. PTA se despachó a pleno, bajando su generación durante las pruebas de APR por restricción de la línea.

Se continuó con la importación desde Brasil por la convertidora de Rivera (el costo subió a 226 US\$/MWh)

Semana 31 (28 de Julio al 3 de Agosto)

La demanda fue del orden de los 222 GWh en la semana.

Se produjeron precipitaciones relevantes en las cuencas media y alta de Salto Grande (superiores a los 50mm) que producen un aumento muy importante de aportes (picos de 5500 m3/s).

Se produjeron precipitaciones relevantes en las cuencas media y alta de Salto Grande (superiores a los 50mm) que producen un aumento muy importante de aportes (picos). Las citadas lluvias produjeron un aumento muy significativo de las reservas hidráulicas de las represas brasileñas sobre el río Uruguay incluso con vertimiento en algunas.

Hubo lluvias escasas en Terra. Se despachó a pleno las unidades 5ta, 6ta y motores de C. Batlle, PTA y APB.

Se despachó Terra a pleno y Palmar y Salto Grande para 38 y 33m. Se continuó con la importación desde Brasil por la convertora de Rivera (costo 167 US\$/MWh)

El martes 31/7 la cota de terra se situó en 77,34 m y la demanda neta 124,2 GWh.

COMPOSICION DE LA DEMANDA Y GENERACION POR FUENTE

