



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

Domingo 3 de Octubre de 2010

Generación Térmica (MWh)		03-Oct
Central Battle		193
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		197
Central La Tablada		-1
Central P. del Tigre		-5
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.414
C. Baygorria		1.550
C. Palmar		5.408
C. Salto Grande		14.584
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Cemsa		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Rivera		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.055
TOTAL Generación (MWh)		25.198



Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	4.975
• Salto Grande	4.778
• Térmico (motores)	197
Exportación a Brasil	0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh) 20.223
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)


Demanda Programada (MWh) 21.460

Diferencia (MWh) -1.237
Ejecutada - Programada -5,76%



Abastecimiento de la demanda - Domingo 03/10/2010

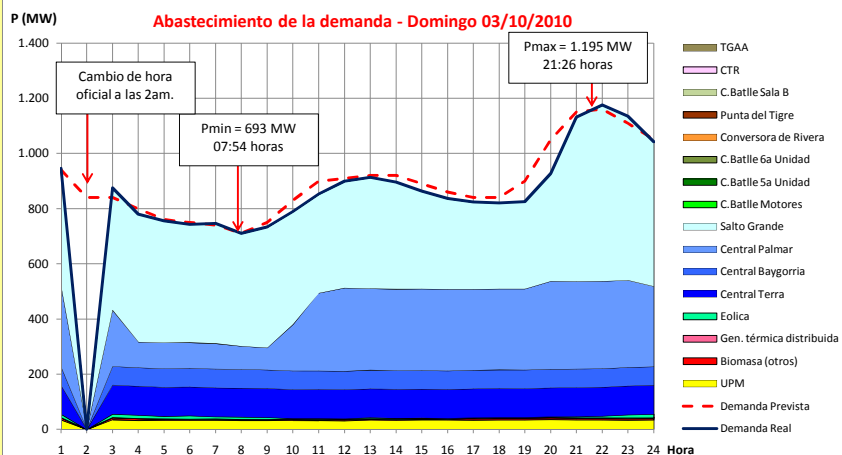

Composición de la Demanda S.I.N.





Generación por Fuente (Demanda + Expo.)



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)



Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución




COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,88	80,92
Baygorria	54,10	54,07
Palmar	40,11	40,04
SGU	35,20	35,73

Valores de Referencia (operación normal)

Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00



Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande



TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	484	464
Baygorria	621	573
Palmar	665	855
SGU	3.812	2.801

APORTES	Previstos	Ejecutados
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	131	463
Baygorria	0	-5
Palmar	0	6
Salto Grande	3.150	3.040

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	400	428
Baygorria	310	275
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó un 5,76% inferior a la prevista, coincidiendo con temperaturas relativamente elevadas. Cabe señalar que a las 2am se produjo el cambio de hora oficial, adelantándose una hora por lo que se perdió la generación de una hora, que incide en el porcentaje anterior. Se exportó a Argentina parte de la generación hidráulica de Salto Grande, aunque menos de lo previsto, y algo de motores de C.Battle a última hora del día.

Terra y Baygorria continúan en vertimiento y están generando con una máquina menos (en mantenimiento).
