

Generación Térmica (MWh)		05-Oct
Central Battle		2.871
• Sala B		-4
• 5a		1.768
• 6a		0
• Motores		1.107
Central La Tablada		-1
Central P. del Tigre		3.752
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.510
C. Baygorria		1.620
C. Palmar		6.038
C. Salto Grande		13.020
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Cemsa		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Rivera		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.369
TOTAL Generación (MWh)		31.181



Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		6.636
• Salto Grande		0
• Térmico (motores, 5a y PTI)		6.636
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	24.545
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	



Demanda Programada (MWh)	24.950
---------------------------------	---------------

Diferencia (MWh)	-405
Ejecutada - Programada	-1.62%


Abastecimiento de la demanda - Martes 05/10/2010

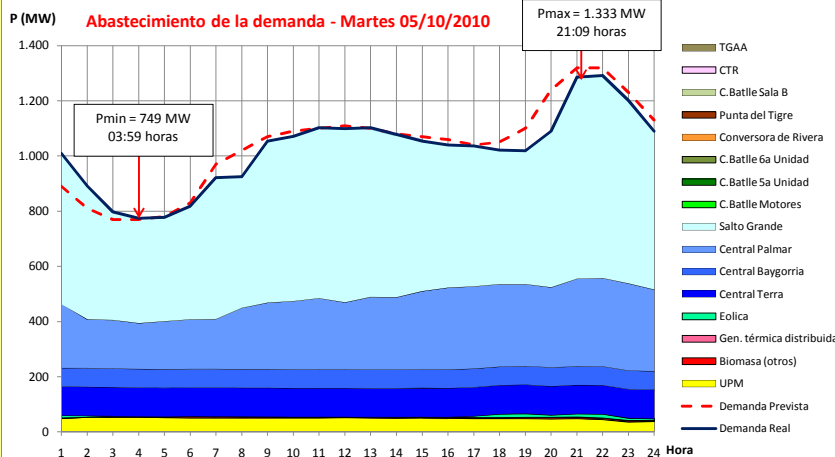

Composición de la Demanda S.I.N.





Generación por Fuente (Demanda + Expo.)



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)



Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución




COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,79	80,82
Baygorria	54,10	54,12
Palmar	39,97	39,98
SGU	35,83	35,90

Valores de Referencia (operación normal)

Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00



Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande



TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	494	483
Baygorria	593	585
Palmar	995	944
SGU	2.504	2.384

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	90	441
Baygorria	0	20
Palmar	0	10
Salto Grande	2.450	2.427



VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	400	384
Baygorria	340	276
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó apenas un 1,62% inferior a la prevista, coincidiendo con temperaturas relativamente elevadas. Se exportó a Argentina generación térmica de 5a de C. Battle durante todo el día, y de motores y Punta del Tigre a excepción de horas de madrugada (entre las 2 y 7am aprox.) La exportación de Punta del Tigre (5 máquinas) no estaba programada, pero finalmente Argentina confirmó su interés en tomar dicha energía. Se continúa con una cota vista en Salto Grande muy alta, superior a la argentina, y con cota de aprox. 40m en Palmar (cota objetivo, para no bajar el embalse). Terra y Baygorria continúan en vertimiento hasta el día de mañana (jueves) que se prevé el cierre total de vertederos y están generando con una máquina menos (en mantenim.).
