



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

Miércoles 6 de Octubre de 2010

Generación Térmica (MWh)		06-Oct
Central Battle		3.405
• Sala B		-4
• 5a		1.642
• 6a		633
• Motores		1.134
Central La Tablada		97
Central P. del Tigre		1.888
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.547
C. Baygorria		1.626
C. Palmar		5.780
C. Salto Grande		13.699
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Cemsa		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Rivera		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		863
TOTAL Generación (MWh)		29.906



Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		5.412
• Salto Grande		0
• Térmico (mot, 5a, 6a, PTI)		5.412
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh) 24.494
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)


Demanda Programada (MWh) 24.750

Diferencia (MWh)	-256
Ejecutada - Programada	-1.03%



Abastecimiento de la demanda - Miércoles 06/10/2010

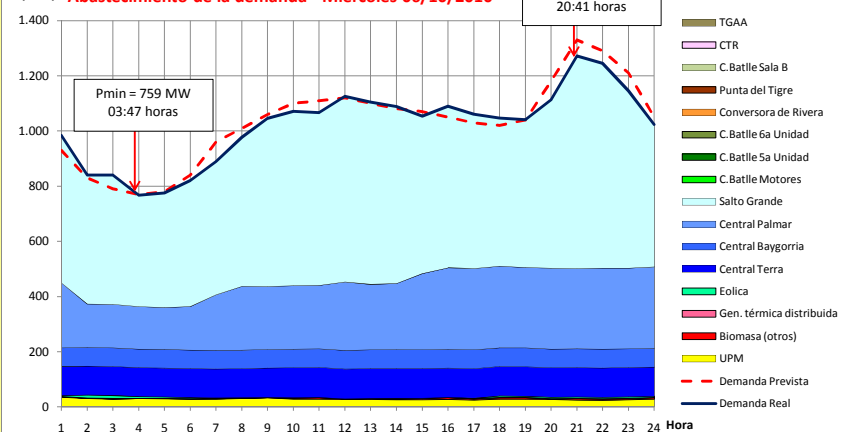

Composición de la Demanda S.I.N.





Generación por Fuente (Demanda + Expo.)



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)



Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución




COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,78	80,78
Baygorria	54,11	54,11
Palmar	39,90	39,90
SGU	35,83	35,80

Valores de Referencia (operación normal)

Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00



Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande



TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	494	486
Baygorria	593	585
Palmar	995	899
SGU	2.467	2.487

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	60	134
Baygorria	0	-15
Palmar	0	57
Salto Grande	2.175	1.996



VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	200	214
Baygorria	150	112
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó apenas un 1,03% inferior a la prevista, coincidiendo con temperaturas relativamente elevadas. Se exportó a Argentina generación térmica de 5a de C.Battle durante todo el día, 6a de C.Battle a partir de la hora 16, de motores y Punta del Tigre a excepción de horas de madrugada (entre las 2 y 7am aprox.). Punta de Tigre se dejó de exportar a partir de la hora 16 (coincidiendo con la entrada de 6a de C.Battle). Se exportó menos Punta del Tigre de lo previsto (se programó para todo el día), así como algo menos de motores. Se continúa con una cota vista en Salto Grande muy alta, superior a la argentina, y con cota de aprox. 40m en Palmar (cota objetivo, para no bajar el embalse). Terra cerró vertederos al mediodía y Baygorria en el día de ayer y están generando con una máquina menos (en mantenimiento).
