

Generación Térmica (MWh)	
Central Battle	-11
• Sala B	-4
• 5a	0
• 6a	0
• Motores	-7
Central La Tablada	-2
Central P. del Tigre	-8
Central Maldonado	0
Grupos Diesel	0
Generación Hidráulica (MWh)	
C.G. Terra	1.437
C. Baygorria	961
C. Palmar	2.705
C. Salto Grande	17.313
Importación (MWh)	
Argentina	0
• Cemsa	0
• Contingente	0
Brasil	0
• Rivera	0
• SADI	0
Otros Generadores (MWh)	
UPM + Gen. Distribuida	845
TOTAL Generación (MWh)	23.239



Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
• Salto Grande	0
• Térmico	0
Exportación a Brasil	0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	23.239
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh) 23.950

Diferencia (MWh)	-711
Ejecutada - Programada	-2,97%



Abastecimiento de la demanda - Sábado 09/10/2010

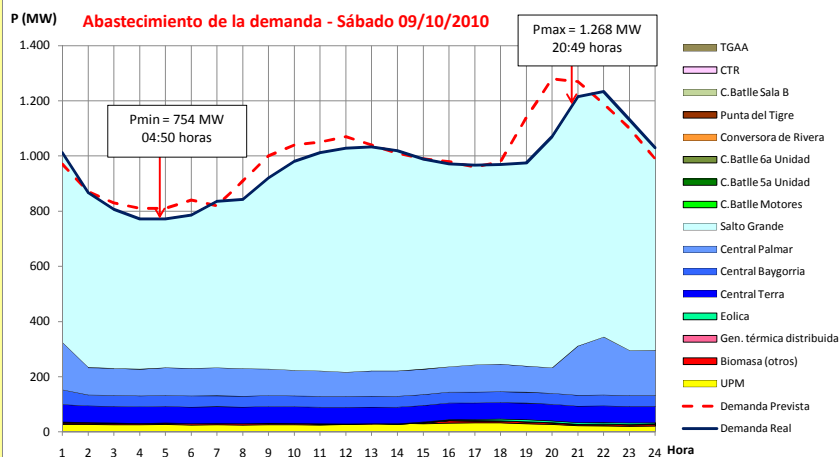

Composición de la Demanda S.I.N.





Generación por Fuente (Demanda + Expo.)



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)



Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución




COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,66	80,69
Baygorria	54,04	54,04
Palmar	39,75	39,82
SGU	35,46	35,38

Valores de Referencia (operación normal)

Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00



Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande



TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	282	268
Baygorria	339	325
Palmar	440	423
SGU	3.091	3.217

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	0	268
Baygorria	0	20
Palmar	0	98
Salto Grande	1.725	1.688

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó un 2,97% inferior a la prevista, coincidiendo con altas temperaturas registradas. No hubo exportaciones de energía a Argentina. CTM-SG solicitó que por razones de seguridad de manejo del lago la cota no supere los 35,32m. Se turbinó por tanto algo más de lo previsto en Salto Grande, obteniendo algo menos de energía, ya que la cota terminó algo por debajo de lo previsto. Argentina asimismo usó más de Salto Grande, terminando su cota vista 20 cm debajo de lo previsto. Terra y Palmar tuvieron más aportes que lo previsto y turbinaron algo menos de lo previsto, terminando entonces con la cota un poco por arriba de lo previsto. La máquina 3 de Terra volvió ayer de mantenimiento, y se prevé el lunes vuelva la máquina 3 de Baygorria. Todos los vertederos se encuentran cerrados.
