



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

Domingo 10 de Octubre de 2010





Generación Térmica (MWh)		10-Oct
Central Battle		-10
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		-7
Central La Tablada		-3
Central P. del Tigre		-6
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.388
C. Baygorria		1.437
C. Palmar		3.499
C. Salto Grande		12.575
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Cernsa		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Rivera		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		780
TOTAL Generación (MWh)		20.660

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Salto Grande		0
• Térmico		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh) 20.660
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)



Demanda Programada (MWh) 21.180

Diferencia (MWh) -520
Ejecutada - Programada -2,45%

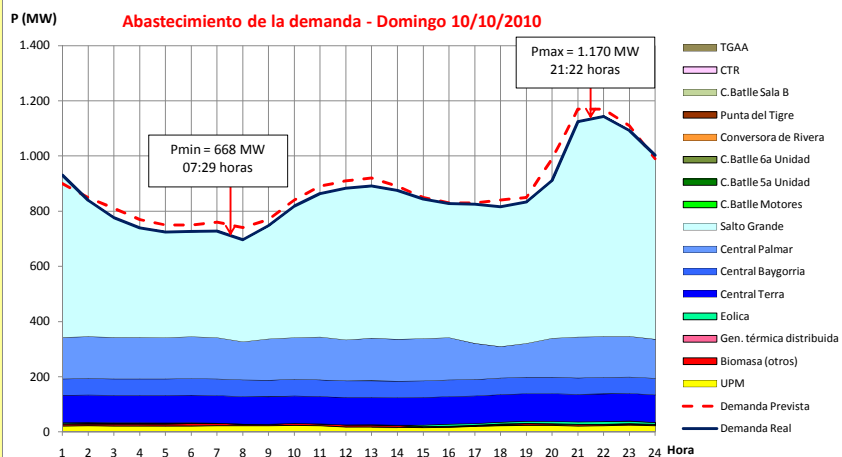



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución




Represa	Cota FINAL (m)	Prevista (m)	Ejecutada (m)
Terra	80,63	80,68	80,68
Baygorria	53,98	53,99	53,99
Palmar	39,74	39,80	39,80
SGU	35,35	35,22	35,22

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00




Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande



TURBINADO		
Represa	Previsto (m³/s)	Ejecutado (m³/s)
Terra	471	445
Baygorria	508	491
Palmar	595	542
SGU	2.203	2.306

APORTES		
Represa	Previstos (m³/s)	Reales (m³/s)
Terra	0	305
Baygorria	0	-16
Palmar	0	-20
Salto Grande	1.625	1.424



VERTIDO		
Represa	Previsto (m³/s)	Ejecutado (m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó un 2,45% inferior a la prevista, coincidiendo con altas temperaturas registradas. No hubo exportaciones de energía a Argentina. CTM-SG solicitó que por razones de seguridad de manejo del lago la cota no supere los 35,34m. Hubo aportes algo menores a los previstos en Salto Grande, y se turbinó algo más de lo previsto, permitiendo que la cota vista uruguaya prácticamente igualara la argentina. Argentina asimismo usó más de Salto Grande, terminando su cota vista 10 cm debajo de lo previsto. Terra tuvo más aportes que los previstos, y aunque turbinó algo menos de lo previsto, terminó con la cota un poco por arriba de lo previsto. Baygorria continuó generando con una máquina menos (en mantenimiento), se prevé que vuelva mañana. Todos los vertederos se encuentran cerrados.
