




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


Jueves 24 de febrero de 2011

Generación Térmica (MWh)		24-feb
Central Battle		4.698
• Sala B		826
• 5a		0
• 6a		2.677
• Motores		1.196
Central La Tablada		-2
Central P. del Tigre		3.469
Central Maldonado		1
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		289
C. Baygorria		164
C. Palmar		0
C. Salto Grande		17.787
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Rivera		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		176
TOTAL Generación (MWh)		26.582
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		26.582
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		27.790
Diferencia (MWh)		-1.208
Ejecutada - Programada		-4,35%


P (MW) Abastecimiento de la demanda - Jueves 24/02/2011

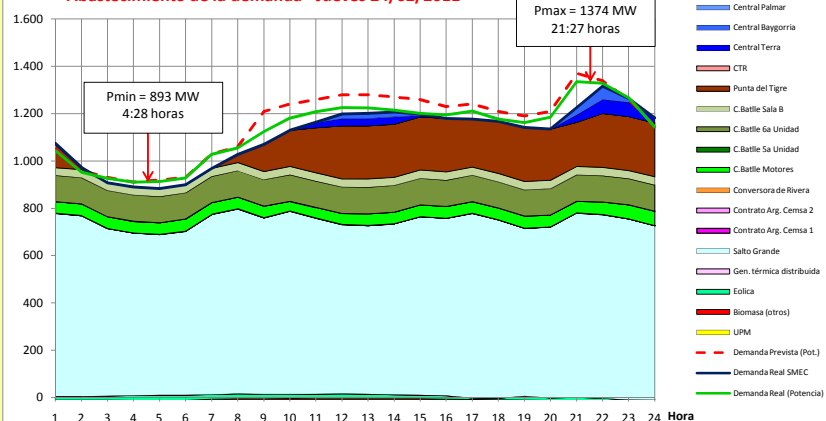


T (°C) Temperatura registrada (Montevideo - Melilla)




Composición de la Demanda S.I.N.



E (MWh) Despacho Programado vs Ejecutado por Fuente





Generación por Fuente (Demanda + Expo.)



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)



Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución




COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	77,59	77,51
Baygorria	53,89	53,89
Palmar	37,90	37,95
SGU	32,78	33,07

Valores de Referencia (operación normal)

Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00




Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande



TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	86	60
Baygorria	97	54
Palmar	0	0
SGU	3.716	3.342

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-782
Baygorria	0	-18
Palmar	0	-151
SGU	1.937	1.865



VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
Salto Grande	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó 4,35% inferior a la prevista pudiéndose atribuir este fenómeno a la baja en la temperatura respecto a días anteriores. Se registró una buena generación eólica, de aprox. 16,7 MW medios (particularmente sobre horas de la mañana) y generación con biomasa por aprox. 8,1 MW medios (6,85 MW de Bioener). Galofer continúa con la reparación de sus torres de enfriamiento e informa que volverá a generar el fin de semana del 5 de Marzo. UPM tampoco generó y estaría retornando en las primeras horas del viernes. Tampoco hubo generación térmica distribuida (Zendaleather sigue sin suministro de gas). Se generó con Río Negro para cubrir el pico de demanda. Salto Grande continuó generando a pleno.
