




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


lunes 28 de febrero de 2011

Generación Térmica (MWh)		28-feb
Central Battle		4.674
• Sala B		613
• 5a		0
• 6a		2.634
• Motores		1.427
Central La Tablada		-1
Central P. del Tigre		2.366
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		698
C. Baygorria		552
C. Palmar		0
C. Salto Grande		16.922
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		509
• Rivera		509
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.049
TOTAL Generación (MWh)		26.769
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		26.769
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		26.970
Diferencia (MWh)		-201
Ejecutada - Programada		-0,75%


P (MW) Abastecimiento de la demanda - Lunes 28/02/2011

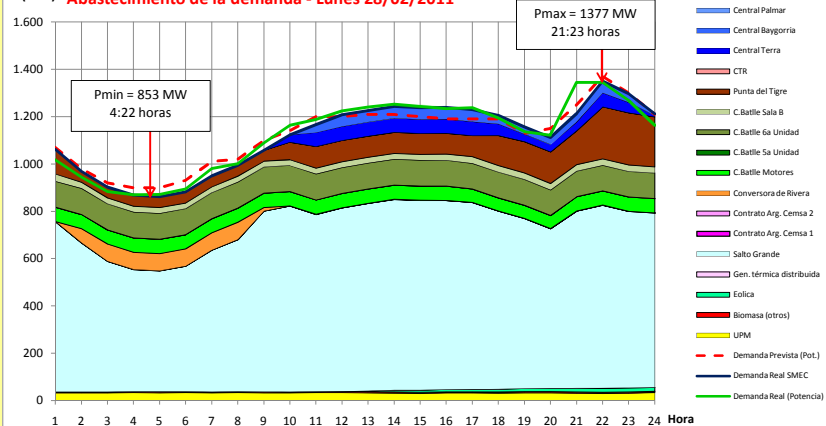



T (°C) Temperatura registrada (Montevideo - Melilla)



Composición de la Demanda S.I.N.





Generación por Fuente (Demanda + Expo.)





EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución




COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	77,50	77,56
Baygorria	53,90	53,81
Palmar	38,03	38,06
SGU	31,07	31,97

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00




Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande



TURBINADO		
Represa	Previsto (m3/s)	Ejecutado (m3/s)
Terra	107	148
Baygorria	136	171
Palmar	0	0
SGU	3.652	3.214

APORTES		
Represa	Previstos (m3/s)	Reales (m3/s)
Terra	24	254
Baygorria	64	11
Palmar	64	-14
SGU	2.250	2.137



VERTIDO		
Represa	Previsto (m3/s)	Ejecutado (m3/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
Salto Grande	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó apenas un 0,75% inferior a la prevista mientras que la temperatura mantuvo la tendencia de los días anteriores. Se registró una generación eólica, de aprox. 6,4 MW medios y generación con biomasa por aprox. 37,9 MW medios (3,4 MW de Bioener, 32,6 MW de UPM 1,8 MW de Weyerhaeuser). Galofer continúa con la reparación de sus torres de enfriamiento y estaría retornando en el fin de semana del 5 de Marzo. No hubo generación térmica distribuida. Se generó con Río Negro en horas de la tarde y para cubrir el pico de la demanda. Se importó energía de Brasil a través de Rivera en las horas valle. La 5ta unidad de la central Battle se encontró indisponible por mantenimiento.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata
