



# INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

jueves 3 de marzo de 2011

| Generación Térmica (MWh)    |  | 03-mar   |
|-----------------------------|--|----------|
| Central Battle              |  | 5.072    |
| • Sala B                    |  | 1.123    |
| • 5a                        |  | 0        |
| • 6a                        |  | 2.516    |
| • Motores                   |  | 1.432    |
| Central La Tablada          |  | 2.250    |
| Central P. del Tigre        |  | 1.244    |
| Central Maldonado           |  | 0        |
| Grupos Diesel               |  | 0        |
| Generación Hidráulica (MWh) |  |          |
| C.G. Terra                  |  | 1.426    |
| C. Baygorria                |  | 719      |
| C. Palmar                   |  | 771      |
| C. Salto Grande             |  | 14.506   |
| Importación (MWh)           |  | Por País |
| Argentina                   |  | 0        |
| • Contrato                  |  | 0        |
| • Contingente               |  | 0        |
| Brasil                      |  | 362      |
| • Rivera                    |  | 362      |
| • SADI                      |  | 0        |
| Otros Generadores (MWh)     |  |          |
| UPM + Gen. Distribuida      |  | 1.016    |
| TOTAL Generación (MWh)      |  | 27.365   |






| Exportación (MWh)    |  |   |
|----------------------|--|---|
| Exportación a Arg.   |  | 0 |
| • Hidráulica         |  | 0 |
| • Térmica            |  | 0 |
| Exportación a Brasil |  | 0 |

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh) 27.365  
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)

Demanda Programada (MWh) 27.000



Diferencia (MWh) 365  
Ejecutada - Programada 1,35%

## Abastecimiento de la demanda - Jueves 03/03/2011

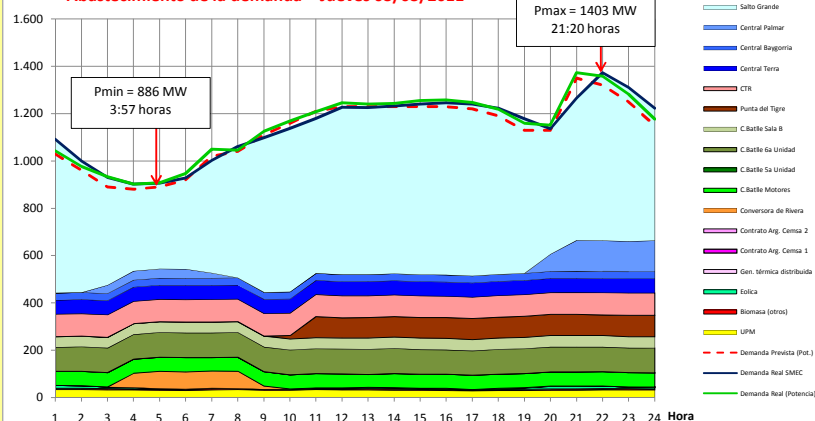

## EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)


### Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución




| COTA FINAL | Prevista | Ejecutada |
|------------|----------|-----------|
| Represa    | (m)      | (m)       |
| Terra      | 77,58    | 77,46     |
| Baygorria  | 53,78    | 53,89     |
| Palmar     | 38,09    | 38,11     |
| SGU        | 31,44    | 31,46     |

### Valores de Referencia (operación normal)

| Represa      | Cota Min m | Cota Max m |
|--------------|------------|------------|
| Terra        | 70,00      | 80,70      |
| Baygorria    | 53,00      | 54,50      |
| Palmar       | 36,00      | 40,00      |
| Salto Grande | 30,00      | 35,00      |




### Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande



| TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
|-----------|----------|-----------|
| Represa   | (m³/s)   | (m³/s)    |
| Terra     | 303      | 379       |
| Baygorria | 225      | 500       |
| Palmar    | 105      | 890       |
| SGU       | 2.890    | 2.656     |

| APORTES   | Previstos | Reales |
|-----------|-----------|--------|
| Represa   | (m³/s)    | (m³/s) |
| Terra     | 18        | -220   |
| Baygorria | 0         | 11     |
| Palmar    | 20        | -1     |
| SGU       | 2.800     | 2.648  |



| VERTIDO      | Previsto | Ejecutado |
|--------------|----------|-----------|
| Represa      | (m³/s)   | (m³/s)    |
| Terra        | 0        | 0         |
| Baygorria    | 0        | 0         |
| Palmar       | 0        | 0         |
| Salto Grande | 0        | 0         |

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

## OBSERVACIONES

La demanda resultó apenas un 1,35 % superior a la prevista la temperatura mostró un leve aumento con respecto a los días anteriores. Se registró una generación eólica, de aprox. 5,7 MW medios y generación con biomasa por aprox. 37,2 MW medios (3,4 MW de Bioener, 32,1 MW de UPM 1,7 MW de Weyerheuser). Gálfor continúa con la reparación de sus torres de enfriamiento y estaría retornando en el fin de semana del 5 de Marzo. No hubo generación térmica distribuida (por problemas mecánicos Zendaleather retornaría la siguiente semana). Se importó energía de Brasil a través de Rivera en las horas valle. No se prevé que la 5ta unidad de la Central Battle pueda estar disponible en el mediano plazo. Debido a problemas con la planta de purificación de agua para la central Punta del Tigre, la misma (cuyo despacho previsto era de 5 máquinas a pleno) se sacó de servicio próximo a la medianoche de ayer, adelantándose el despacho de Río Negro (previsto inicialmente a partir del viernes) para el día de hoy (aprox. 90 MW medios Terra+Baygorria). A partir de la hora 10 pudo restablecerse el despacho de 2 máquinas de PTA.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata
