




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


domingo 6 de marzo de 2011

Generación Térmica (MWh)		06-mar
Central Batlle		5.006
• Sala B		1.149
• 5a		0
• 6a		2.452
• Motores		1.405
Central La Tablada		2.728
Central P. del Tigre		2.221
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		1.127
C. Baygorria		826
C. Palmar		1.354
C. Salto Grande		8.134
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Rivera		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.223
TOTAL Generación (MWh)		22.618
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		22.618
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		23.180
Diferencia (MWh)		-562
Ejecutada - Programada		-2,43%



P (MW) Abastecimiento de la demanda - Domingo 6/03/2011

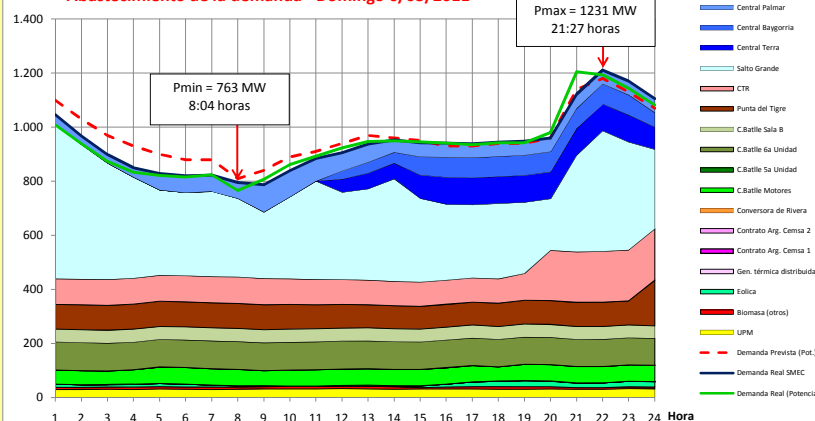


T (°C) Temperatura registrada (Montevideo - Melilla)



Composición de la Demanda S.I.N.




Generación por Fuente (Demanda + Expo.)



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución




COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	77,55	77,39
Baygorria	53,77	53,73
Palmar	38,04	37,93
SGU	32,79	32,58

Valores de Referencia (operación normal)

Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00




Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande



TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	240
Baygorria	0	255
Palmar	0	218
SGU	1.346	1.382

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-175
Baygorria	0	-21
Palmar	0	-37
SGU	2.525	2.477



VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
Salto Grande	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó un 2,43% inferior a la prevista. Se registró una generación eólica de aprox. 11,3 MW medios hacia el final del día, y generación con biomasa por aprox. 40 MW medios (3,5 MW de Bioener, 31,5 MW de UPM 2 MW de Weyerhaeuser, 3 MW de Galofer). No hubo generación térmica distribuida (Zendaeather retornaría en el correr de esta semana). La planta purificadora de agua de Punta del Tigre continúa con problemas, por lo que solo se dispone de la planta secundaria que abastece hasta 2 máquinas de PTA. La generación de las restantes 3 máquinas se sustituye con Río Negro como estaba previsto. No se prevé que el repuesto llegue hasta miércoles o jueves. En el día de ayer entre las horas 15 y 21 la central entró con las 5 máquinas y se sacó Río Negro pero la reparación no resultó exitosa.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata
