



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 7 de octubre de 2011

Generación Térmica (MWh)		07-oct
Central Battle		1.494
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		282
• Motores		1.216
Central La Tablada		-3
Central P. del Tigre		-7
Central Maldonado		18
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		0
C. Baygorria		1.263
C. Palmar		5.137
C. Salto Grande		16.770
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		1.738
• Rivera		1.738
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		554
TOTAL Generación (MWh)		26.964



Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	26.964
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	26.400
--------------------------	--------

Diferencia (MWh)	564
Ejecutada - Programada	2,14%


Abastecimiento de la demanda - Viernes 07/10/2011

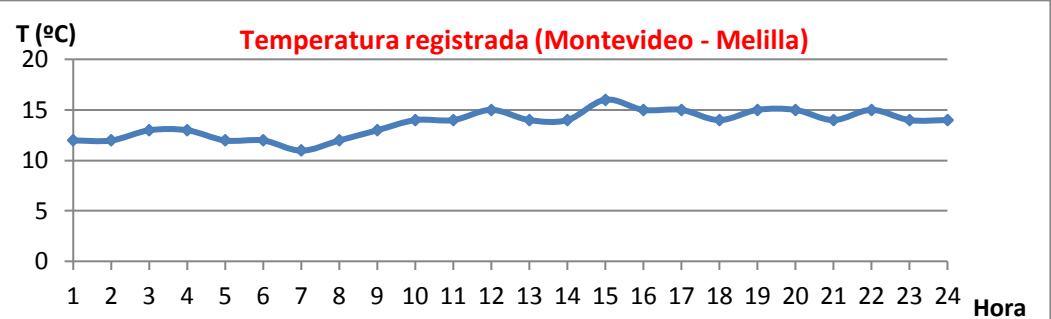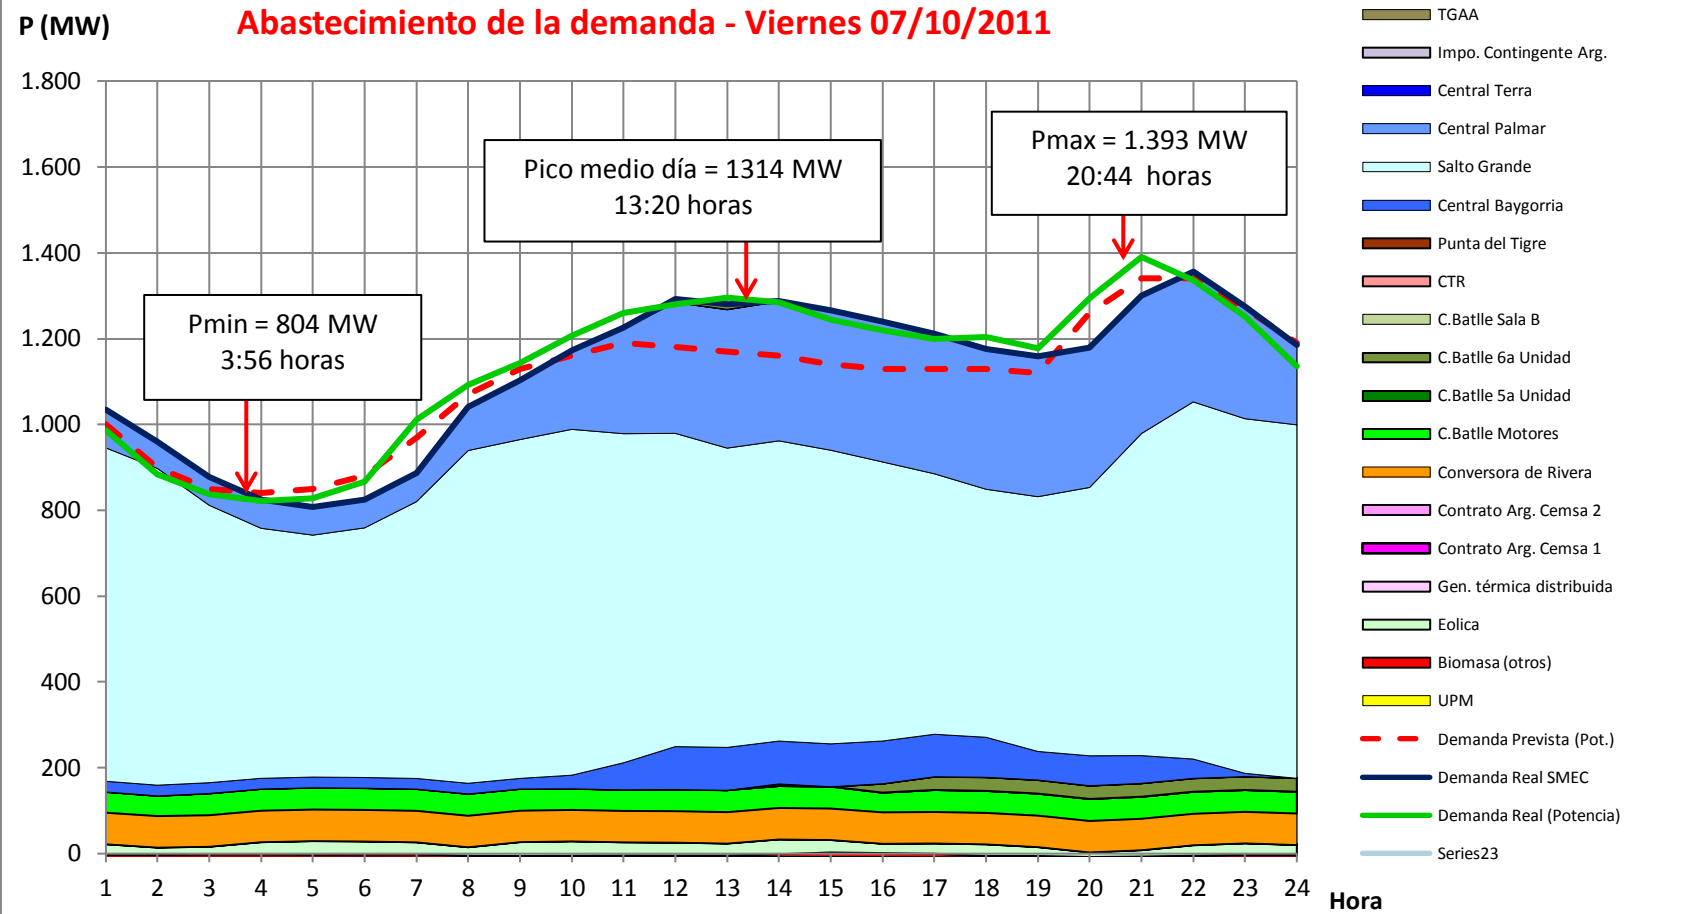

Composición de la Demanda S.I.N.


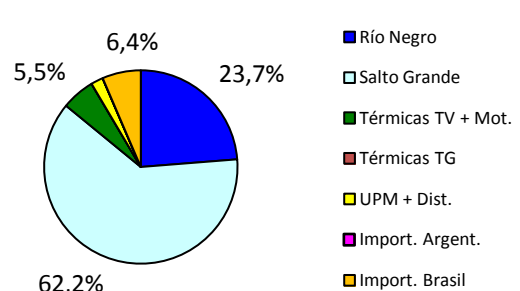


Generación por Fuente (Demanda + Expo.)

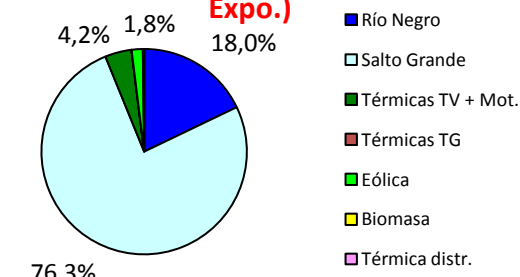

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

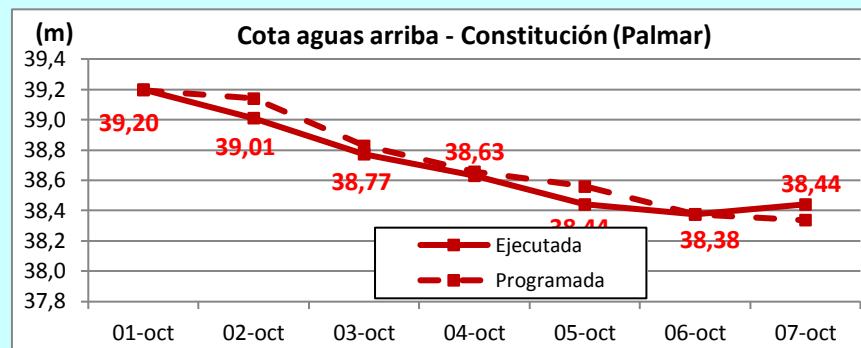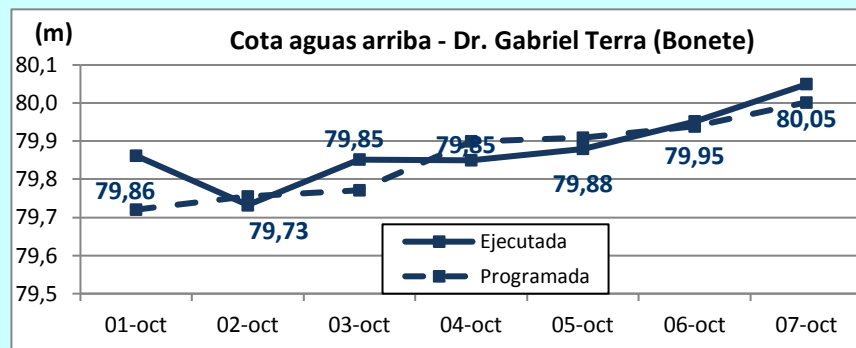


COTA FINAL	Prevista (m)	Ejecutada (m)
Represa		
Terra	80,00	80,05
Baygorria	53,46	53,43
Palmar	38,34	38,44
SGU	32,82	32,95


Valores de Referencia (operación normal)

Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00


Turbinado, Vertido y Aportes - Dr. Gabriel Terra (Bonete)

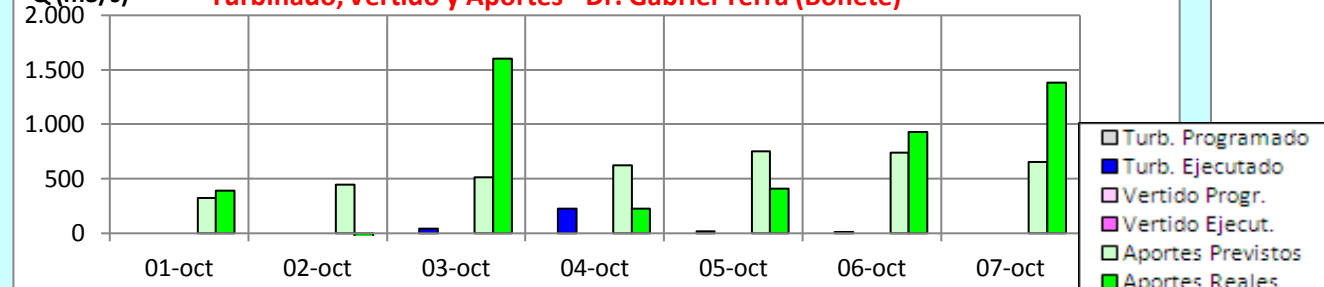

Turbinado, Vertido y Aportes - Constitución (Palmar)

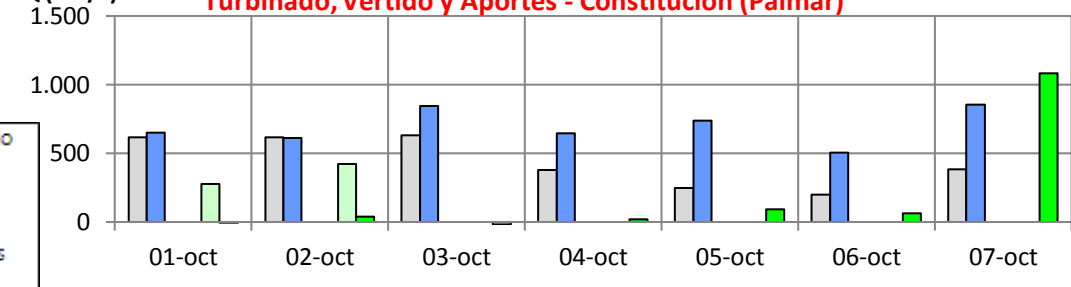


Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

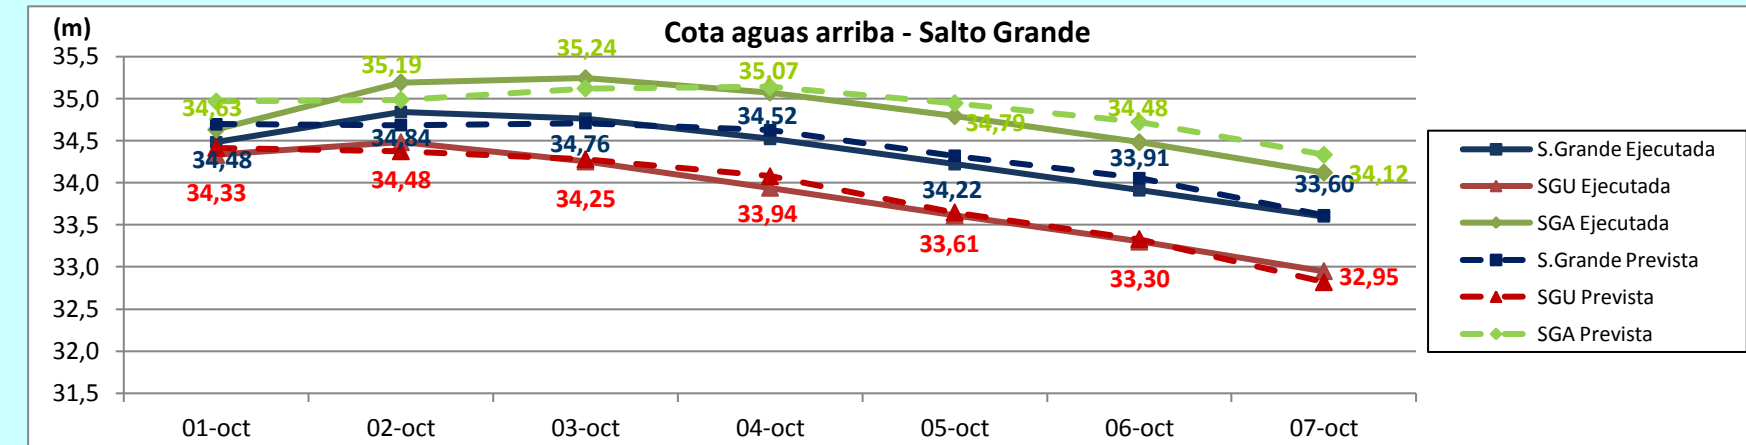

TURBINADO	Previsto (m3/s)	Ejecutado (m3/s)
Represa		
Terra	0	0
Baygorria	261	418
Palmar	386	857
SGU	3.561	3.339

APORTES	Previstos (m3/s)	Reales (m3/s)
Represa		
Terra	651	1.380
Baygorria	0	138
Palmar	0	1.085
SGU	2.325	2.468

Turbinado, Vertido y Aportes - Salto Grande Uruguay

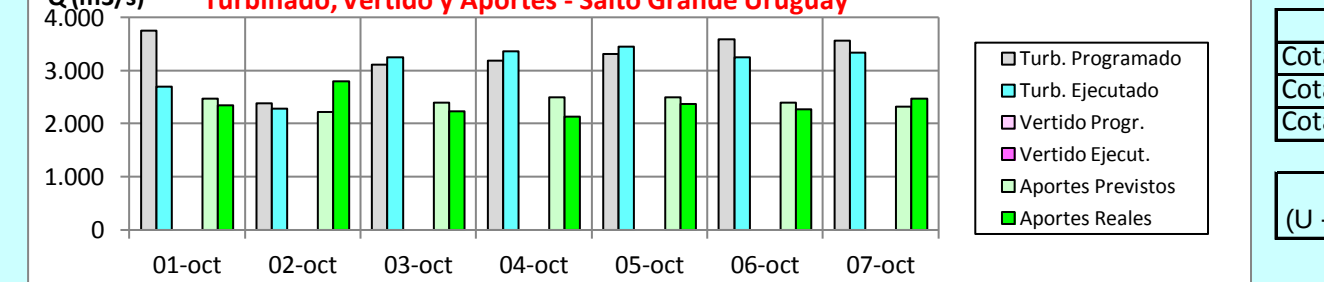

VALORES CTM

Cotas	(m)
Cota Vista Uru	32,95
Cota Vista Arg	34,12
Cota real	33,60

Dif. Energ. (U - A) ACUMULADO	(MWh)
	-22.694

VERTIDO	Previsto (m3/s)	Ejecutado (m3/s)
Represa		
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó 2,1% superior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 26,2 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 5,9 MW medios, de los cuales: 1,4 MW de Weyerhaeuser; 1,7 MW de Alur; 2,8 MW de Bioener S.A.
No hubo generación térmica distribuida
Se convocó energía de Argentina. La misma no estuvo disponible.
Se importaron aprox. 1738 MWh de Brasil a través de la conversora de Rivera.
No se cuenta con las medidas de Zendaleather S.A.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata
