



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 15 de octubre de 2011



Generación Térmica (MWh)		15-oct
Central Battle		-10
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		-7
Central La Tablada		-7
Central P. del Tigre		-6
Central Maldonado		-1
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		3.384
C. Baygorria		2.112
C. Palmar		5.050
C. Salto Grande		12.675
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Rivera		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		652
TOTAL Generación (MWh)		23.846

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0


DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	23.846
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh) 24.730


Diferencia (MWh)	-884
Ejecutada - Programada	-3,57%

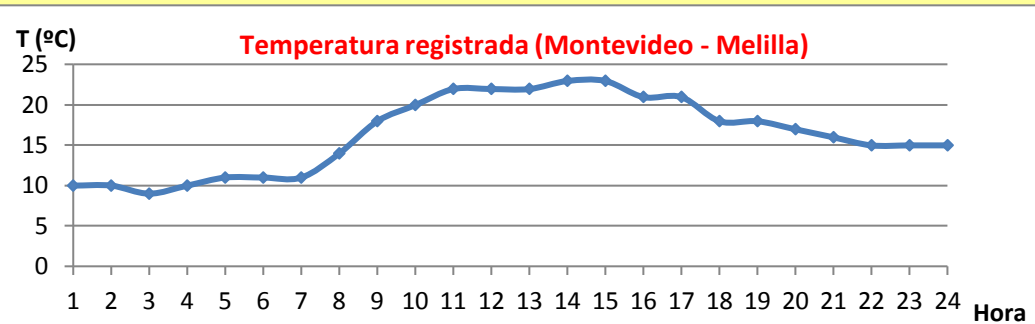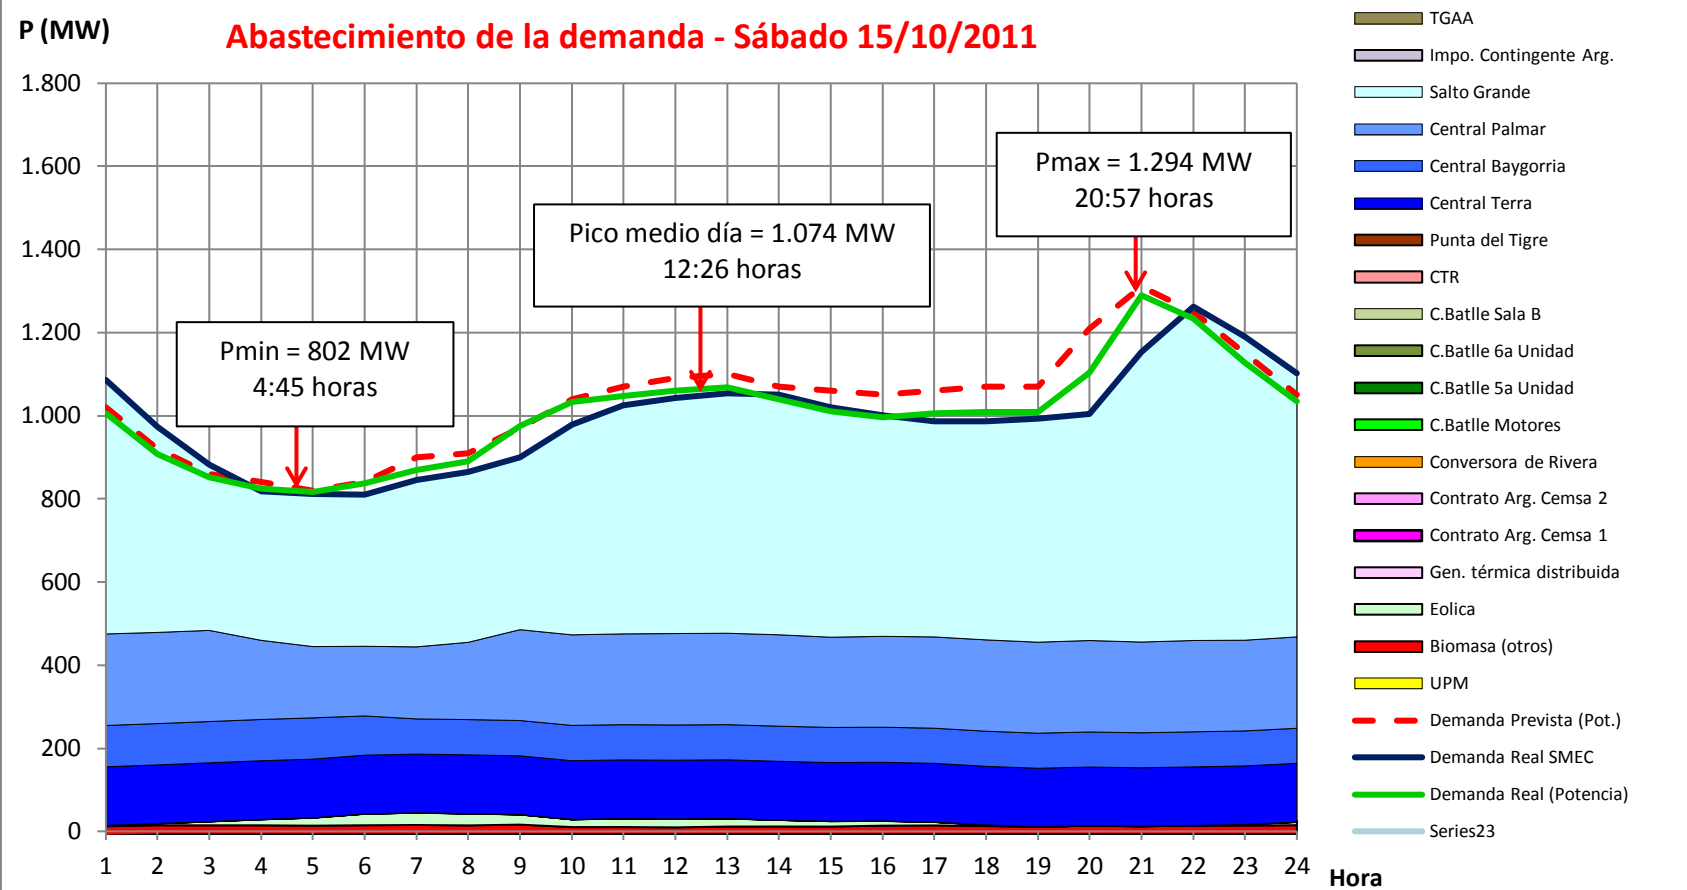

Composición de la Demanda S.I.N.


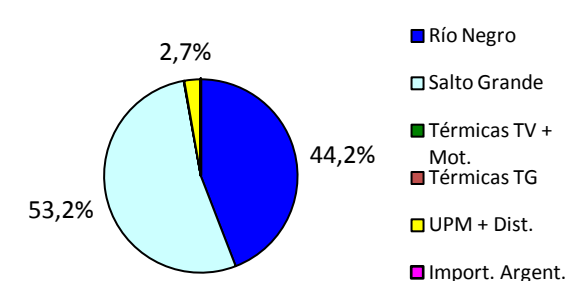


Generación por Fuente (Demanda + Expo.)



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)



Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

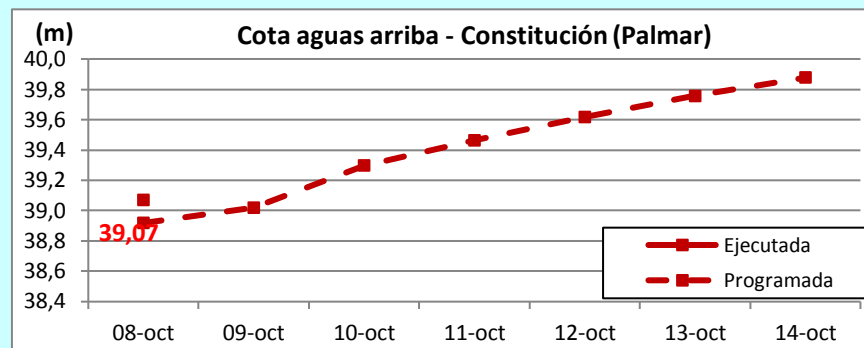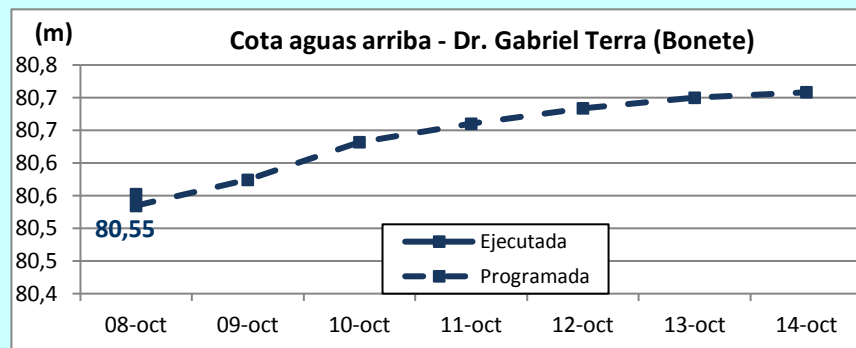


COTA FINAL	Prevista (m)	Ejecutada (m)
Represa		
Terra	80,53	80,55
Baygorria	53,97	53,92
Palmar	38,92	39,07
SGU	33,90	33,91

Valores de Referencia (operación normal)

Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00

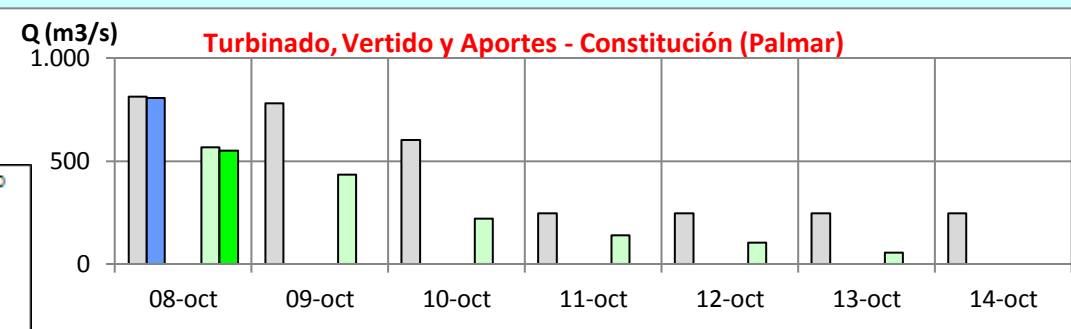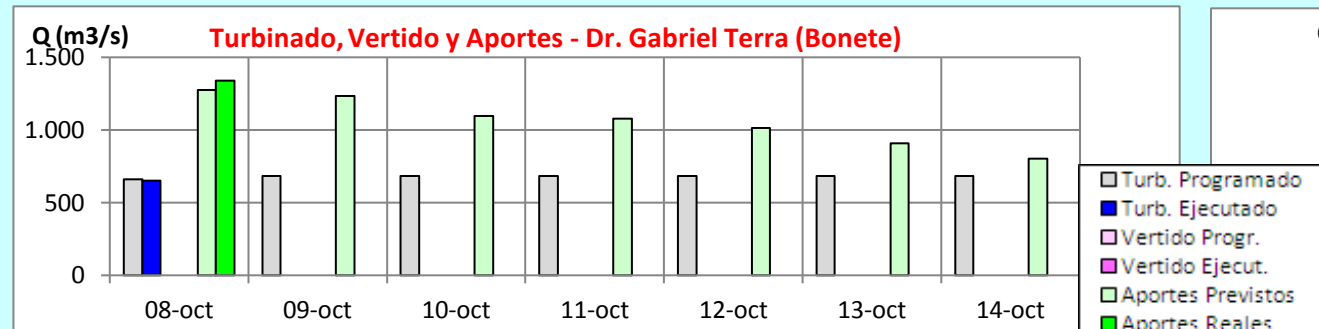


Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

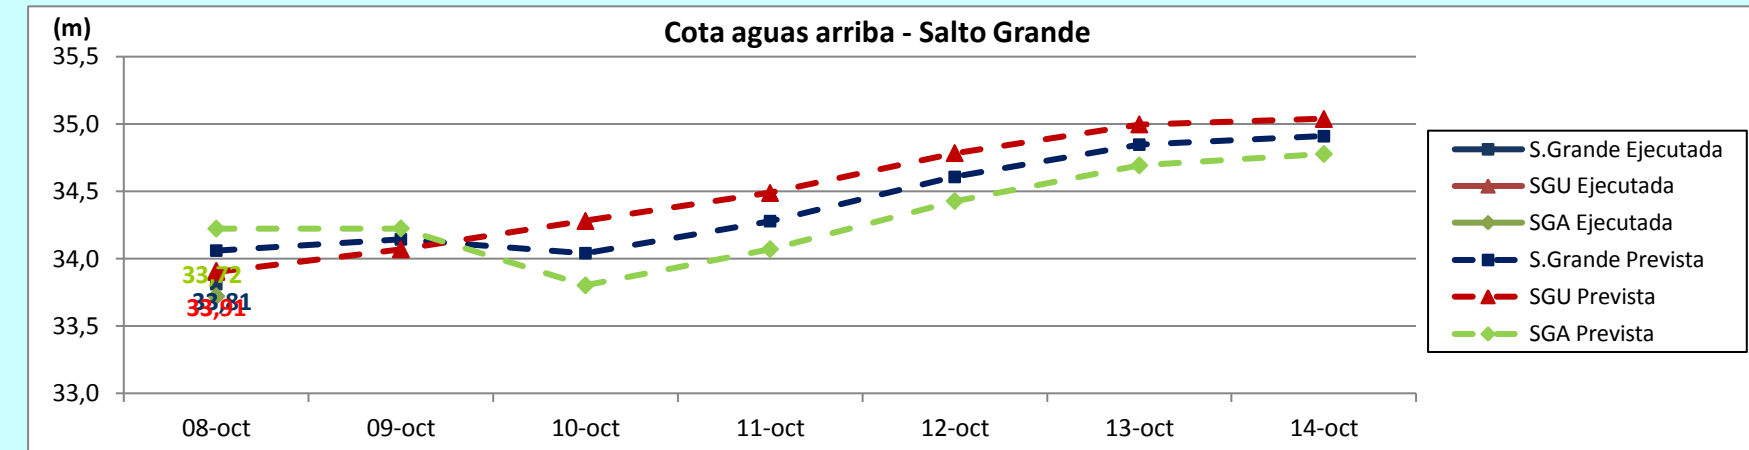

TURBINADO	Previsto (m3/s)	Ejecutado (m3/s)
Represa		
Terra	659	649
Baygorria	665	694
Palmar	815	806
SGU	2.629	2.816

APORTES	Previstos (m3/s)	Reales (m3/s)
Represa		
Terra	1.276	1.340
Baygorria	44	27
Palmar	567	549
SGU	3.000	3.037

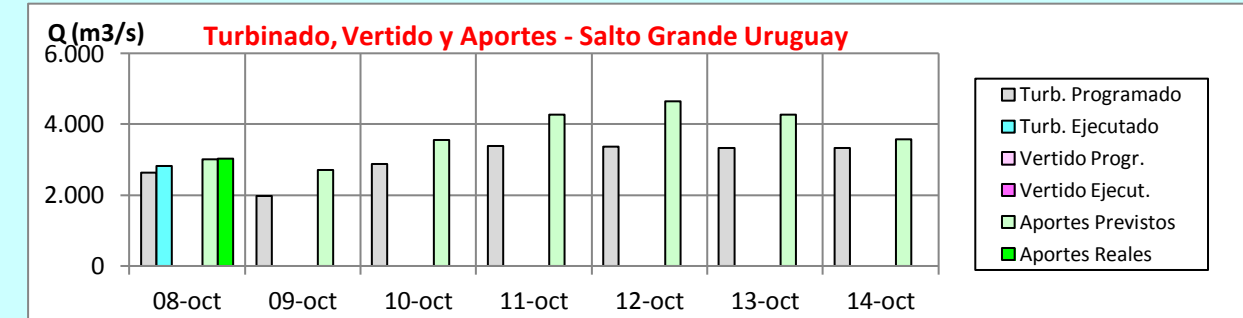

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,91
Cota Vista Arg	33,72
Cota real	33,81
Dif. Energ. (U - A) ACUMULADO	
	(MWh)
	3.750

VERTIDO	Previsto (m3/s)	Ejecutado (m3/s)
Represa		
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó 3,57% superior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 13,6 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 20,4 MW medios, de los cuales: 1,5 MW de Weyerhaeuser; 2,2 MW de Alur; 9,9 MW de Galofer; 6,9 MW de Bioener S.A.
No hubo generación térmica distribuida
Se convocó energía de Argentina. La misma no estuvo disponible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata
