



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 17 de octubre de 2011

Generación Térmica (MWh)		17-oct
Central Battle		3
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		7
Central La Tablada		-5
Central P. del Tigre		-8
Central Maldonado		-1
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		3.384
C. Baygorria		2.045
C. Palmar		4.325
C. Salto Grande		14.612
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Rivera		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		400
TOTAL Generación (MWh)		24.755



Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	24.755
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh) 25.400

Diferencia (MWh)	-645
Ejecutada - Programada	-2,54%


Abastecimiento de la demanda - Lunes 17/10/2011

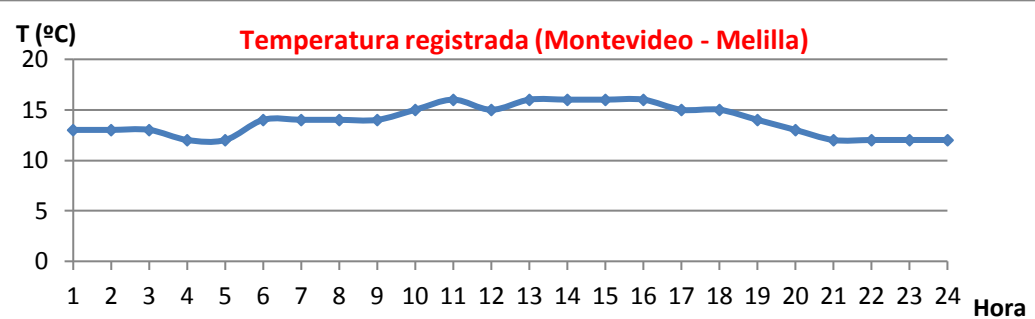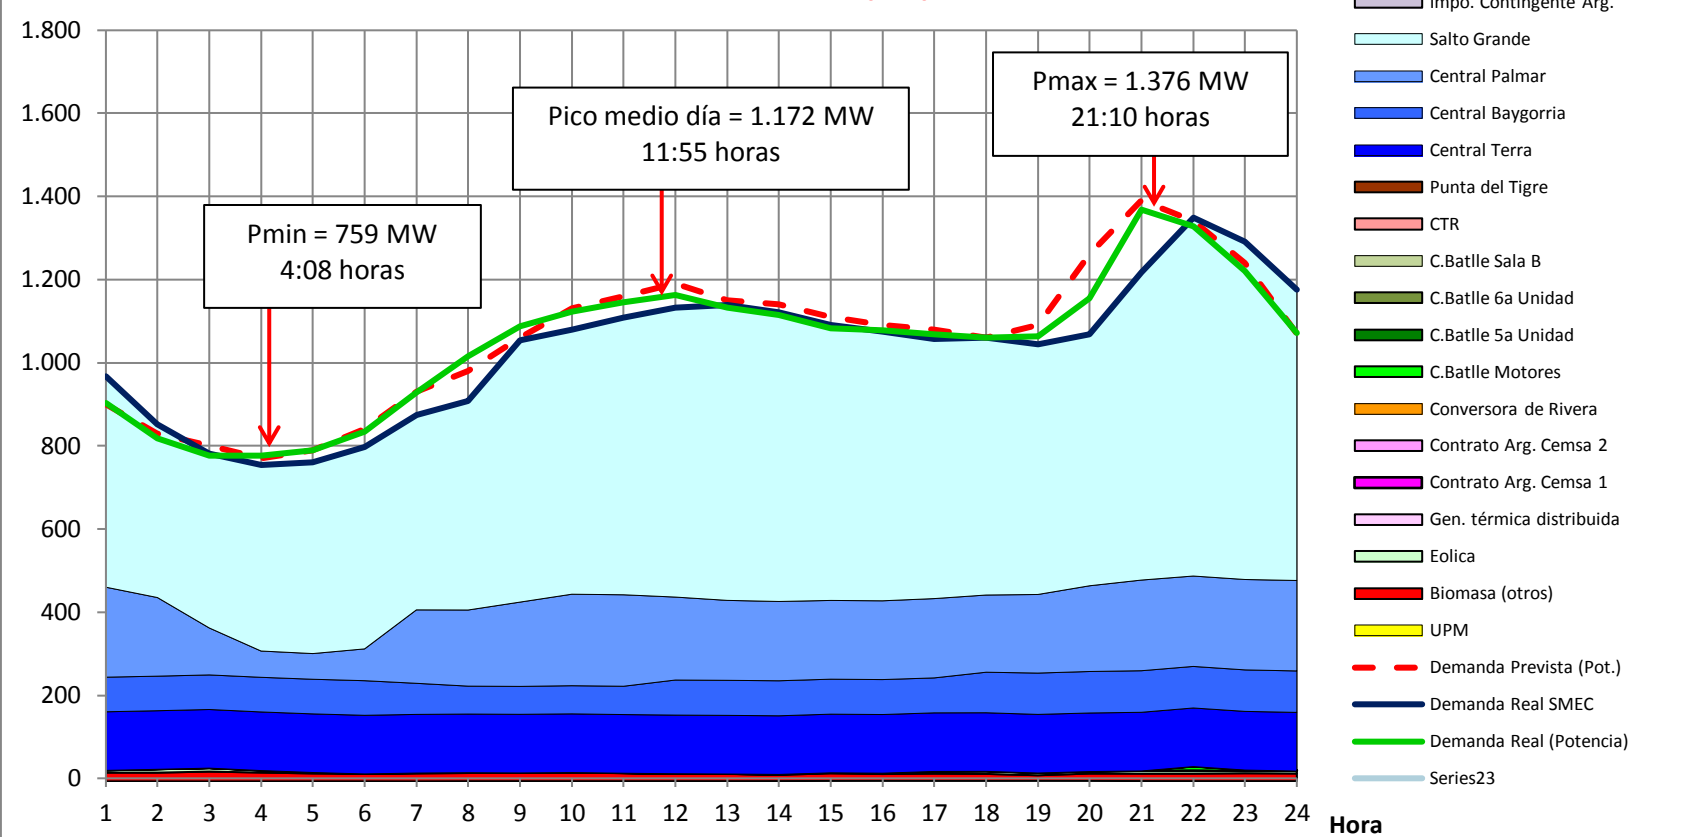

Composición de la Demanda S.I.N.


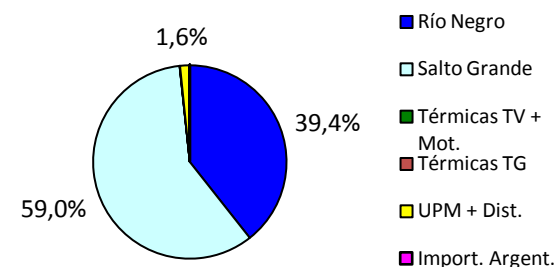


Generación por Fuente (Demanda + Expo.)

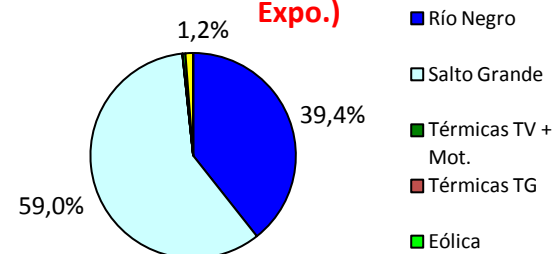

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

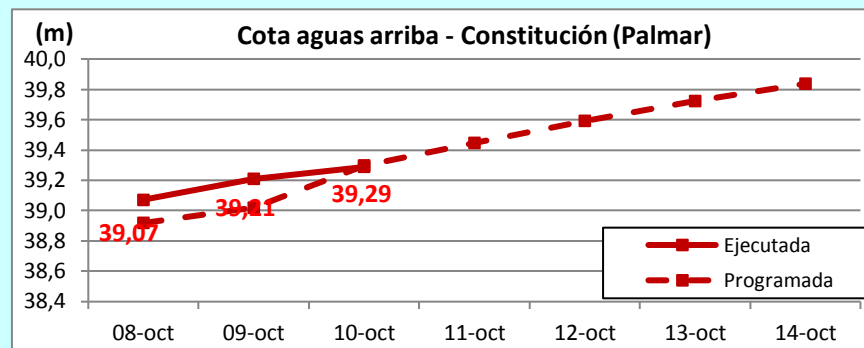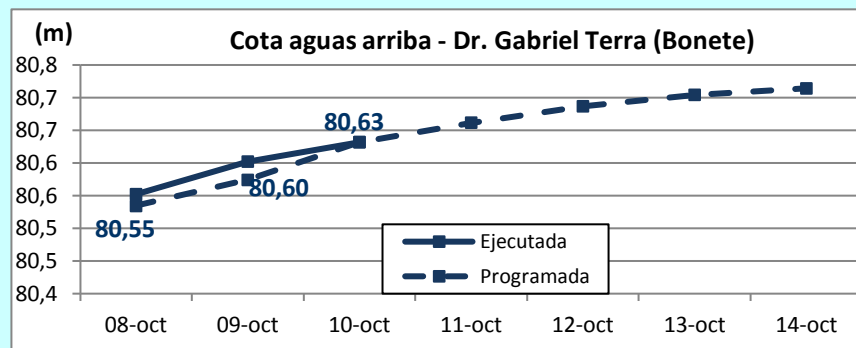


COTA FINAL	Prevista (m)	Ejecutada (m)
Represa		
Terra	80,63	80,63
Baygorria	53,90	53,86
Palmar	39,30	39,29
SGU	34,28	34,40


Valores de Referencia (operación normal)

Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00


Turbinado, Vertido y Aportes - Dr. Gabriel Terra (Bonete)

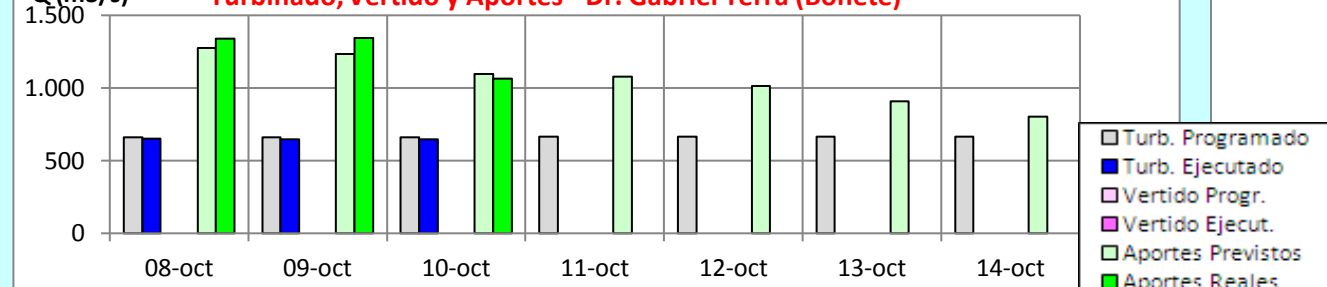

Turbinado, Vertido y Aportes - Constitución (Palmar)

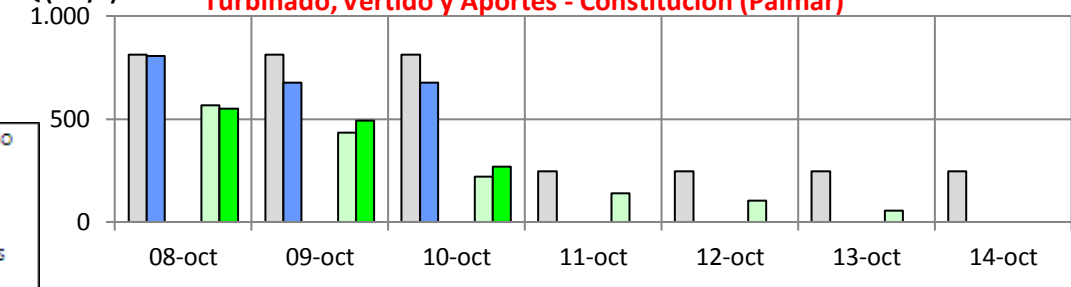


Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

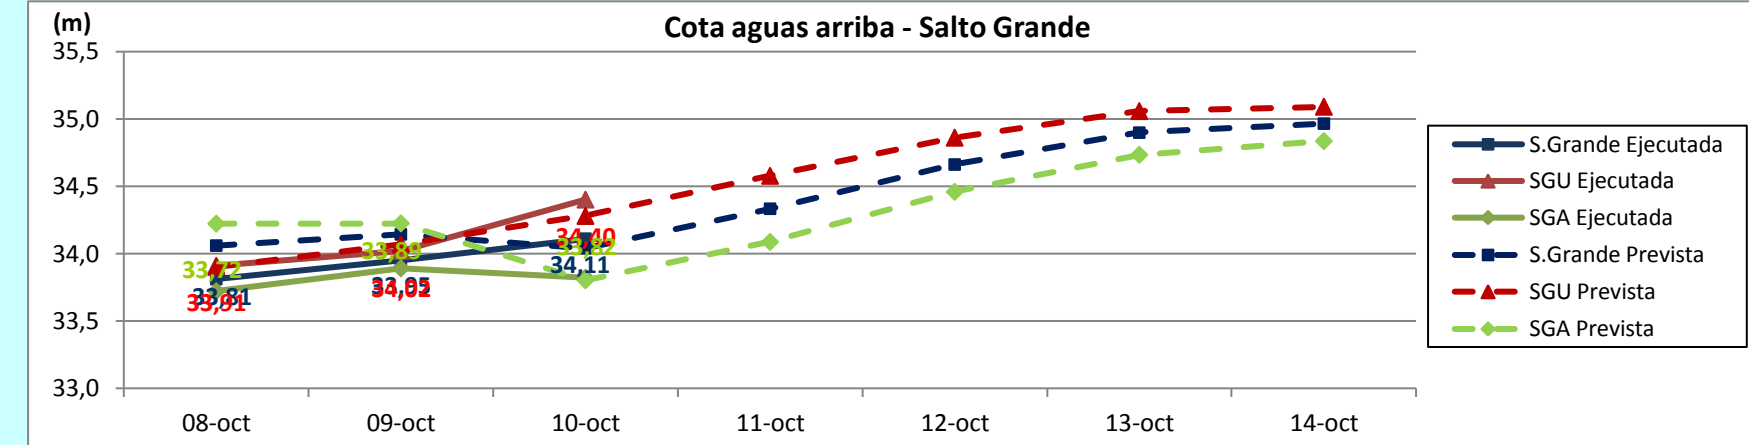

TURBINADO	Previsto (m³/s)	Ejecutado (m³/s)
Represa		
Terra	659	646
Baygorria	667	683
Palmar	815	676
SGU	2.782	2.727

APORTES	Previstos (m³/s)	Reales (m³/s)
Represa		
Terra	1.096	1.064
Baygorria	0	-12
Palmar	221	267
SGU	3.550	3.660

Turbinado, Vertido y Aportes - Salto Grande Uruguay

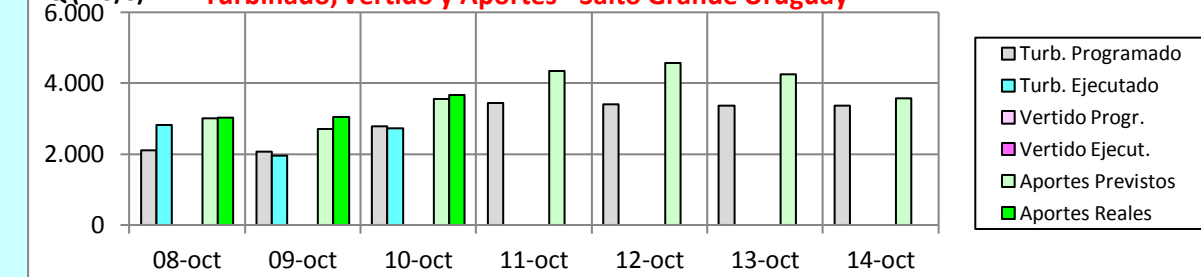

VALORES CTM

Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,40
Cota Vista Arg	33,82
Cota real	34,11
Dif. Energ. (U - A) ACUMULADO	
(MWh)	
12.230	

VERTIDO	Previsto (m³/s)	Ejecutado (m³/s)
Represa		
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó 2,54% inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 4,4 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 19,2 MW medios, de los cuales: 1,1 MW de Weyerhaeuser; 1,0 MW de Alur; 8,9 MW de Galofer; 8,1 MW de Bioener S.A.
No hubo generación térmica distribuida
Se convocó energía de Argentina. La misma no estuvo disponible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata
