



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 25 de febrero de 2012

Generación Térmica (MWh)		25-feb
Central Battle		5.254
• Sala B		1.026
• 5a		1.907
• 6a		916
• Motores		1.404
Central La Tablada		2.166
Central P. del Tigre		5.068
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.227
C. Baygorria		1.634
C. Palmar		3.679
C. Salto Grande		2.095
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		1.741
• Rivera		1.741
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.864
TOTAL Generación (MWh)		25.728



Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	25.728
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	25.620
---------------------------------	---------------

Diferencia (MWh)	108
Ejecutada - Programada	0,42%



Abastecimiento de la demanda - Sábado 25/02/2012

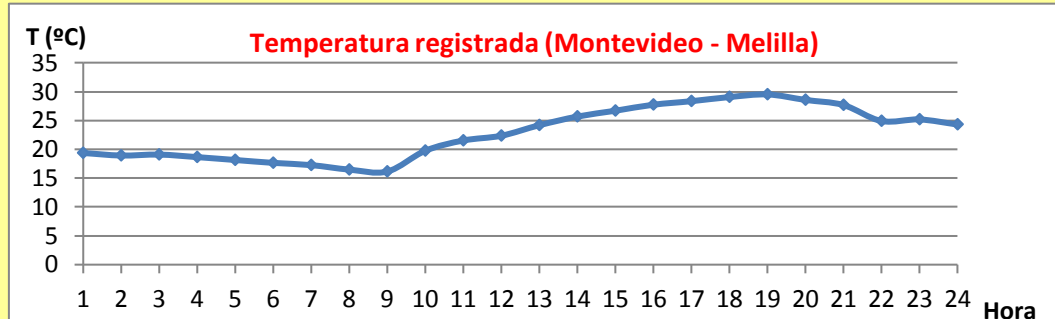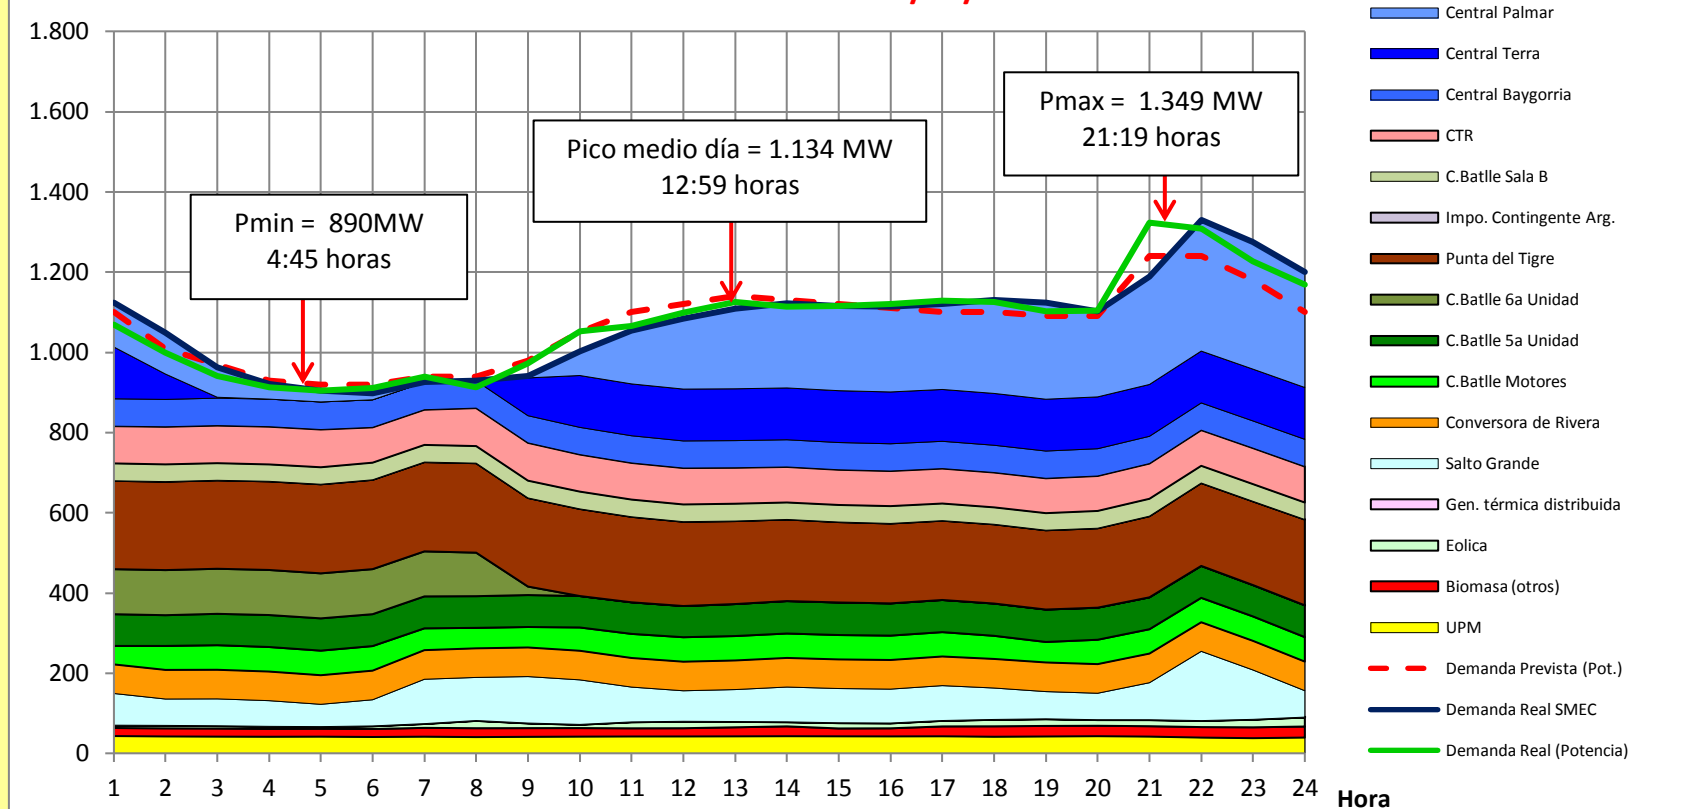

Composición de la Demanda S.I.N.


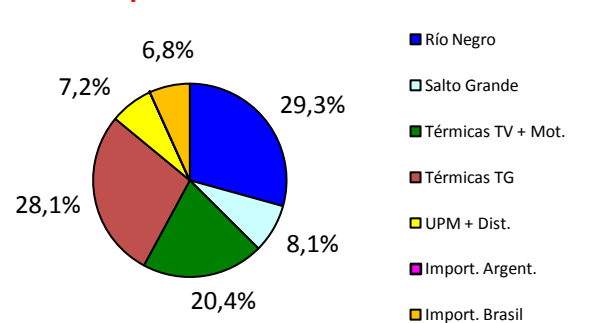


Generación por Fuente (Demanda + Expo.)

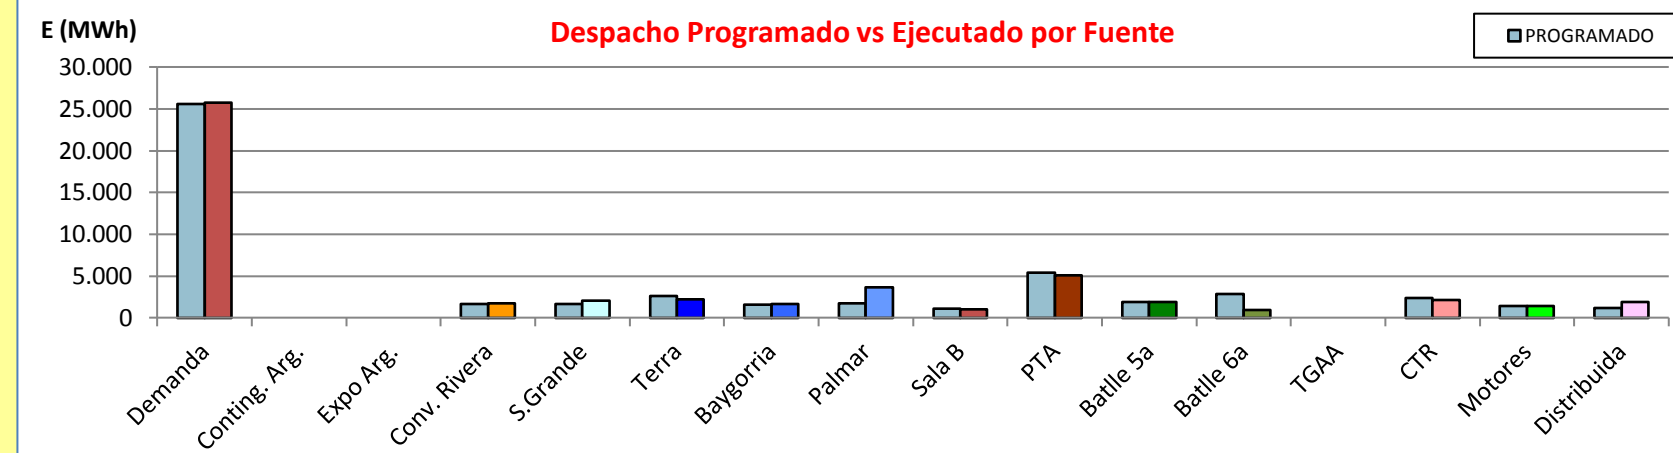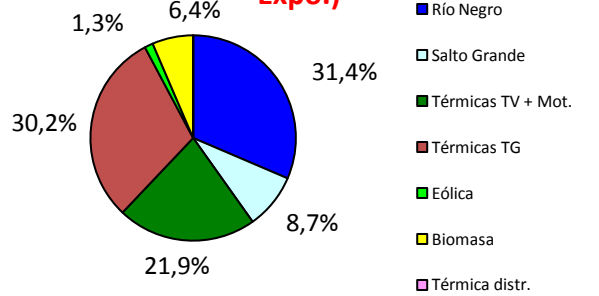



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

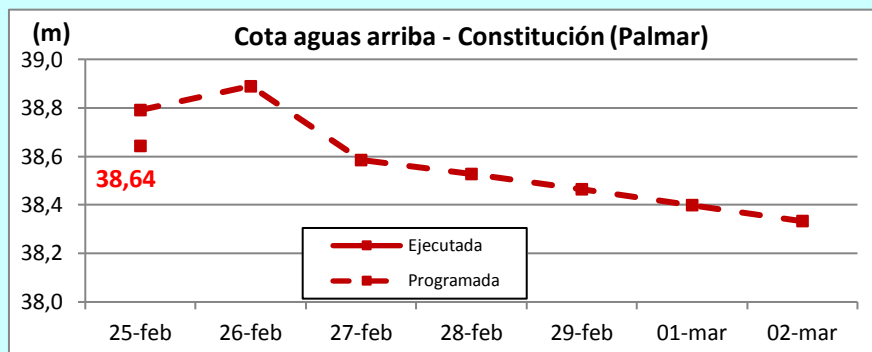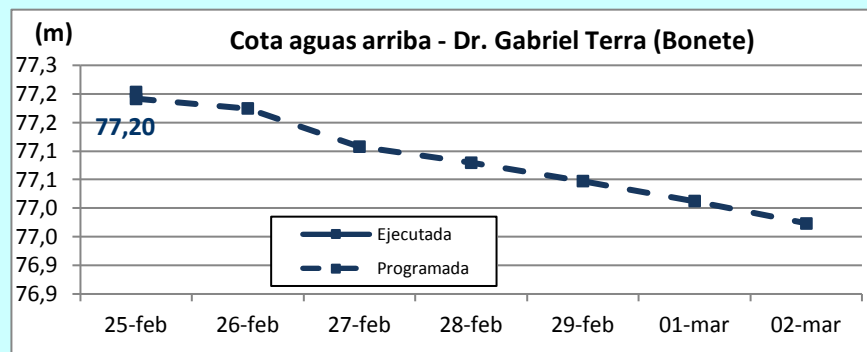


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	77,19	77,20
Baygorria	54,02	54,00
Palmar	38,79	38,64
SGU	33,96	33,98

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00

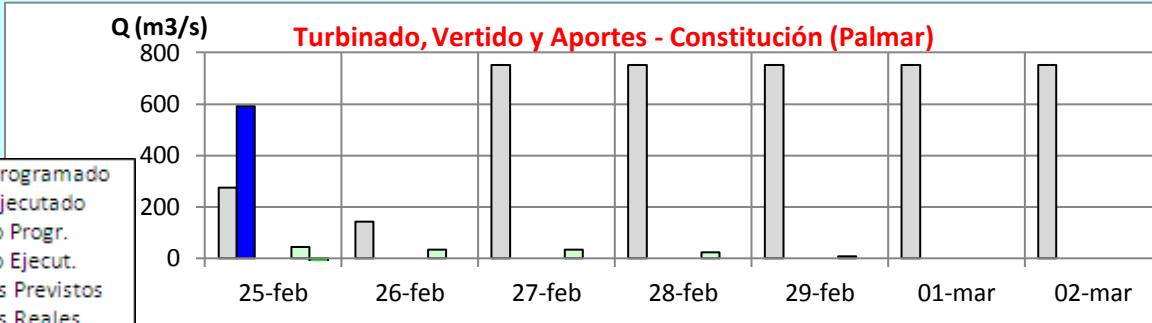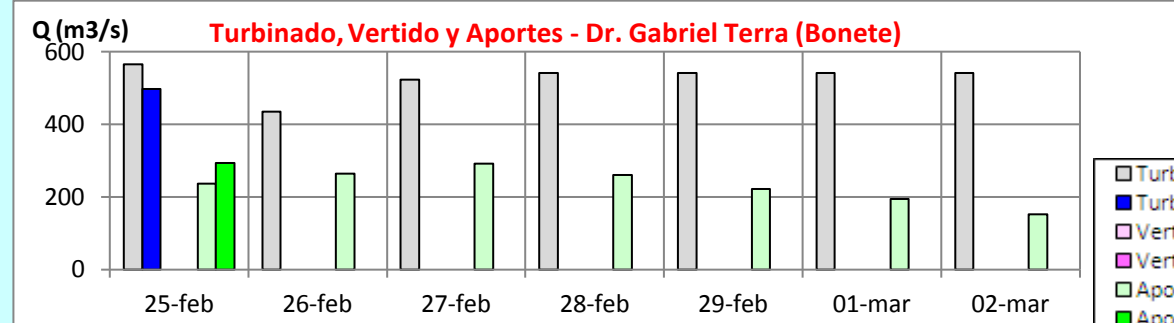


Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

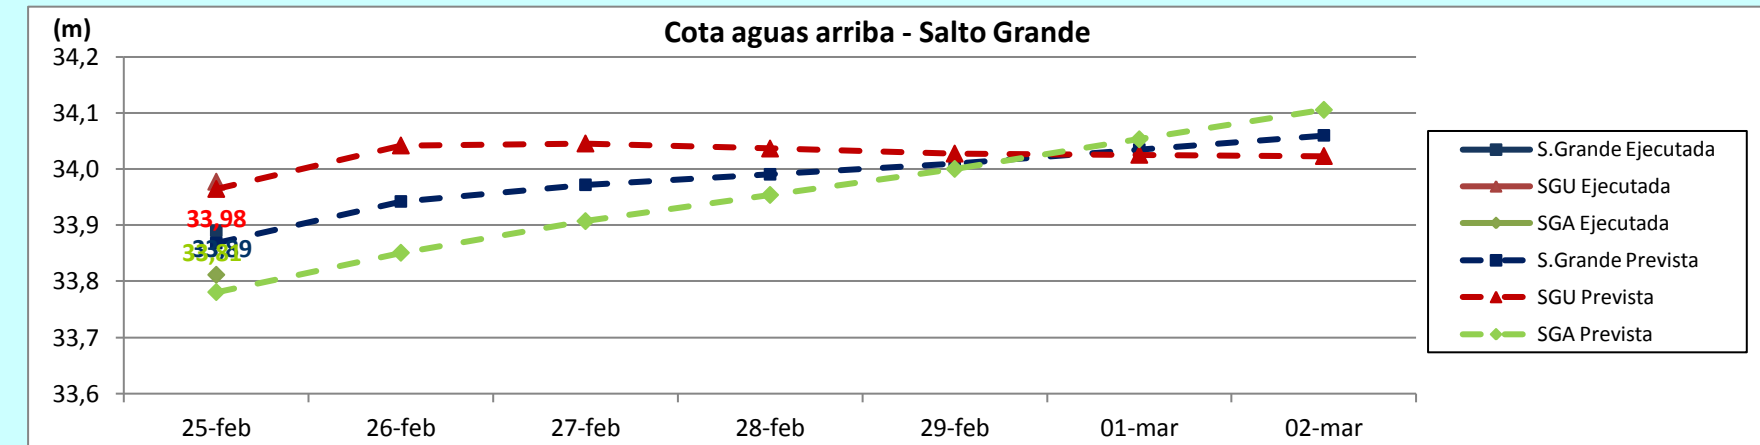

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	565	521
Baygorria	526	590
Palmar	276	353
SGU	294	498

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	236	294
Baygorria	0	36
Palmar	44	-127
SGU	675	731

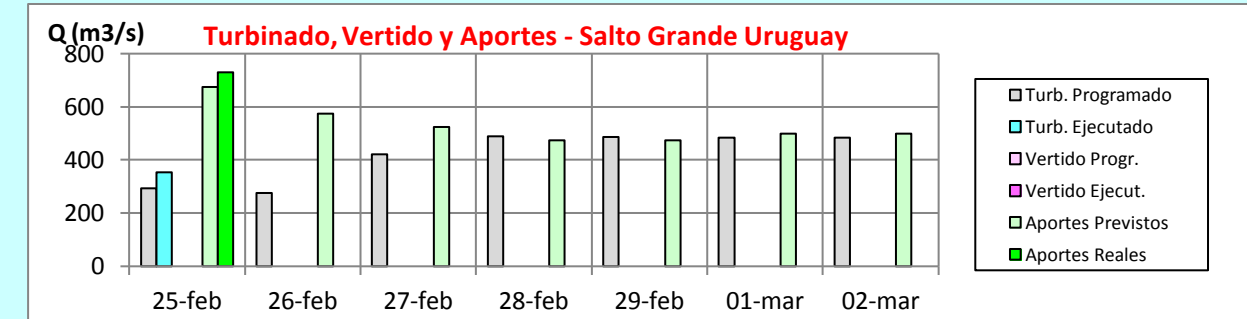

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,98
Cota Vista Arg	33,81
Cota real	33,89
Dif. Energ. (U - A) ACUMULADO	(MWh) 917

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,42 % inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 13,4 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 64,7 MW medios, de los cuales: 41,7 MW de UPM; 2,3 MW de Weyerhaeuser Productos; 10,2 MW de Galofer; 8,7 MW de Bioener; 1,8 MW de Fenirol.
Se importaron 1740 MWh de Brasil a través de la conversora de Rivera
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
En la madrugada se pinchó la caldera de la 6ta Unidad de Central Battle quedando esta fuera de servicio.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata
