



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)



ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 26 de septiembre de 2012


Generación Térmica (MWh)		26-sep
Central Battle		1.487
• Sala B		-4
• Sa		0
• 6a		0
• Motores		1.490
Central La Tablada		-41
Central P. del Tigre		187
• PTI		189
• APR		-2
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		3.221
C. Baygorria		1.834
C. Palmar		7.878
C. Salto Grande		11.888
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		1.740
• Rivera		1.740
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.459
TOTAL Generación (MWh)		29.653
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		29.653
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		29.320
Diferencia (MWh)		333
Ejecutada - Programada		1,13%


Abastecimiento de la demanda - Miércoles 26/09/2012

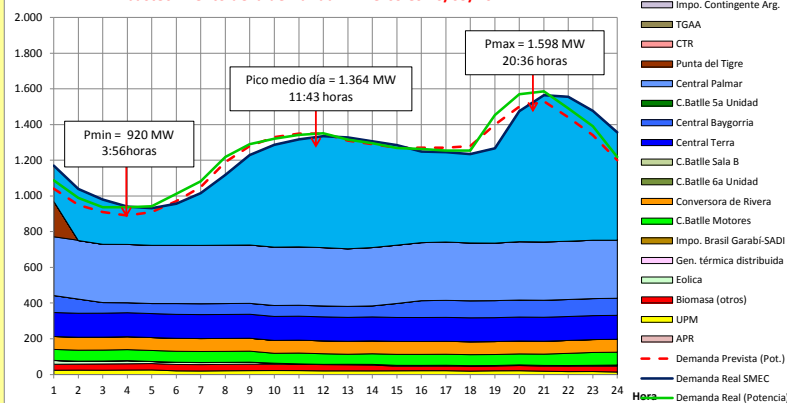


Composición de la Demanda S.I.N.



Generación por Fuente (Demanda + Expo.)




Despacho Programado vs Ejecutado por Fuente



EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr. G. Terra y Salto Grande)


Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución




COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,64	78,68
Baygorria	53,56	53,59
Palmar	38,97	38,95
SGU	31,67	31,54

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00


Turbinado, Vertido y Aportes - Dr. Gabriel Terra (Bonete)



Turbinado, Vertido y Aportes - Constitución (Palmar)




Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande



TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	678	663
Baygorria	687	630
Palmar	1.282	1.308
SGU	2.033	2.675

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	774	1.249
Baygorria	0	13
Palmar	146	207
SGU	2.000	1.885

Turbinado, Vertido y Aportes - Salto Grande Uruguay



VALORES CTM

Cotas	(m)
Cota Vista Urú	31,54
Cota Vista Arg	34,07
Cota real	32,93

Dif. Energ.	(MWh)
(U - A) ACUMULADO	-43.949

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Cota Vista Urú	0	0
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó 1,13 % superior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 7,9 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 54,5 MW medios, de los cuales: 20,8 MW de UPM; 11,9 MW de Galofer; 7,1 MW de Fenioir; 1,4 MW de Weyerhaeuser; 10,3 MW de Bioener; 2,6 MW de Alur; 0,02 MW de Las Rosas; 0,4 MW de Ponlar.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se generaron 0,005 MW medios por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).
Se importaron 1740 MWh (72,5 MW medios) de Brasil a través de la conversora de Rivera.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata
