



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)






ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 3 de agosto de 2013

Generación Térmica (MWh)		03-ago
Central Battle		4.200
• Sala B		-4
• Sa		0
• 6a		2.497
• Motores		1.707
Central La Tablada		-92
Central P. del Tigre		5.172
APR A		1.977
APR B		2.229
APR C		-2
Aggreko MVA		-1
Aggreko MVB		0
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.549
C. Baygorria		2.311
C. Palmar		5.624
C. Salto Grande		5.561
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Rivera		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.439
TOTAL Generación (MWh)		30.966



Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	30.966
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	30.270
Diferencia (MWh)	696
Ejecutada - Programada	2,30%

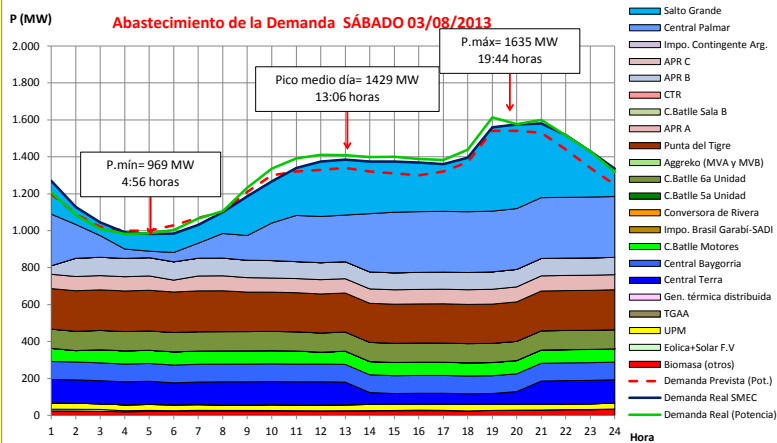


EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución




COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,25	76,40
Baygorria	53,83	53,96
Palmar	38,04	37,95
SGU	33,48	33,39

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00




Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande



TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	721	590
Baygorria	741	733
Palmar	753	965
SGU	804	1.026

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	618
Baygorria	0	764
Palmar	0	897
SGU	1.075	1.115



VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,39
Cota Vista Arg	34,44
Cota real	33,93
Dif. Energ.	(MWh)
(U - A) ACUMULADO	-21.520

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó 2,3 % superior a la prevista
Se registró generación eólica por 4 MW medios aprox., generación con biomasa por aprox. 57,7 MW medios y generación solar fotovoltaica por 0,1 MW medios.
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Debido al aumento en la demanda, fue necesario despachar PTA en el pico de la noche, desde las 19 hasta las 22 hs.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata
