



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)





ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 16 de agosto de 2013


Generación Térmica (MWh)		16-ago
Central Batlle		2.328
• Sala B		1.121
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		1.207
Central La Tablada		-81
Central P. del Tigre		727
APR A		-2
APR B		34
APR C		7
MVA Motores		-1
MVB Motores		0
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.892
C. Baygorria		1.643
C. Palmar		7.592
C. Salto Grande		15.573
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-7
• Rivera		-7
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		2.199
TOTAL Generación (MWh)		32.905

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	32.905
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	33.130
Diferencia (MWh)	-225
Ejecutada - Programada	-0,68%


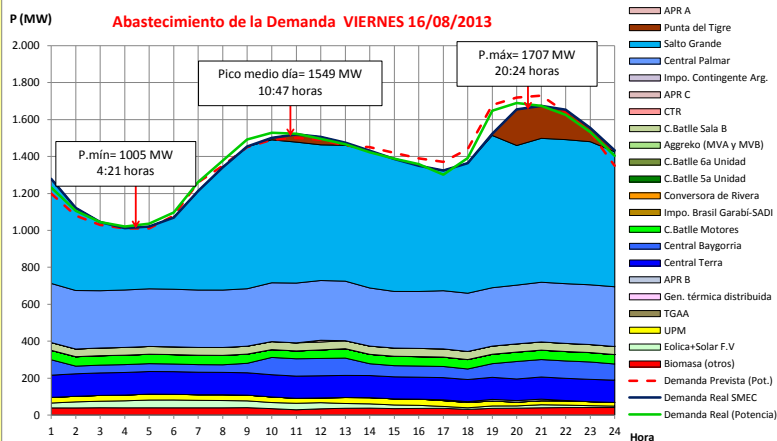


EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr. G. Terra y Salto Grande)




COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	75,96	75,96
Baygorria	53,68	53,74
Palmar	38,07	38,03
SGU	32,27	32,45

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00



TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	750	683
Baygorria	568	524
Palmar	1.265	1.302
SGU	3.350	3.376

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	310	363
Baygorria	0	682
Palmar	139	808
SGU	4.000	3.313



VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	32,45
Cota Vista Arg	33,59
Cota real	33,02
Dif. Energ. (U - A) ACUMULADO	(MWh)
	-20.321

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,68 % inferior a la prevista
Se registró generación eólica por 25,9 MW medios aprox., generación con biomasa por aprox. 66,2 MW medios y generación solar fotovoltaica por 0,1 MW medios.
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la convertora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se generó por pruebas con APR B y C.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata
