



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)






ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 21 de agosto de 2013


Generación Térmica (MWh)	21-ago
Central Battle	2.090
• Sala B	1.112
• 5a	0
• 6a	0
• Motores	978
Central La Tablada	-84
Central P. del Tigre	-8
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-3
MVA Motores	-1
MVB Motores	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica (MWh)	
C.G. Terra	2.825
C. Baygorria	2.027
C. Palmar	4.461
C. Salto Grande	15.245
Importación (MWh)	Por País
Argentina	0
• Contingente	0
Brasil	-7
• Rivera	-7
• SADI	0
Otros Generadores (MWh)	
UPM + Gen. Distribuida	1.546
TOTAL Generación (MWh)	28.085

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
• Hidráulica	0
• Térmica	0
Exportación a Brasil	0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	28.085
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	29.810
Diferencia (MWh)	-1.725
Ejecutada - Programada	-5,79%



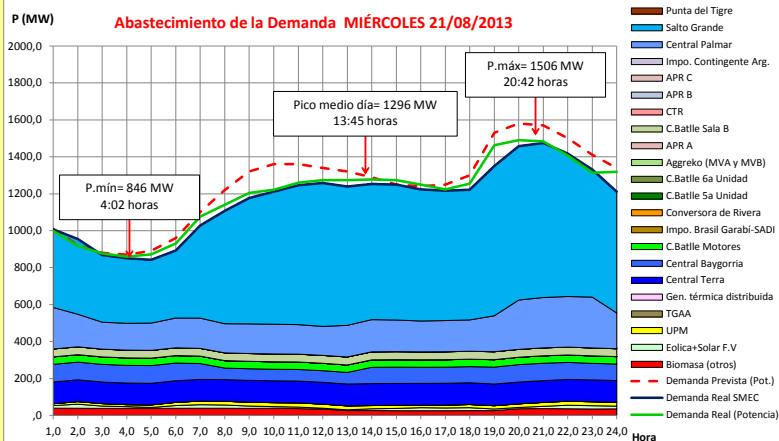


EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)




COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	75,68	75,58
Baygorria	53,67	53,70
Palmar	38,10	38,09
SGU	33,33	33,41

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00



TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	758	668
Baygorria	683	647
Palmar	761	731
SGU	3.133	2.902

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	47	81
Baygorria	0	689
Palmar	0	744
SGU	2.700	2.662



VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,41
Cota Vista Arg	35,35
Cota real	34,44
Dif. Energ. (U - A) ACUMULADO	-42.348

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó 5,79 % inferior a la prevista
Se registró generación eólica por 13,7 MW medios aprox., generación con biomasa por aprox. 52 MW medios y generación solar fotovoltaica por 0,1 MW medios.
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata
