



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)





ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

Jueves 5 de septiembre de 2013


Generación Térmica (MWh)		05-sep
Central Batlle		2.326
• Sala B		991
• 5a		0
• 6a		435
• Motores		901
Central La Tablada		-59
Central P. del Tigre		5.111
APR A		2.056
APR B		-2
APR C		-3
MVA Motores		-1
MVB Motores		0
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		406
C. Baygorria		576
C. Palmar		301
C. Salto Grande		18.102
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-7
• Rivera		-7
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.640
TOTAL Generación (MWh)		30.445

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	30.445
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	30.380
Diferencia (MWh)	65
Ejecutada - Programada	0,21%


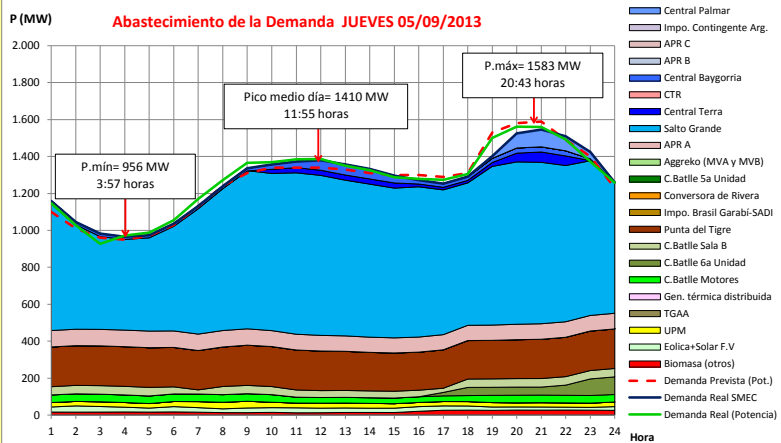


EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr. G. Terra y Salto Grande)




COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	75,33	75,31
Baygorria	53,87	53,82
Palmar	37,76	37,83
SGU	34,07	34,03

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00



TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	30	96
Baygorria	31	178
Palmar	22	48
SGU	3.223	3.550

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-118
Baygorria	0	117
Palmar	0	259
SGU	3.675	3.703



VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,21 % superior a la prevista.
Se registró generación eólica por 23,7 MW medios aprox., generación con biomasa por aprox. 46,2 MW medios y generación solar fotovoltaica por 0,1 MW medios.
No se generó energía por concepto de térmica distribuida.
No se importó energía de Brasil a través de la convertidora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata
