



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


viernes 6 de septiembre de 2013

Generación Térmica (MWh)		06-sep
Central Batlle		4.633
• Sala B		1.094
• 5a		0
• 6a		2.568
• Motores		970
Central La Tablada		-56
Central P. del Tigre		4.868
APR A		1.811
APR B		-2
APR C		-3
MVA Motores		-1
MVB Motores		-1
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		166
C. Baygorria		-7
C. Palmar		0
C. Salto Grande		15.831
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-5
• Rivera		-5
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.489
TOTAL Generación (MWh)		28.723


Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	28.723
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	28.810
Diferencia (MWh)	-87
Ejecutada - Programada	-0,30%


Abastecimiento de la Demanda VIERNES 06/09/2013

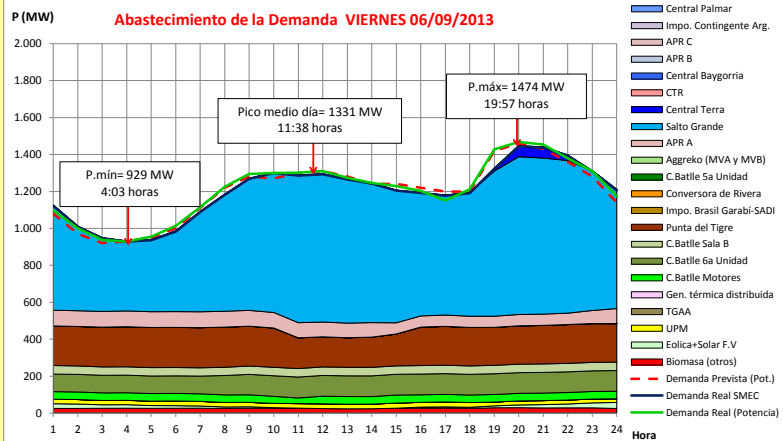


Composición de la Demanda S.I.N.



Generación por Fuente (Demanda + Expo.)




Despacho Programado vs Ejecutado por Fuente



EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)


Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución




COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa Terra	75,30	75,34
Baygorria	53,81	53,88
Palmar	37,83	37,85
SGU	34,06	33,99

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00


Turbinado, Vertido y Aportes - Dr. Gabriel Terra (Bonete)



Turbinado, Vertido y Aportes - Constitución (Palmar)




Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande



TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	4	39
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	2.988	3.123

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	312
Baygorria	0	77
Palmar	0	72
SGU	3.125	3.130

Turbinado, Vertido y Aportes - Salto Grande Uruguay



VALORES CTM

Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,99
Cota Vista Arg	34,45
Cota real	34,22
Dif. Energ. (U - A) ACUMULADO	-9,767

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,3% inferior a la prevista.
Se registró generación eólica por 12,5 MW medios aprox., generación con biomasa por aprox. 51,1 MW medios y generación solar fotovoltaica por 0,1 MW medios.
No se generó energía por concepto de térmica distribuida.
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata
