



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



domingo 08 de septiembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	4.631
Sala B	1.065
5ta.	0
6ta.	2.592
Motores	974
Central La Tablada	-102
Central P. del Tigre	5.117
APR A	1.971
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	0
C. Baygorria	292
C. Palmar	382
C. Salto Grande	9.900
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.502
TOTAL Generación	23.690

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	23.690
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	23.130
Diferencia (MWh)	560
Ejecutada - Programada	2,42 %

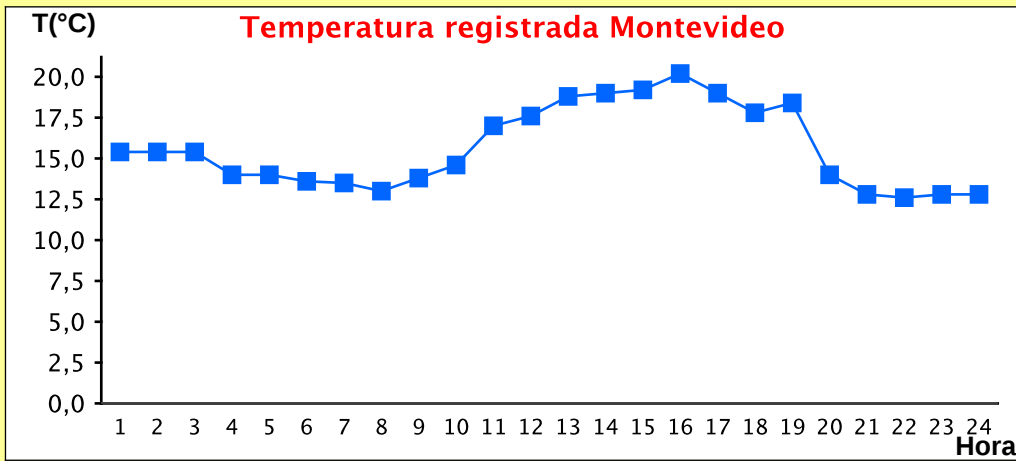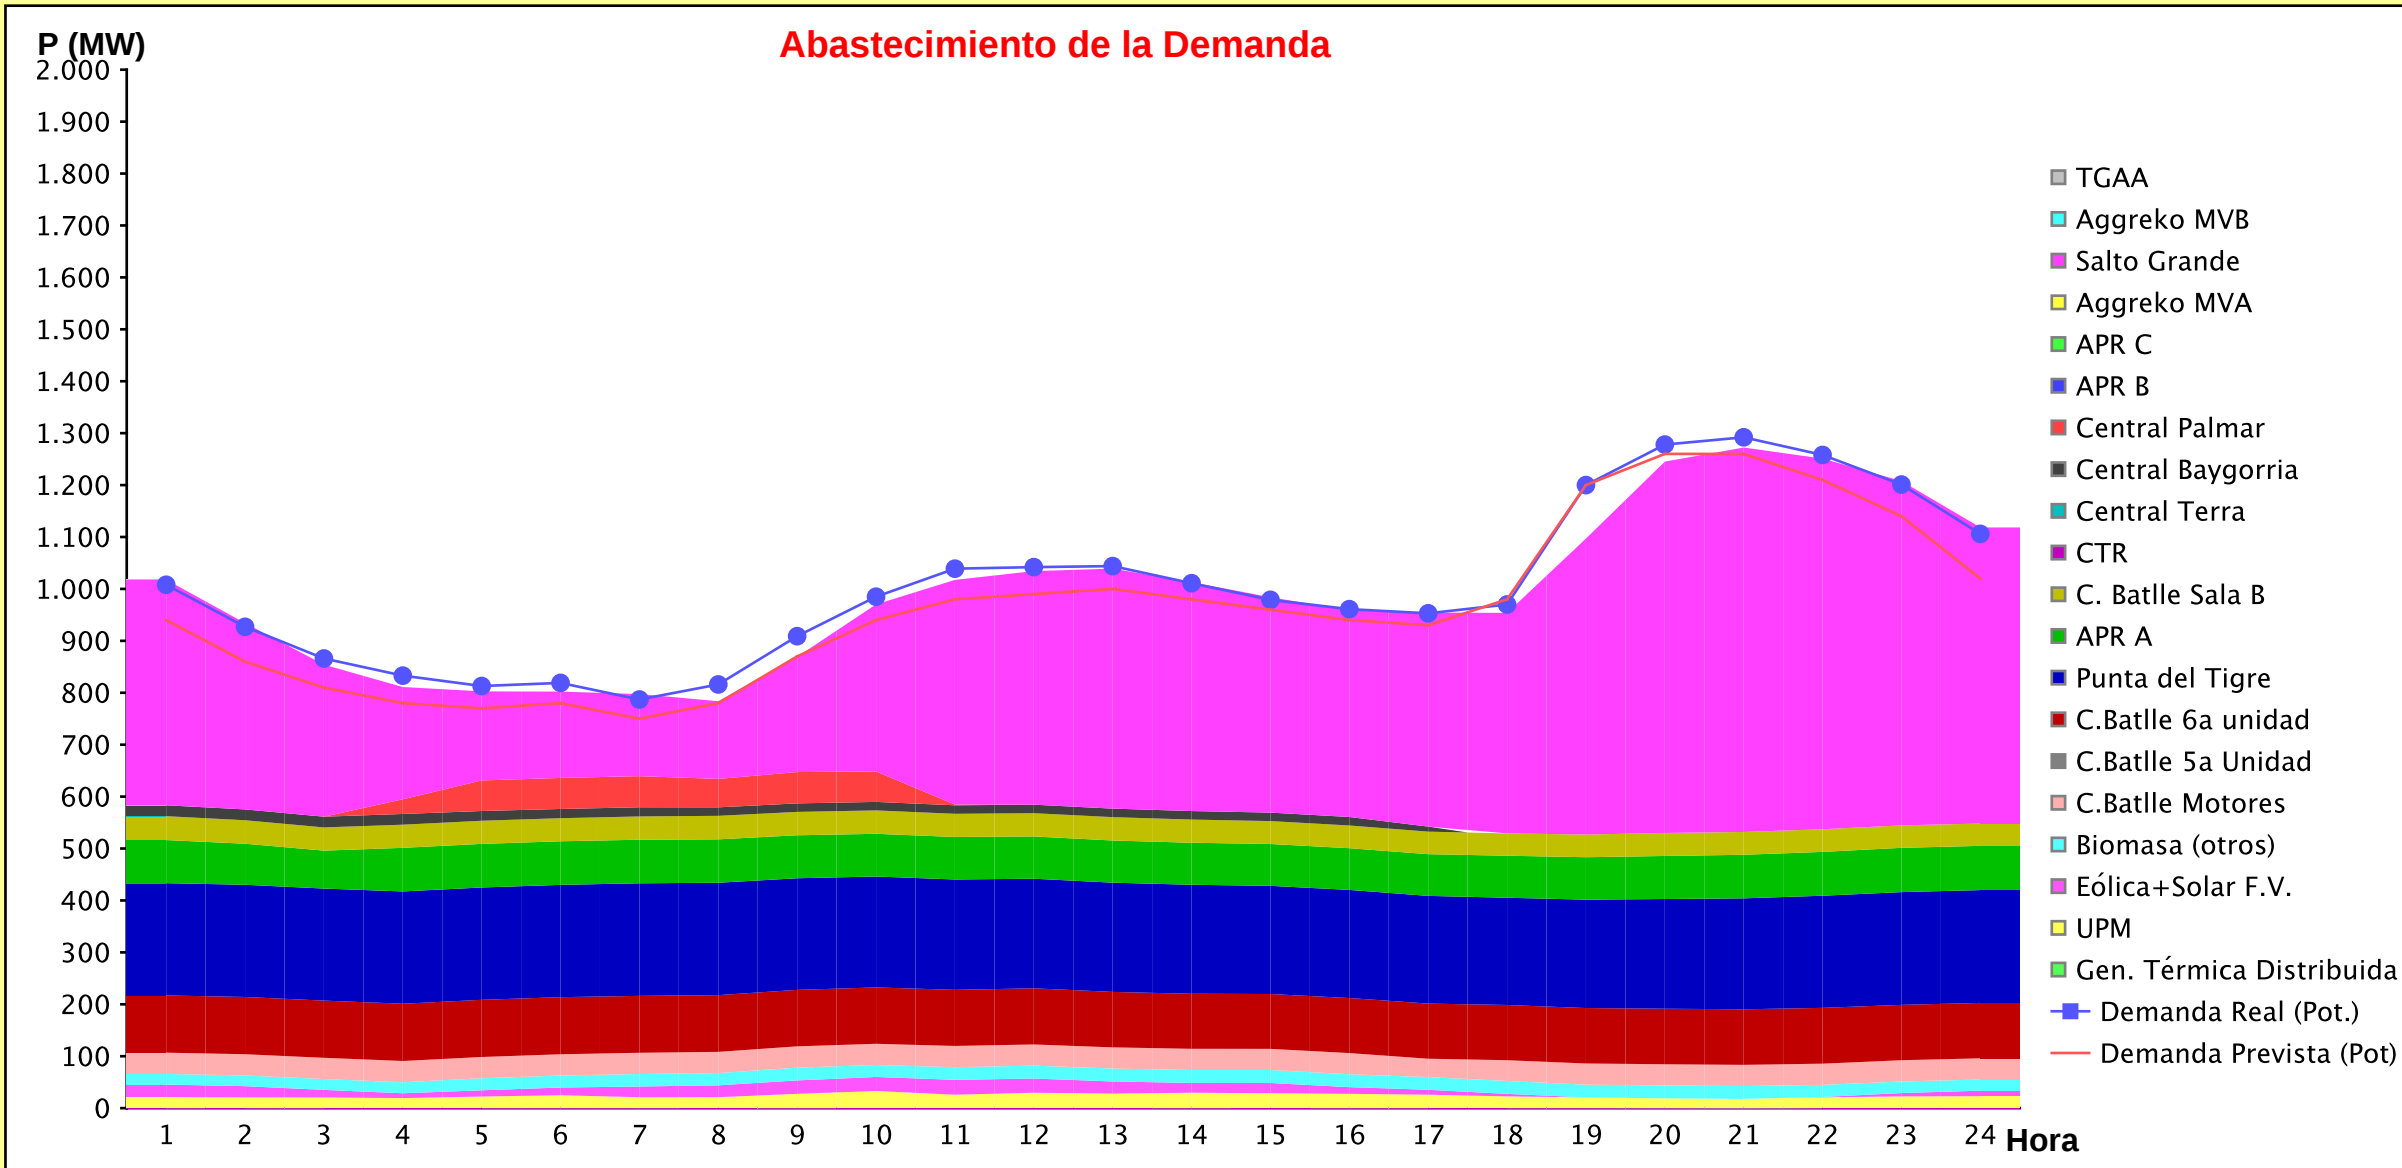



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1064,51 Hora 12:36
Potencia mínima:	767,1 Hora 07:08
Pico noche:	1303,75 Hora 20:56

Generación Media (MW)	
Eólica	14,9
Biomasa	51,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

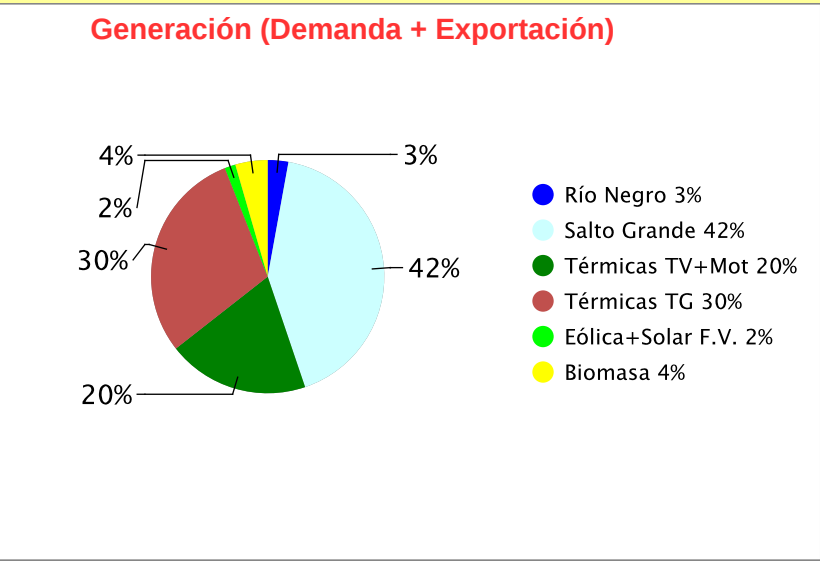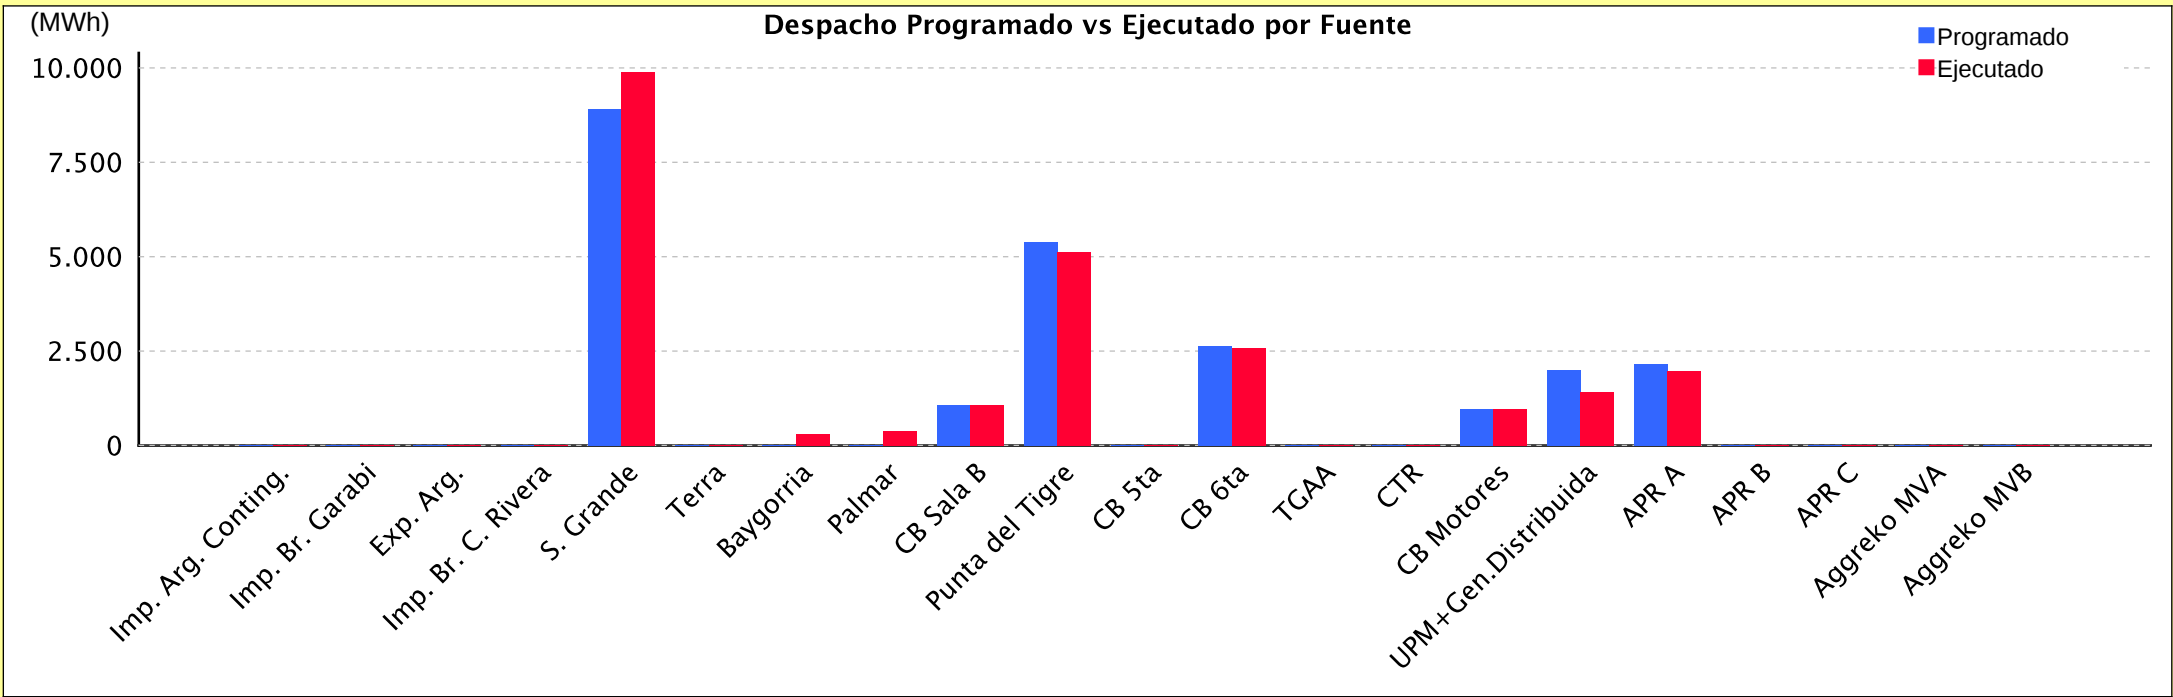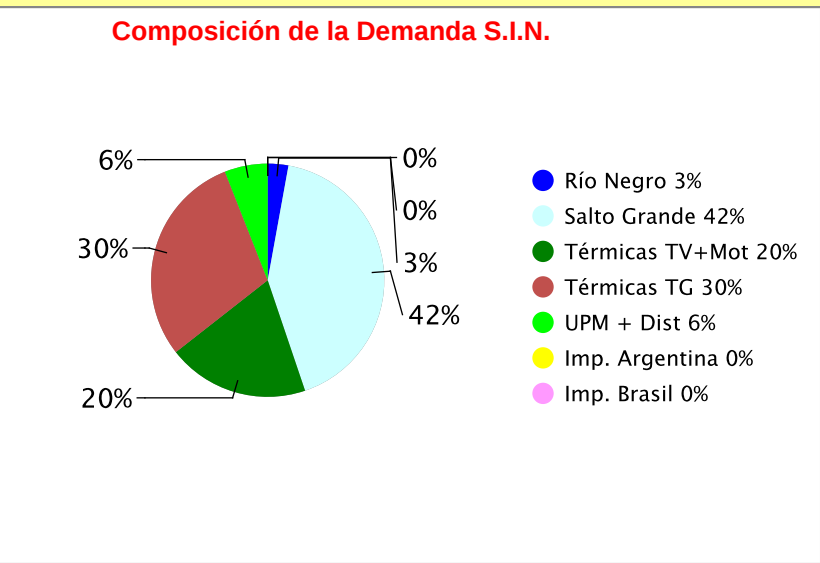



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

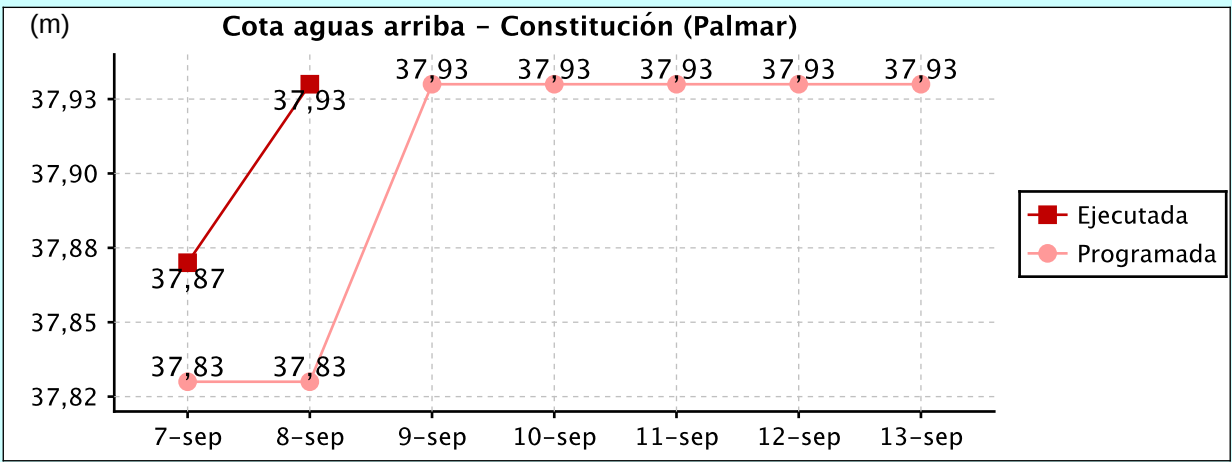
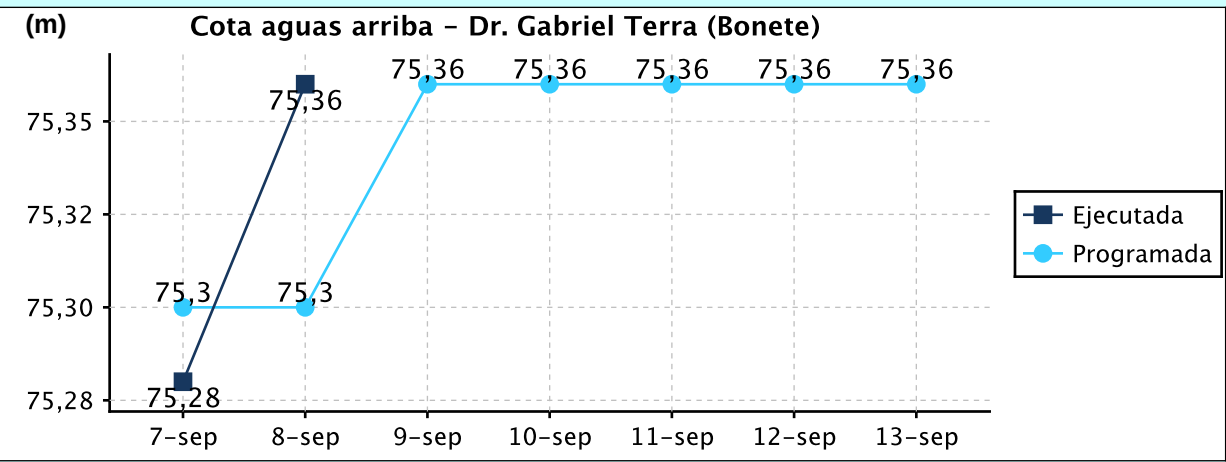


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	75,30	75,36
Baygorria	53,82	53,74
Palmar	37,83	37,93
SGU	34,37	34,08

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

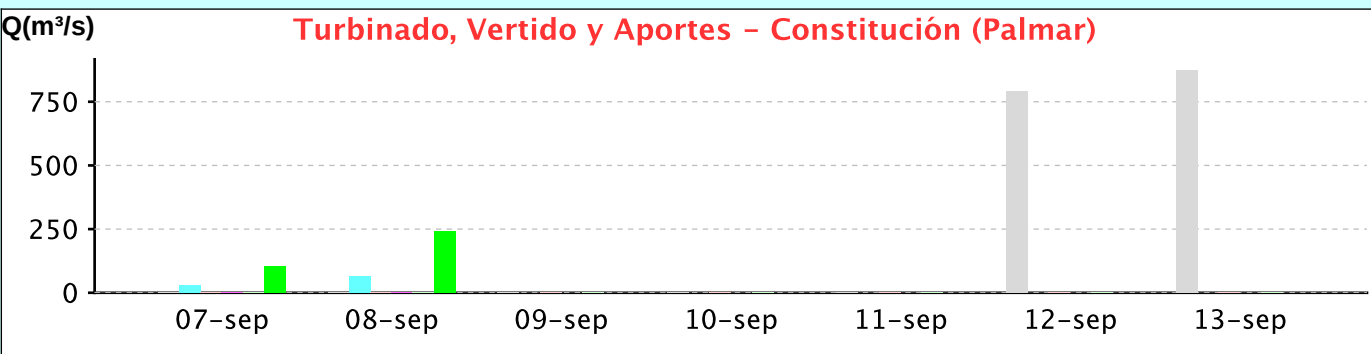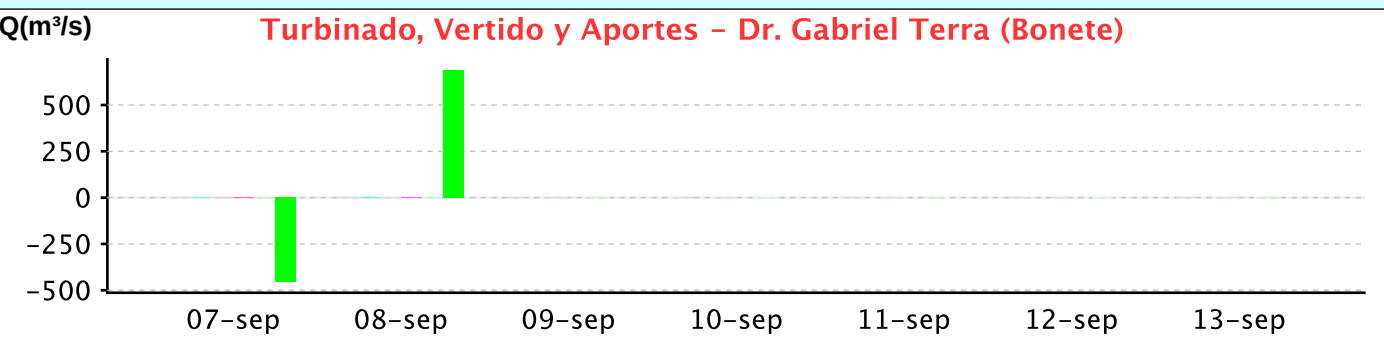

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

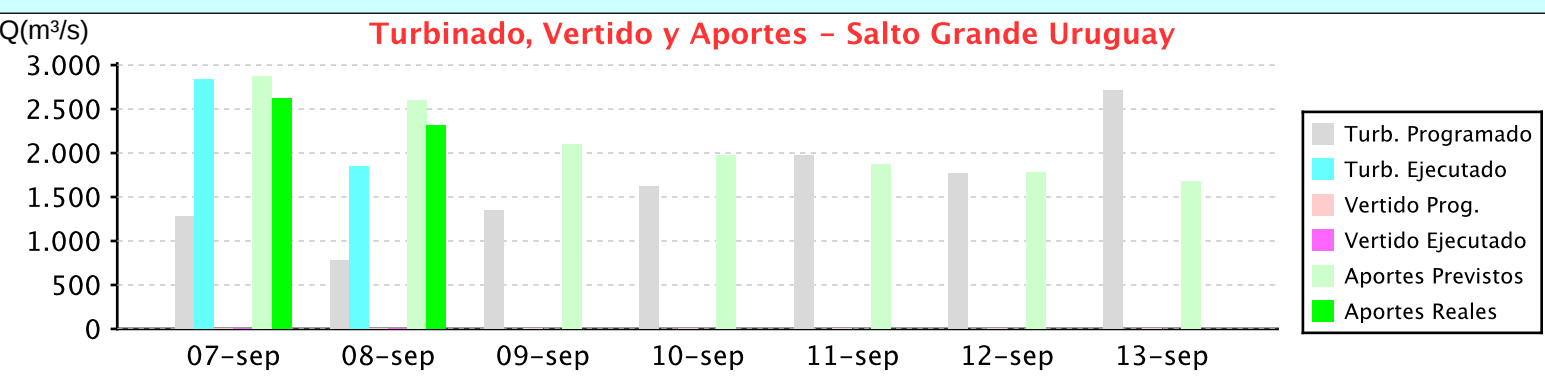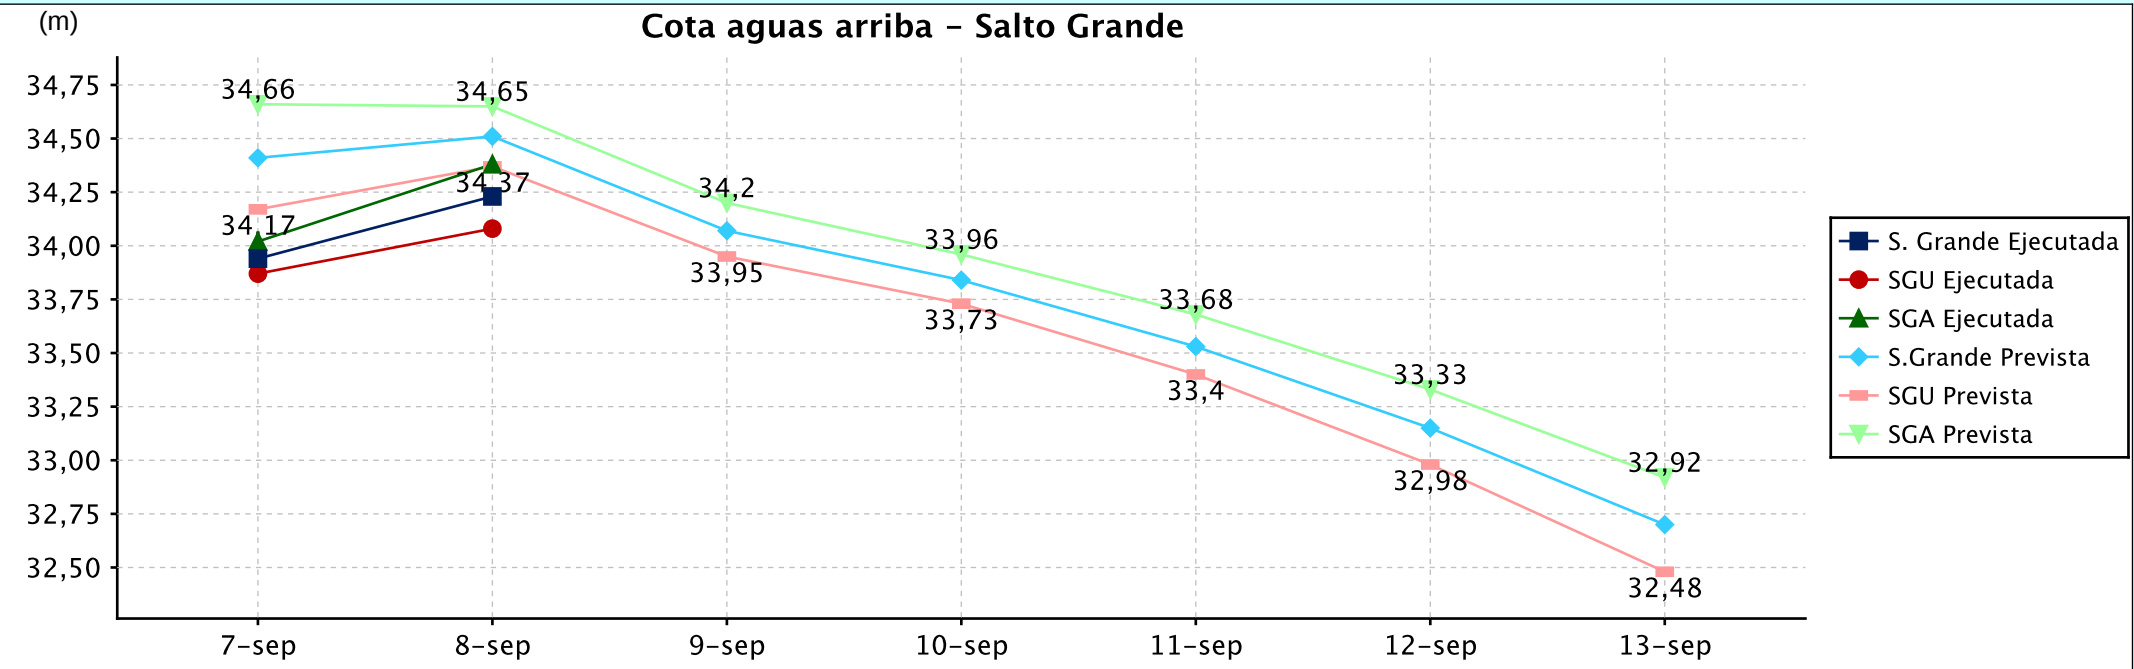

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,08
Cota Vista Arg	34,38
Cota real	34,23
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-6.423

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	92
Palmar	0	64
SGU	780	1.846

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	689
Baygorria	0	-17
Palmar	0	240
SGU	2.600	2.312

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
