



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



lunes 09 de septiembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	3.908
Sala B	456
5ta.	0
6ta.	2.526
Motores	926
Central La Tablada	-85
Central P. del Tigre	4.931
APR A	1.919
APR B	-2
APR C	28
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	0
C. Baygorria	-6
C. Palmar	114
C. Salto Grande	14.573
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.835
TOTAL Generación	27.214

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.214
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.930
Diferencia (MWh)	284
Ejecutada - Programada	1,05 %

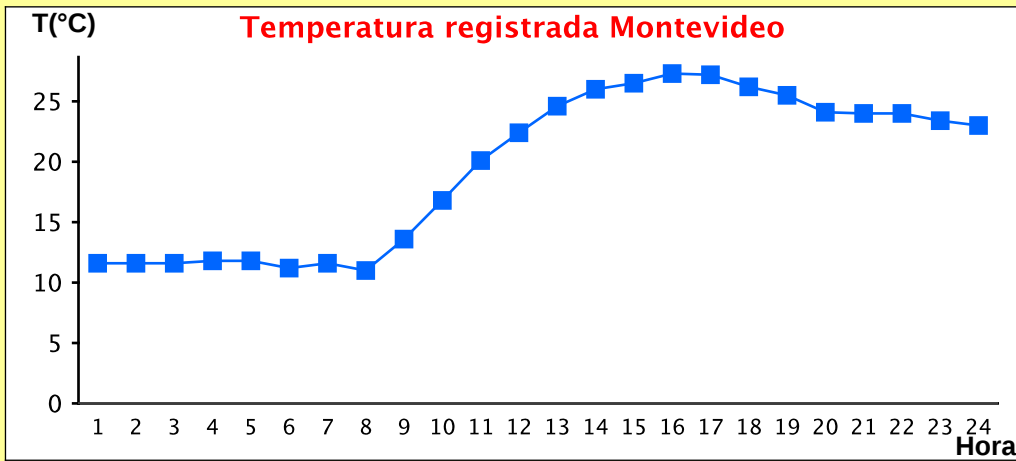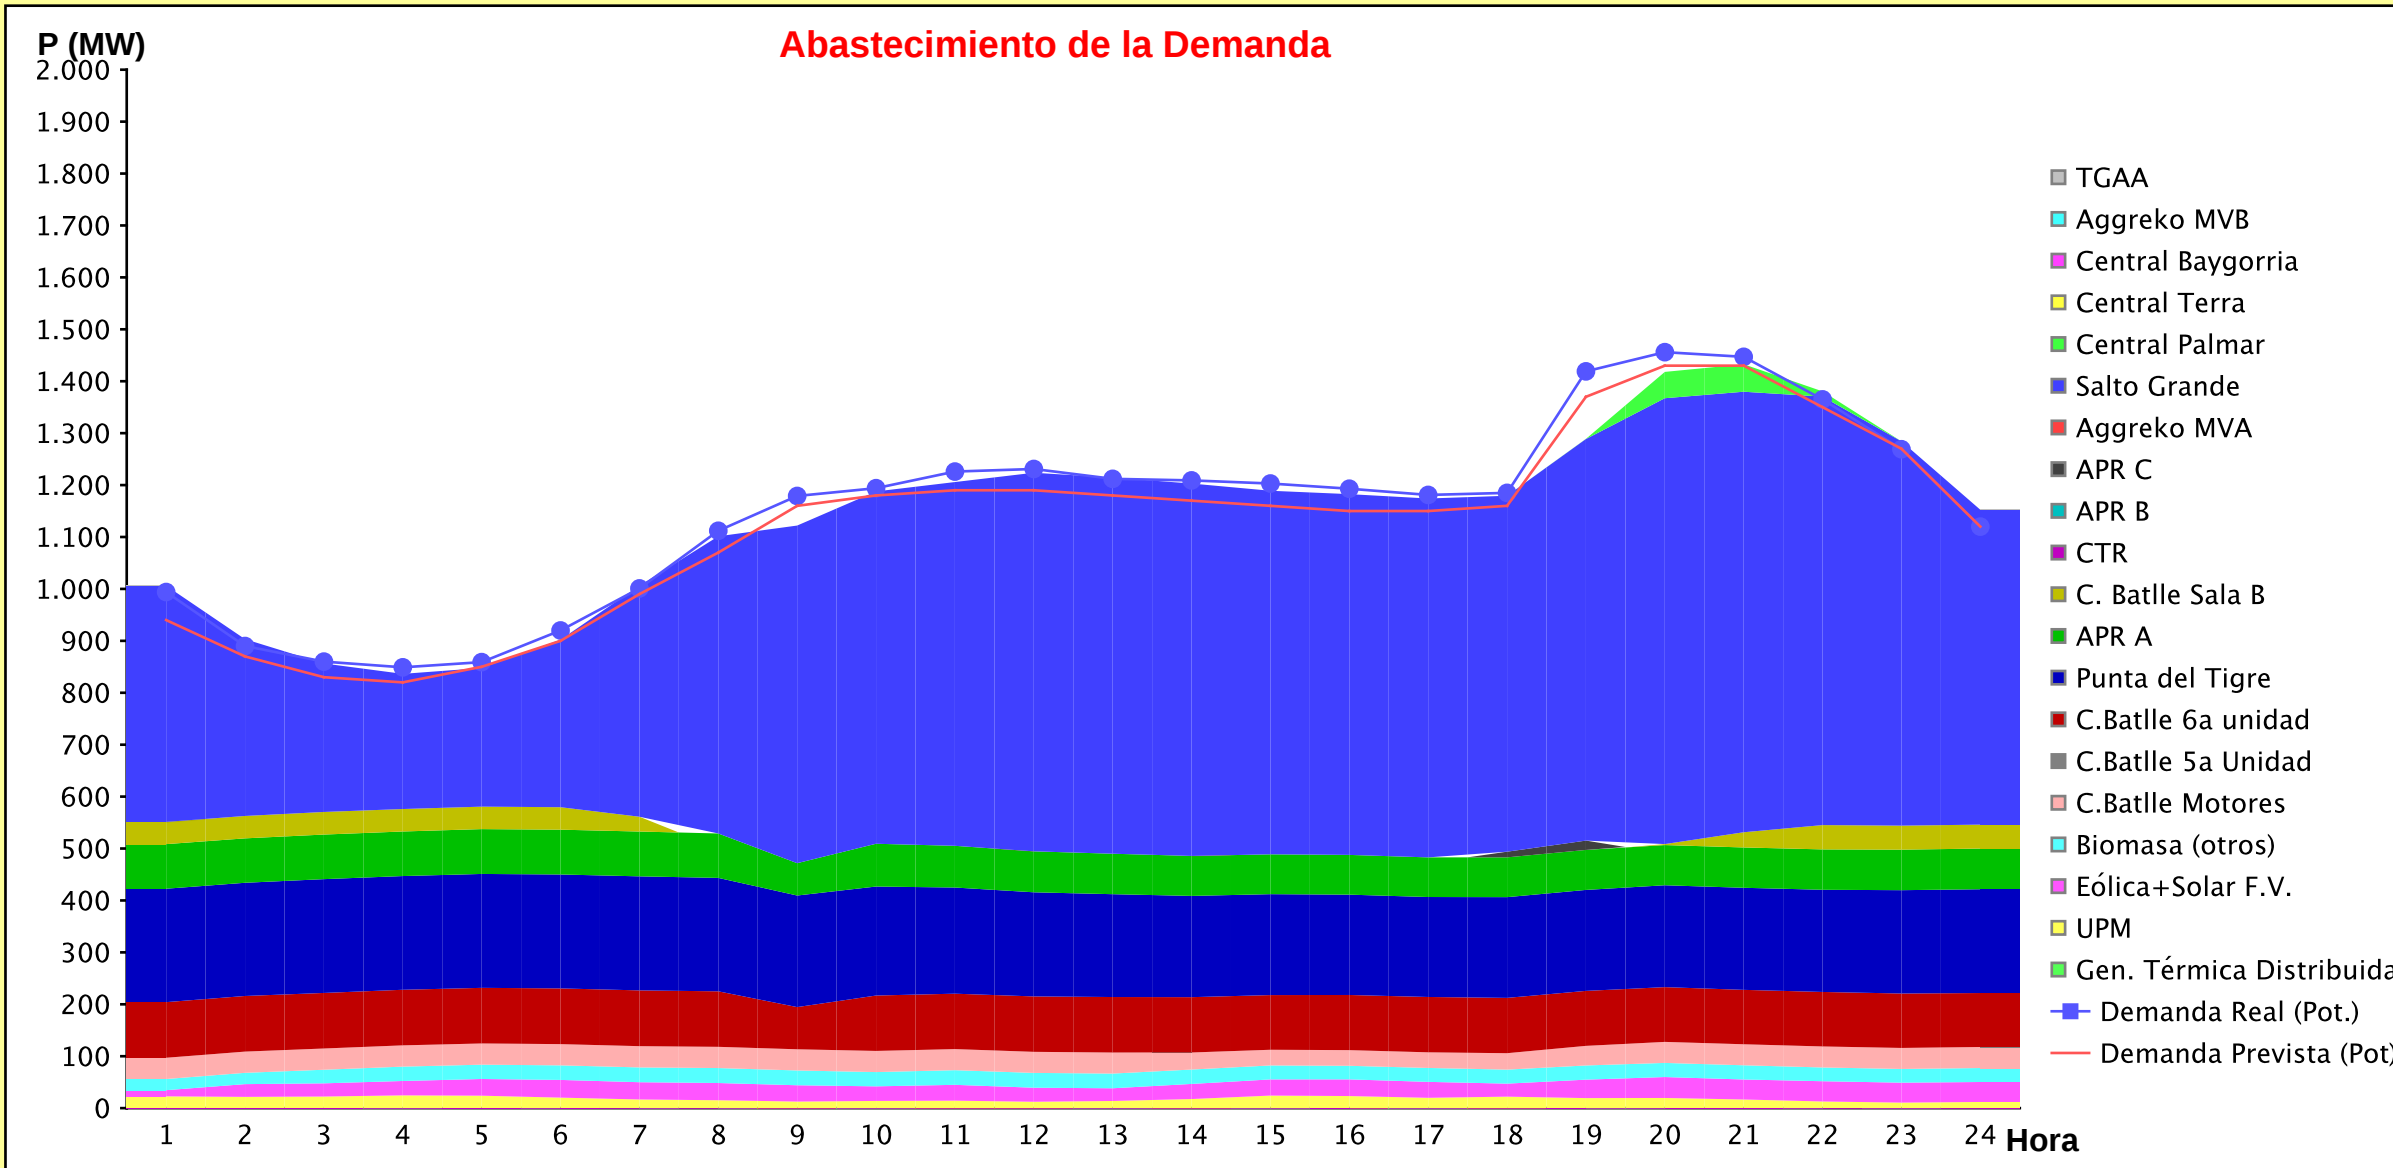



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1244,82 Hora 11:20
Potencia mínima:	834,54 Hora 03:39
Pico noche:	1465,17 Hora 20:20

Generación Media (MW)	
Eólica	31,0
Biomasa	47,9
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

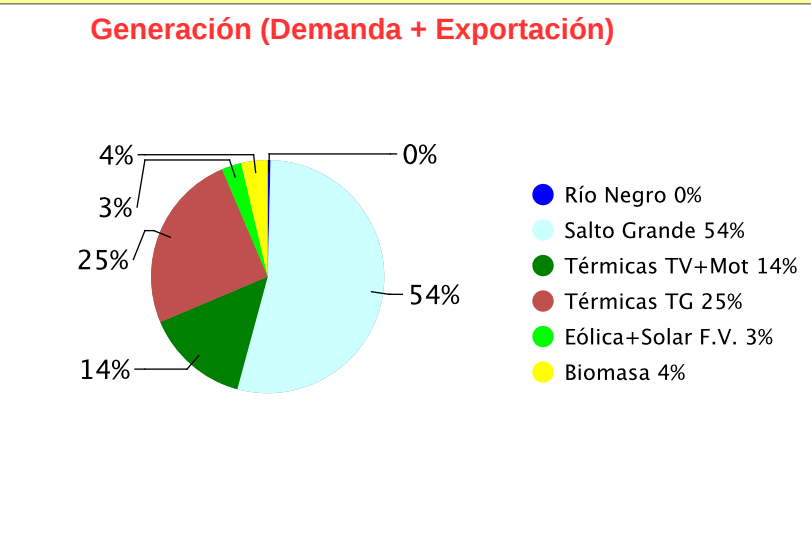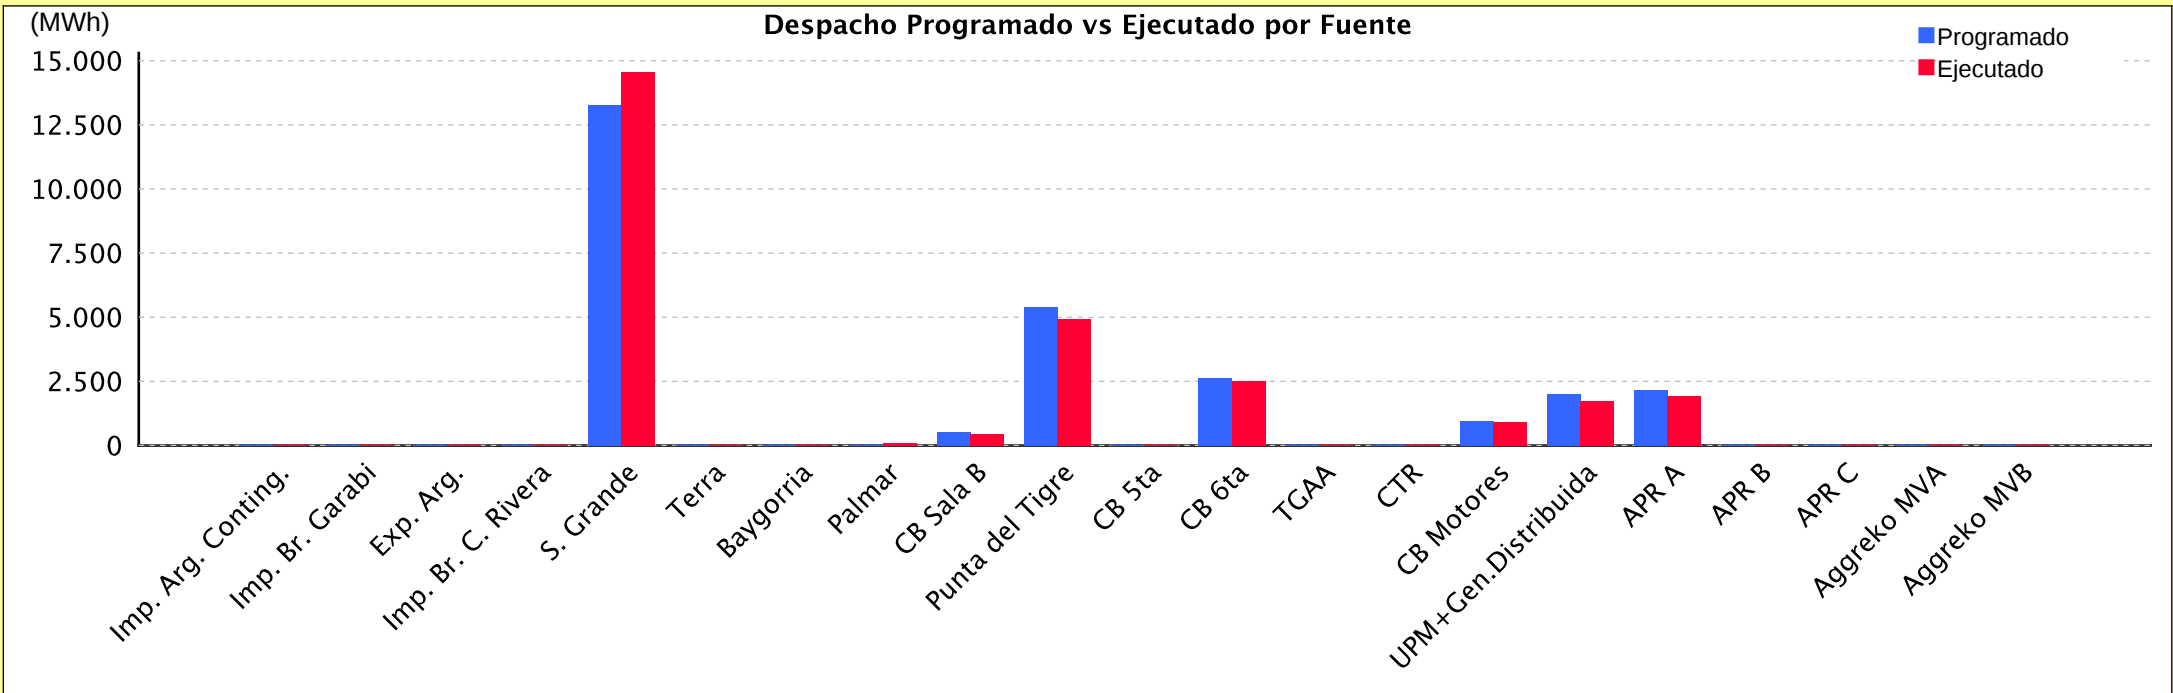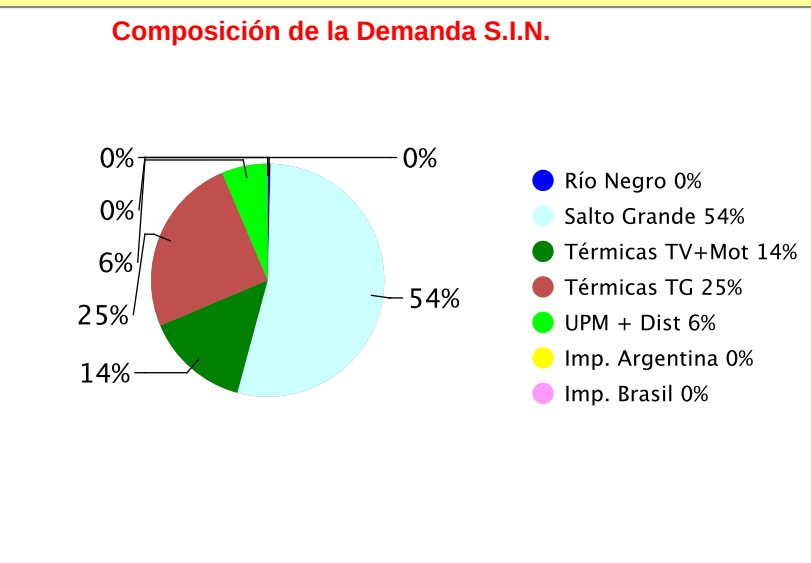



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

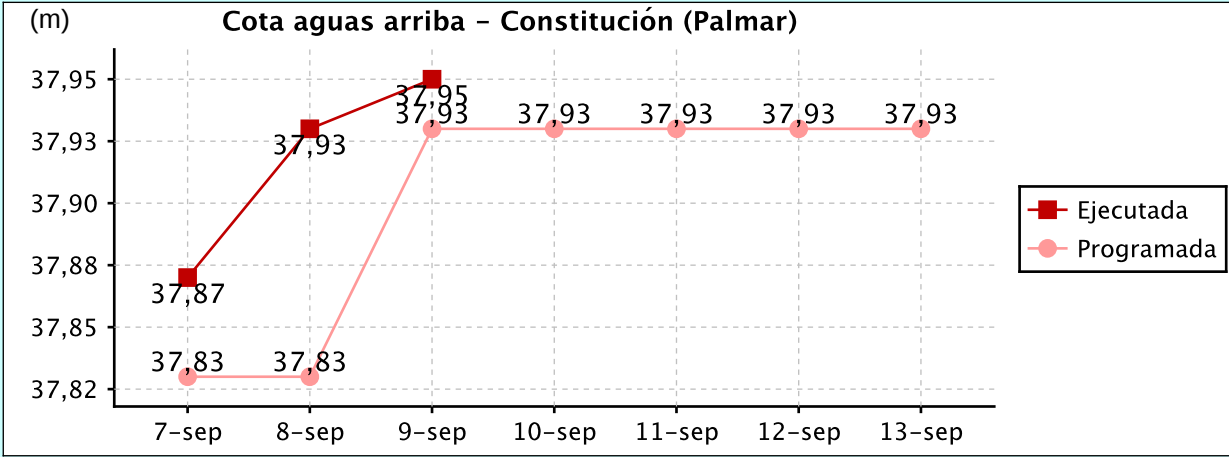
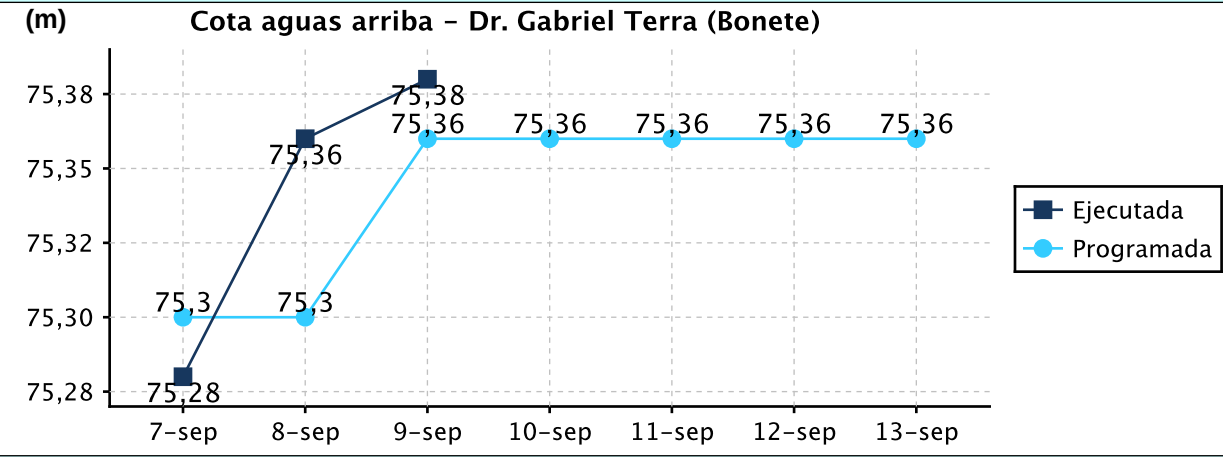


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	75,36	75,38
Baygorria	53,75	53,76
Palmar	37,93	37,95
SGU	33,95	33,86

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

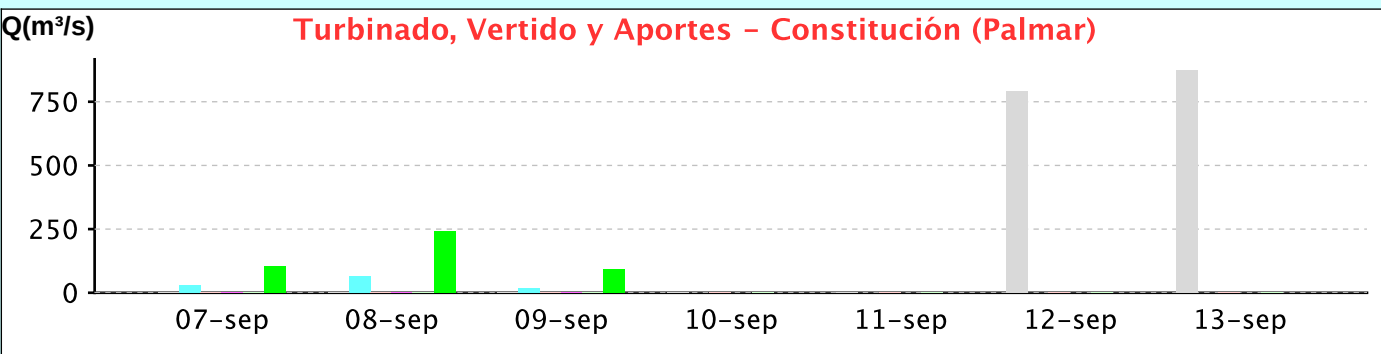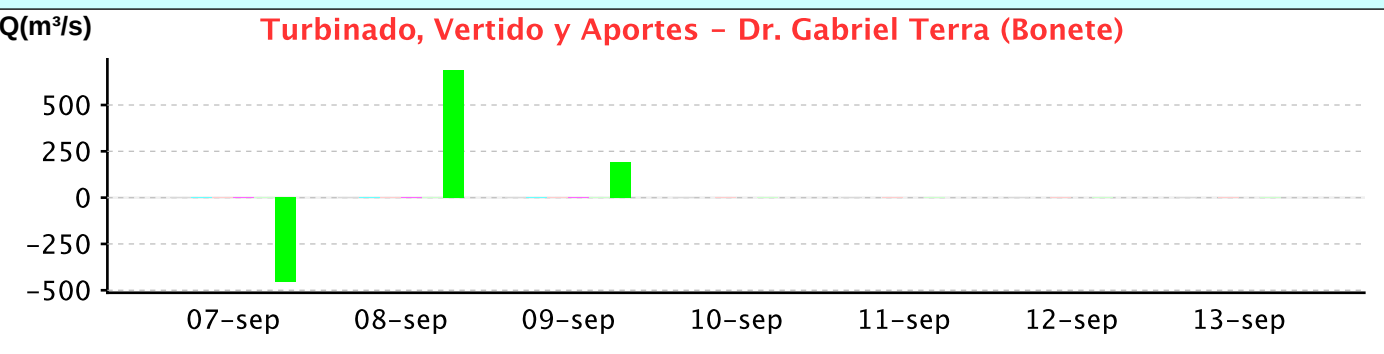

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

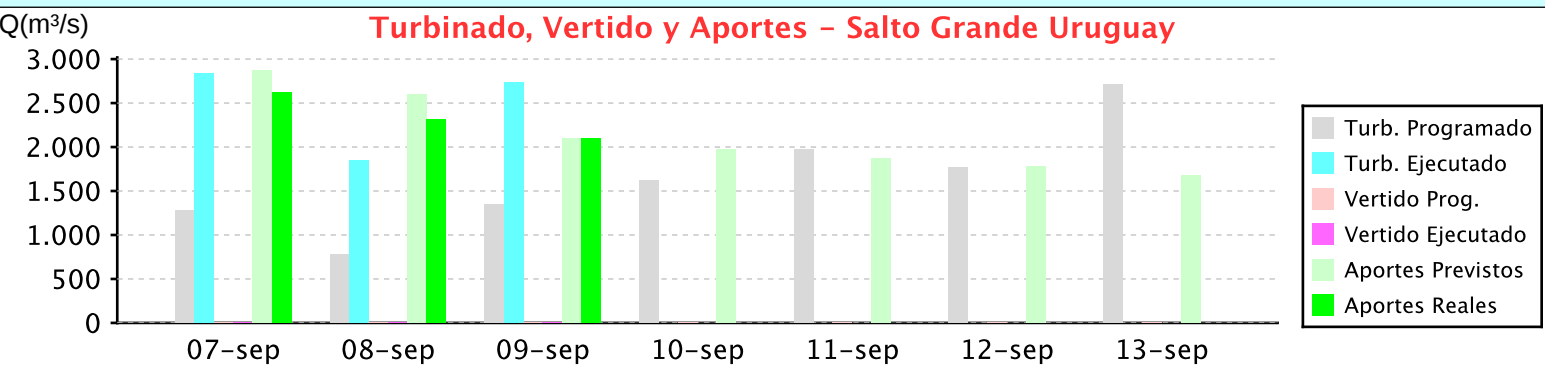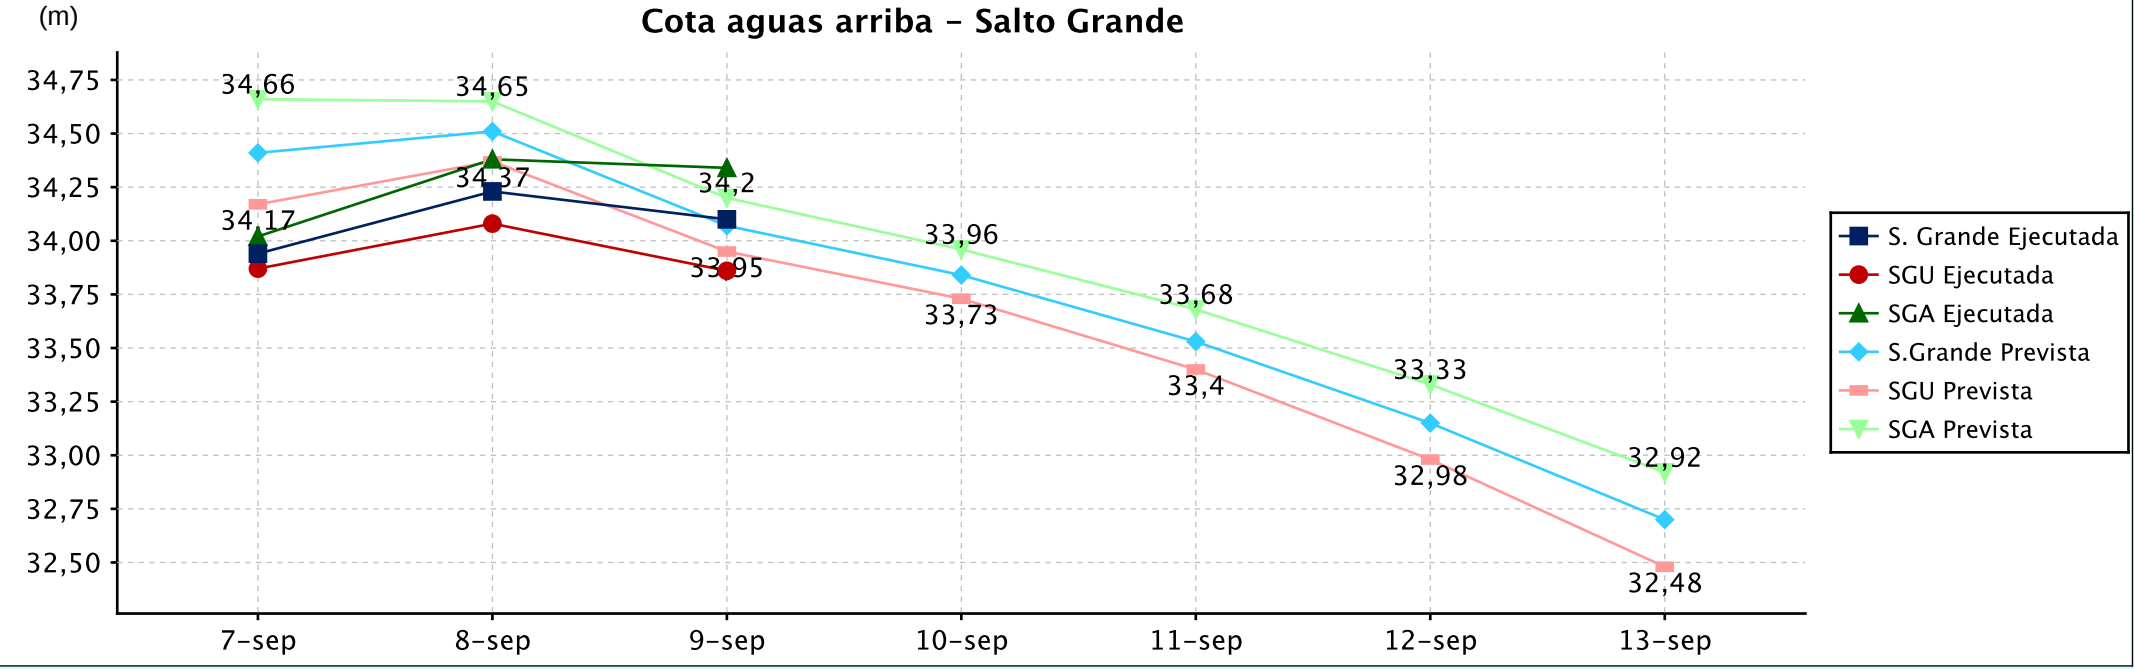

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,86
Cota Vista Arg	34,34
Cota real	34,10

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-10.323
------------------------------------	---------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	18
SGU	1.345	2.736

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	192
Baygorria	0	31
Palmar	0	90
SGU	2.100	2.104

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
