



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



martes 10 de septiembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	4.419
Sala B	1.113
5ta.	0
6ta.	2.351
Motores	956
Central La Tablada	-83
Central P. del Tigre	4.657
APR A	1.831
APR B	15
APR C	-2
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	0
C. Baygorria	133
C. Palmar	100
C. Salto Grande	15.118
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.748
TOTAL Generación	27.935

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.935
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.990
Diferencia (MWh)	945
Ejecutada - Programada	3,50 %

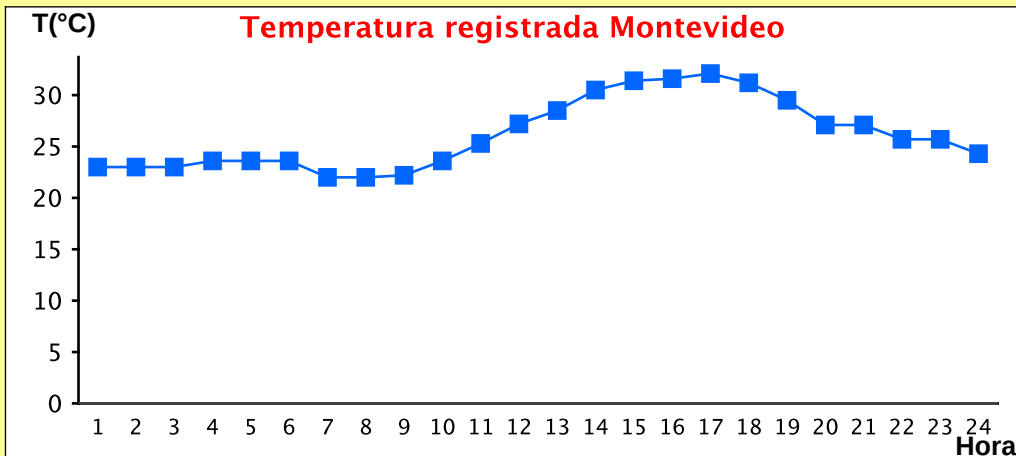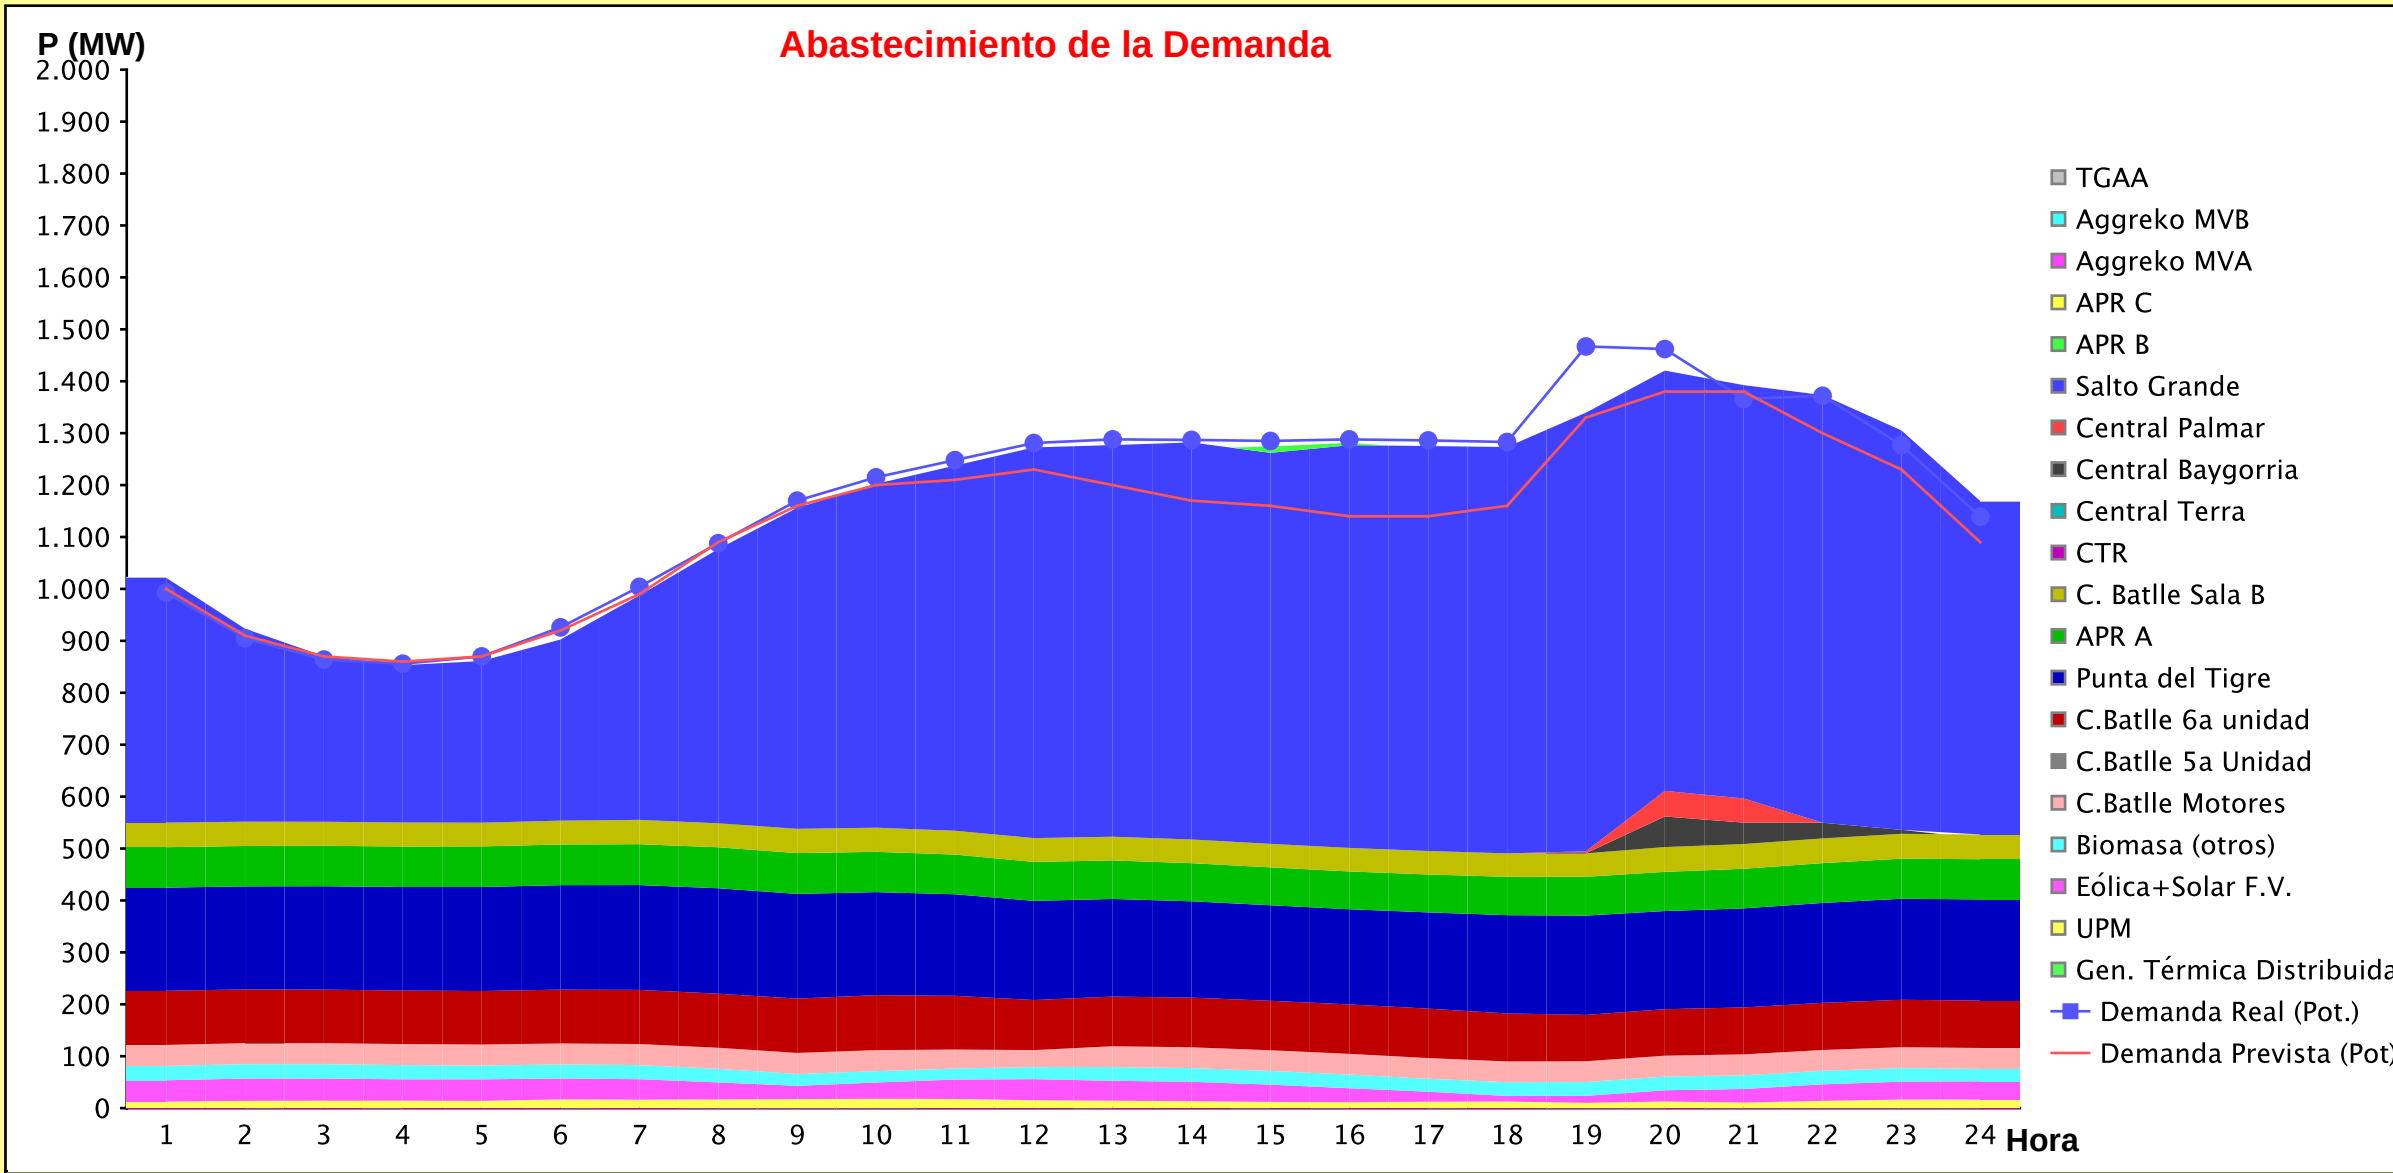



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1310,37 Hora 15:13
Potencia mínima:	844,04 Hora 03:48
Pico noche:	1473,75 Hora 19:09

Generación Media (MW)	
Eólica	32,8
Biomasa	43,1
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

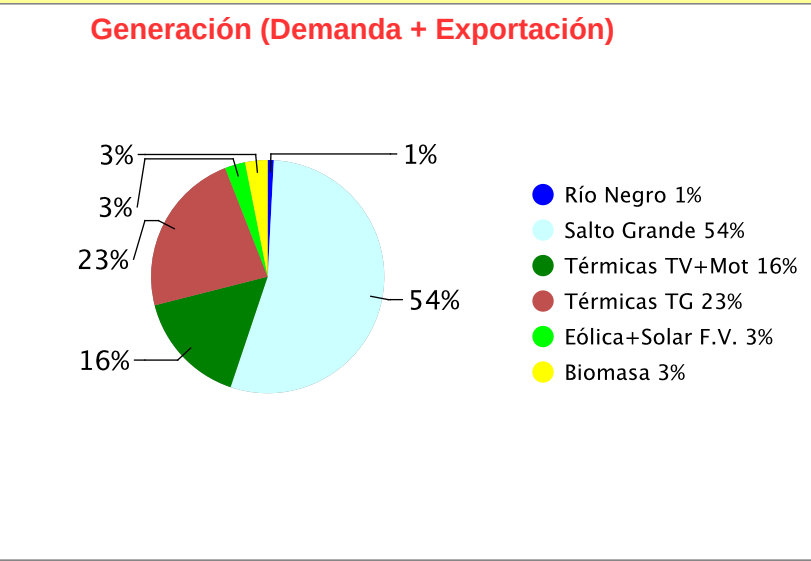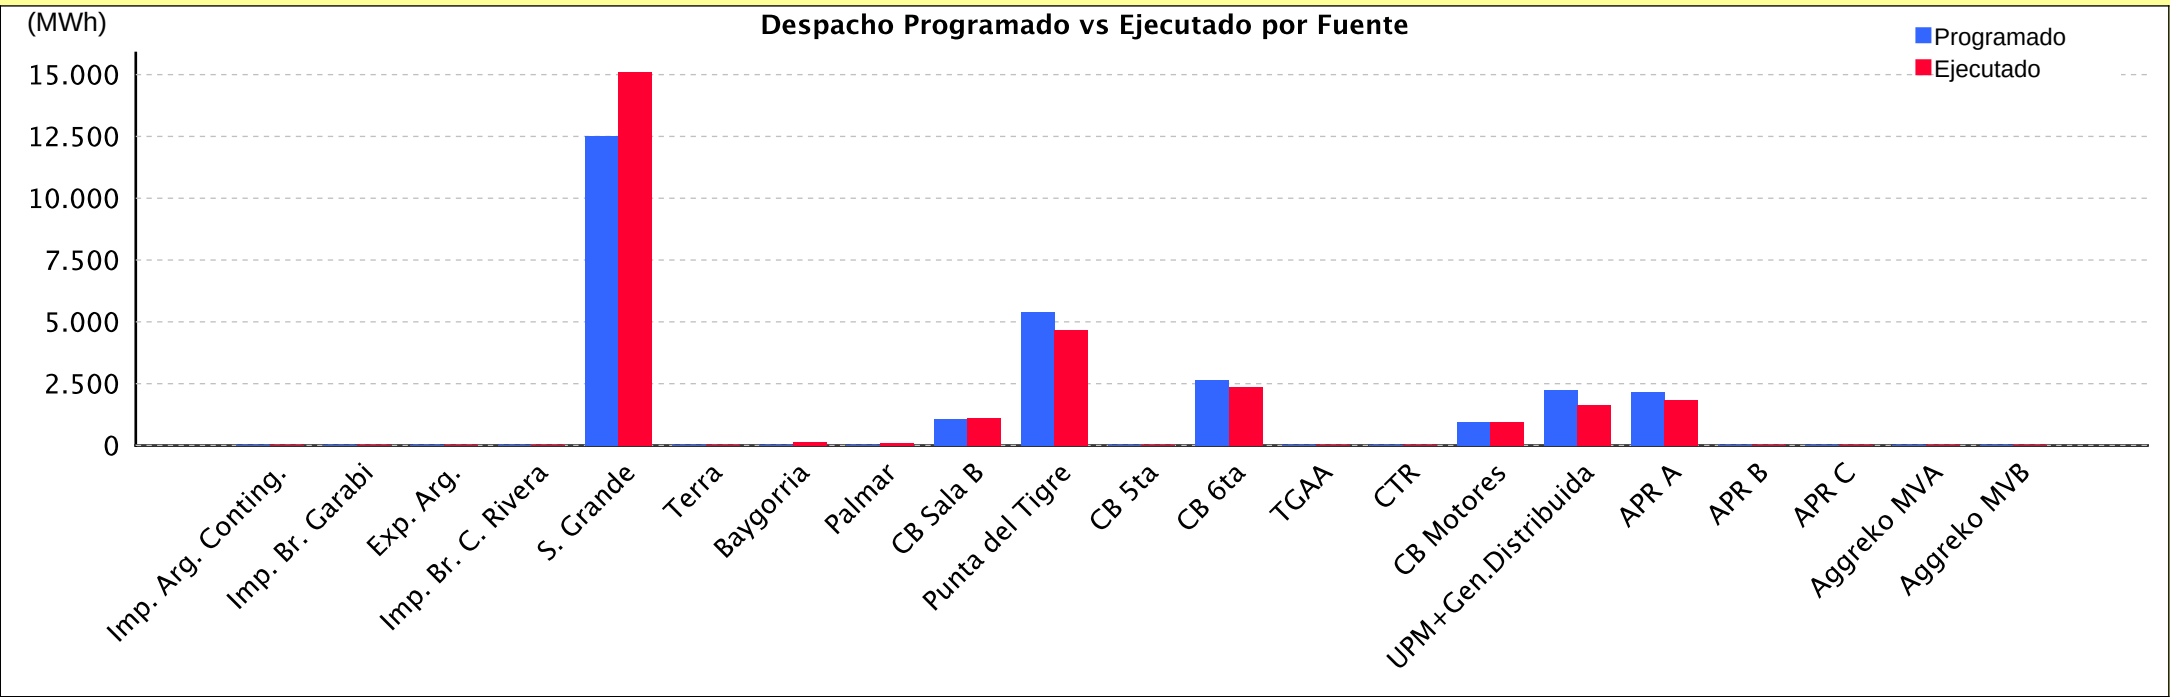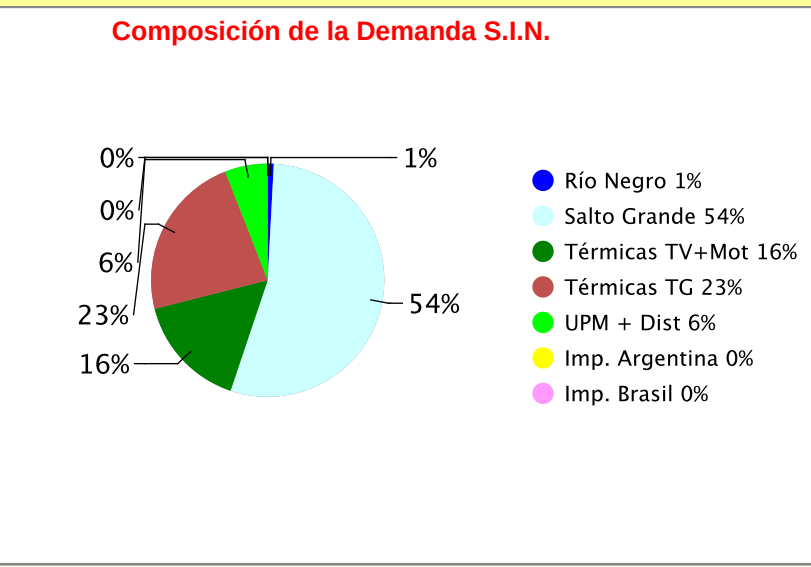



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

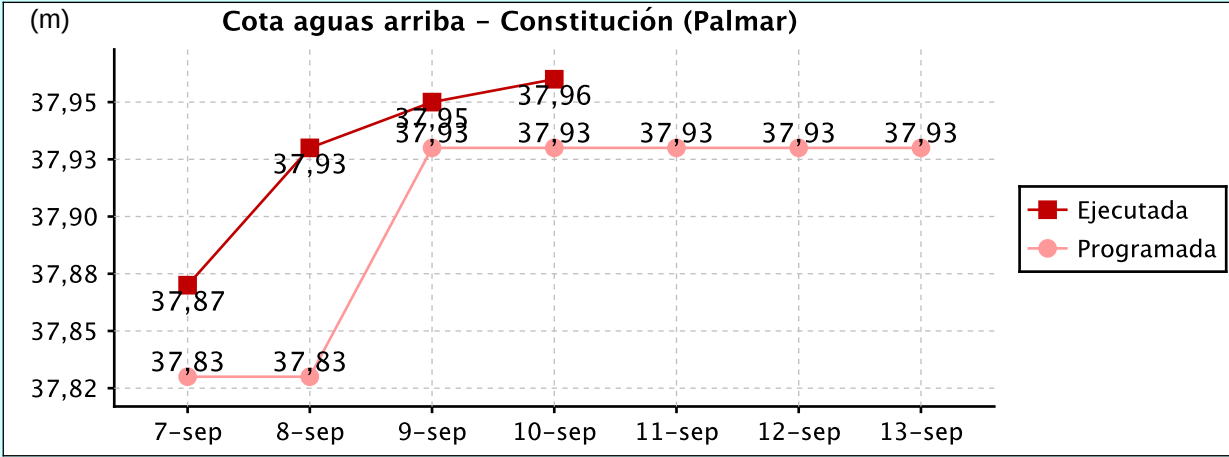
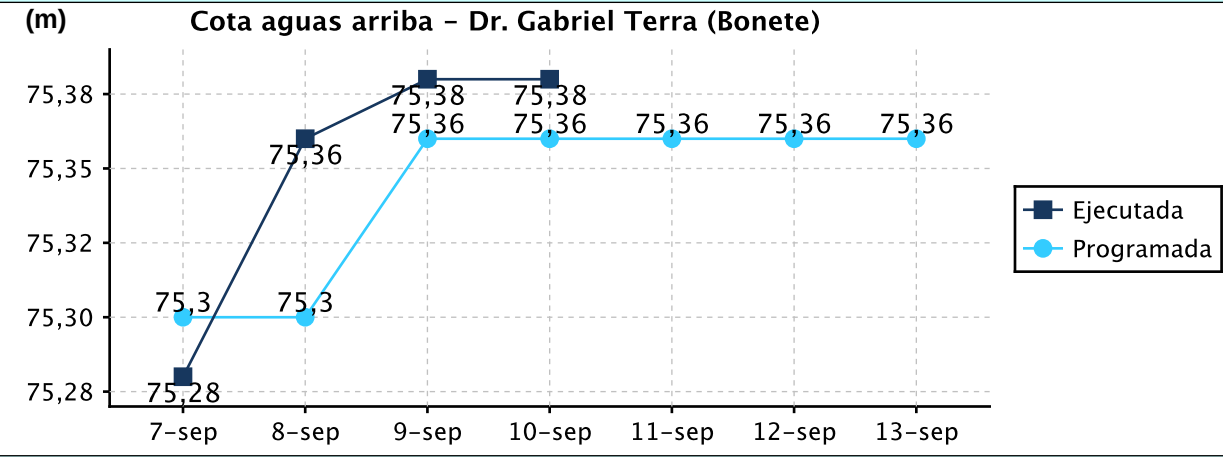


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	75,36	75,38
Baygorria	53,75	53,73
Palmar	37,93	37,96
SGU	33,73	33,55

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

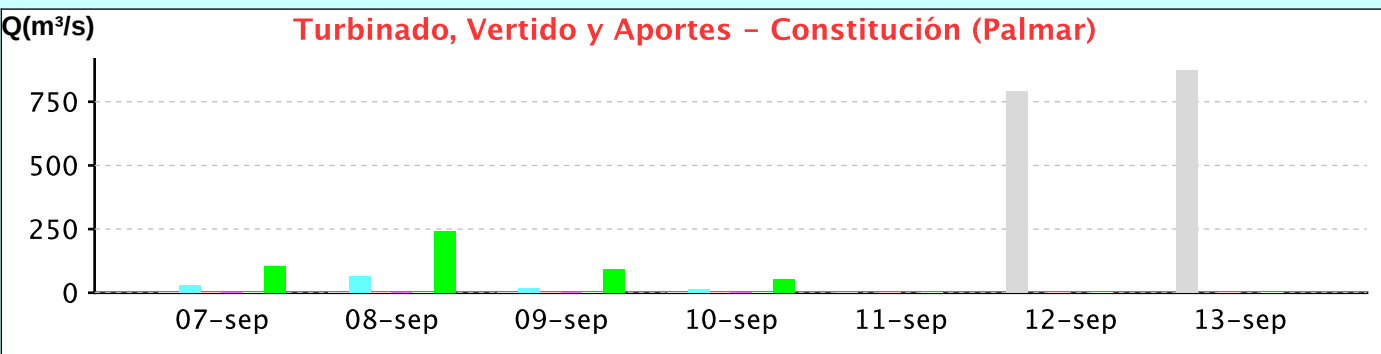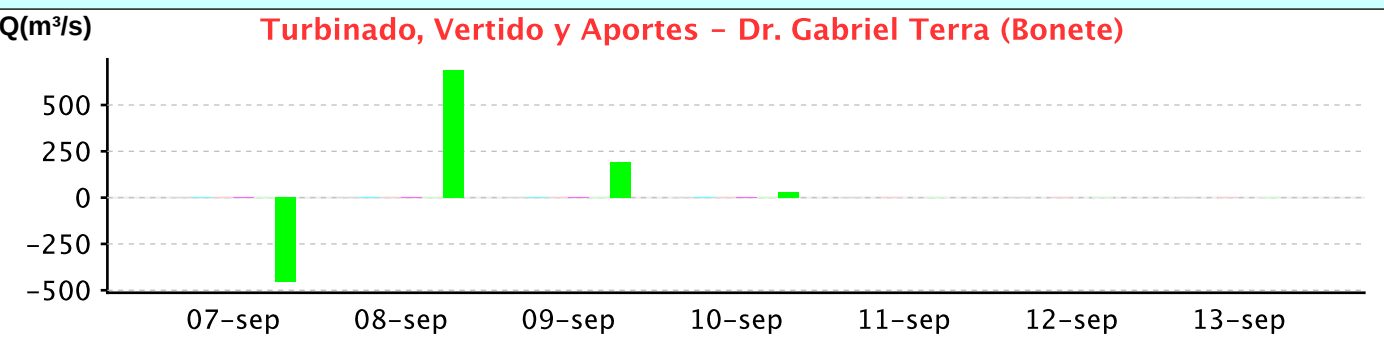

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

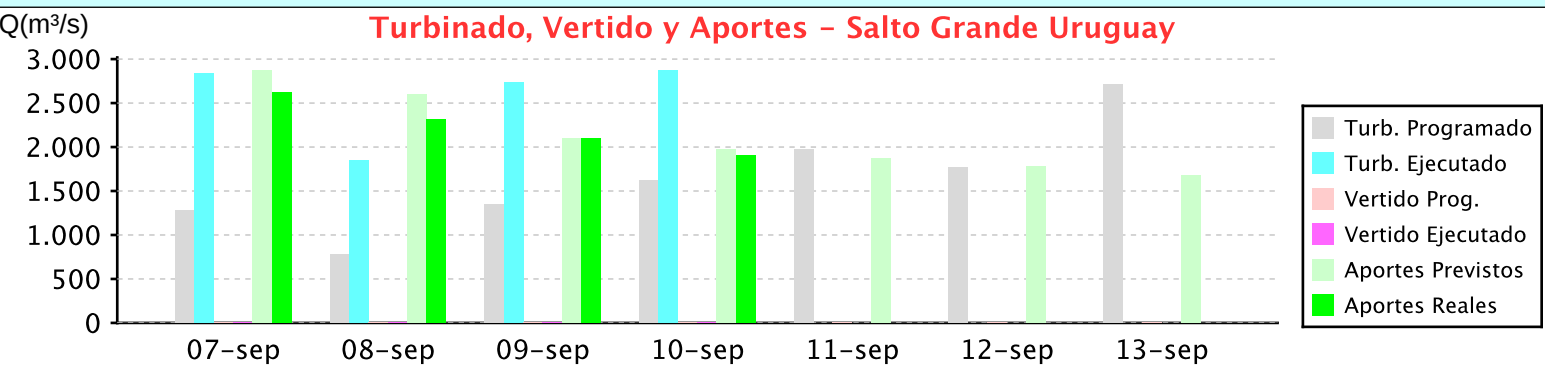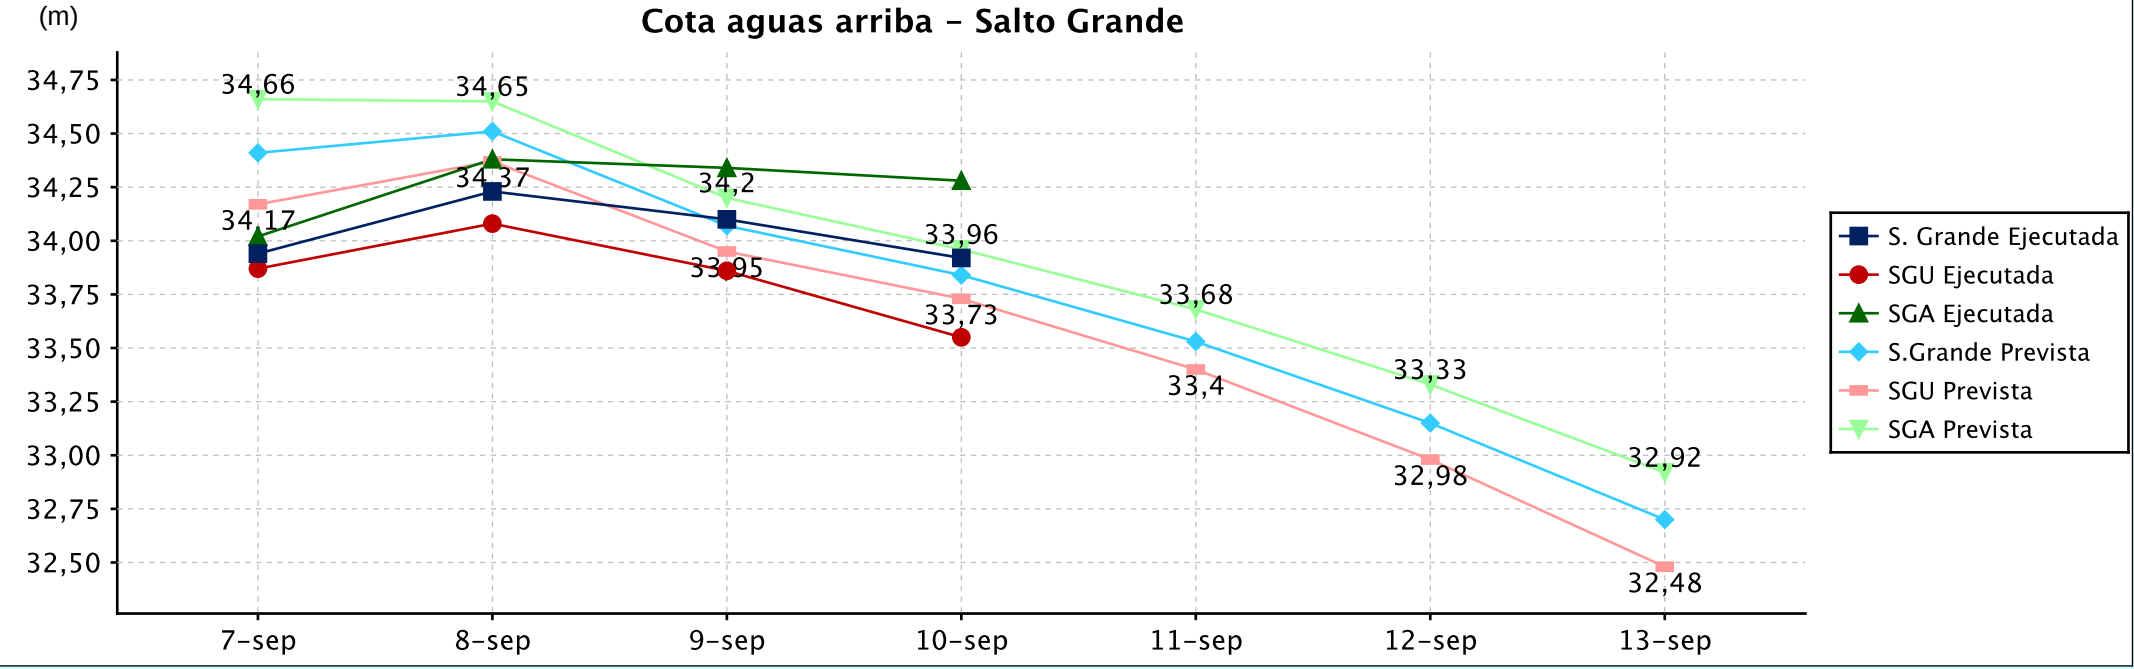

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,55
Cota Vista Arg	34,28
Cota real	33,92

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-14.901
------------------------------------	---------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	44
Palmar	0	16
SGU	1.619	2.867

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	30
Baygorria	0	16
Palmar	0	54
SGU	1.975	1.908

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
