



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



viernes 13 de septiembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	4.595
Sala B	1.135
5ta.	0
6ta.	2.575
Motores	885
Central La Tablada	-90
Central P. del Tigre	5.121
APR A	2.015
APR B	-2
APR C	-1
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	0
C. Baygorria	1.021
C. Palmar	5.066
C. Salto Grande	8.358
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.566
TOTAL Generación	27.646

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.646
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.420
Diferencia (MWh)	-1.774
Ejecutada - Programada	-6,03 %

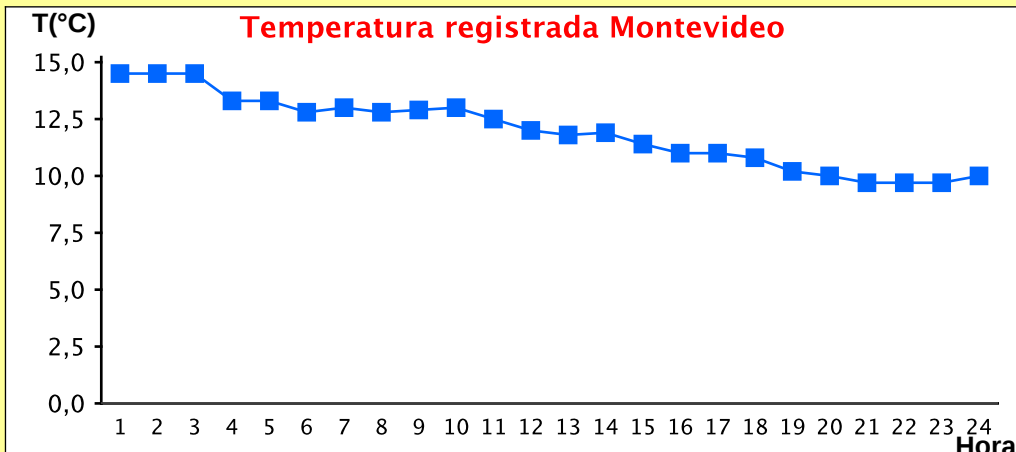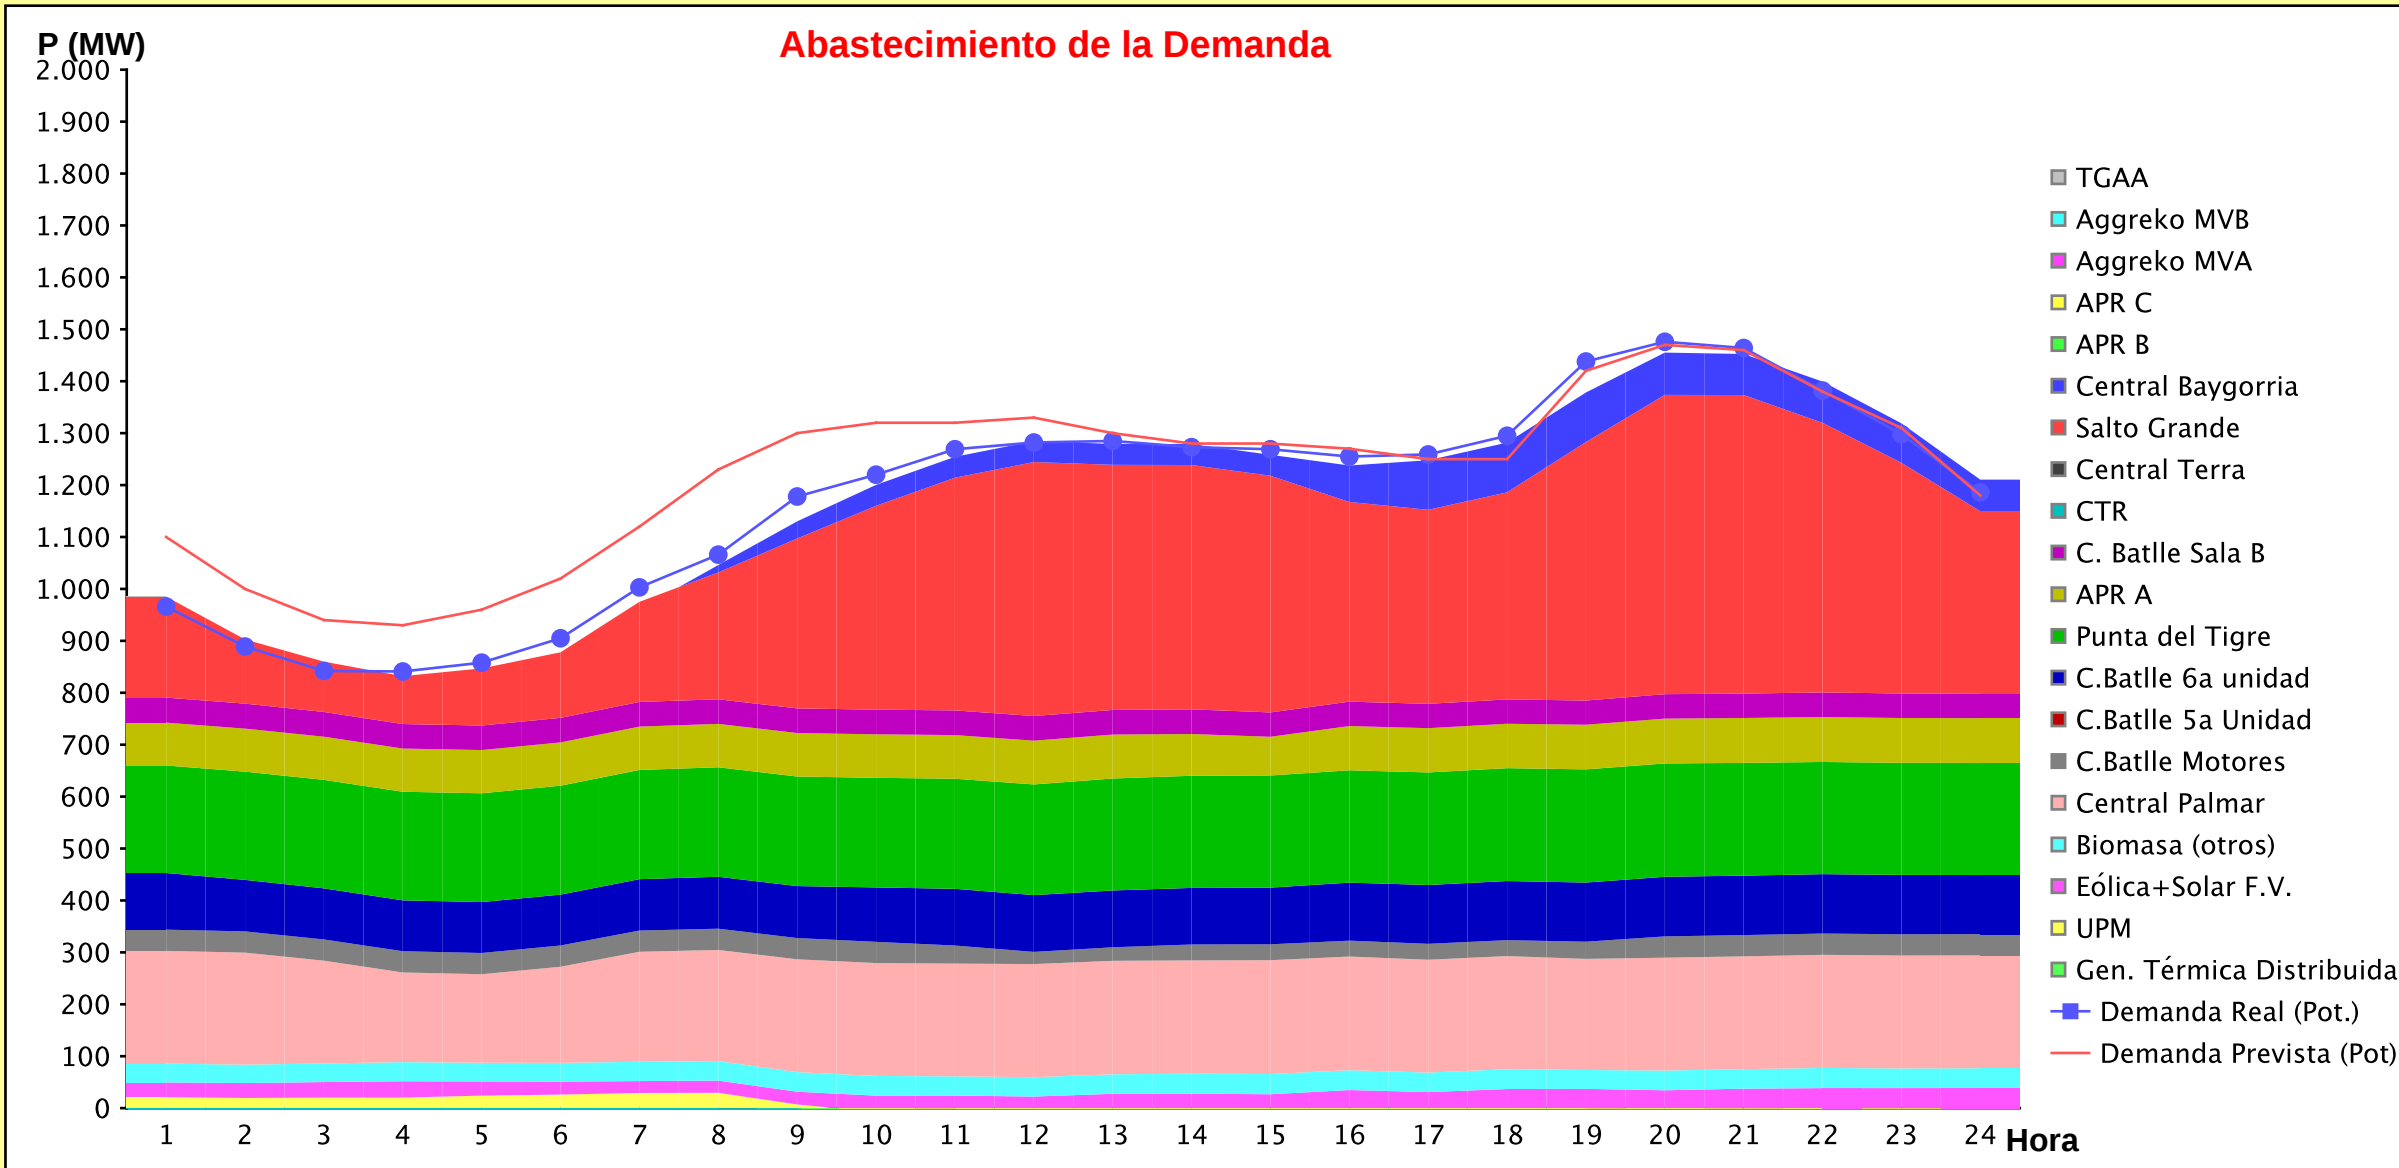



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1310,35 Hora 13:04
Potencia mínima:	829,05 Hora 03:19
Pico noche:	1485,01 Hora 19:49

Generación Media (MW)	
Eólica	30,3
Biomasa	48,8
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

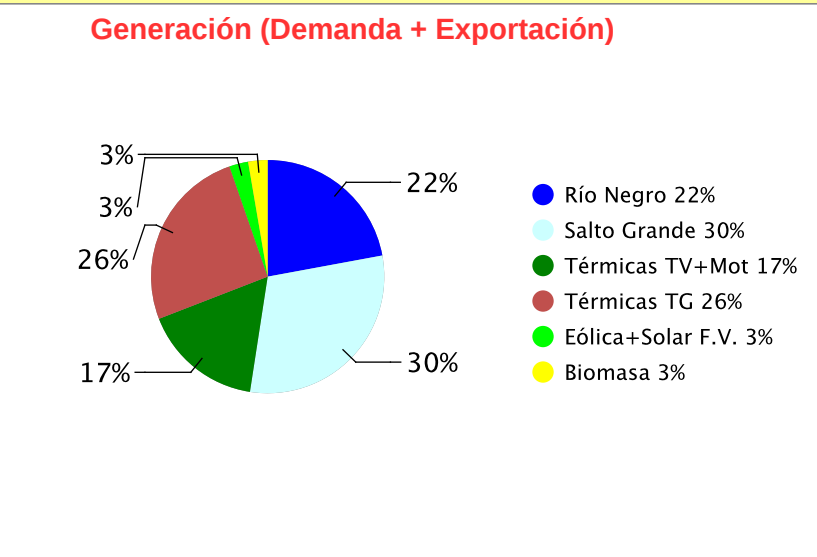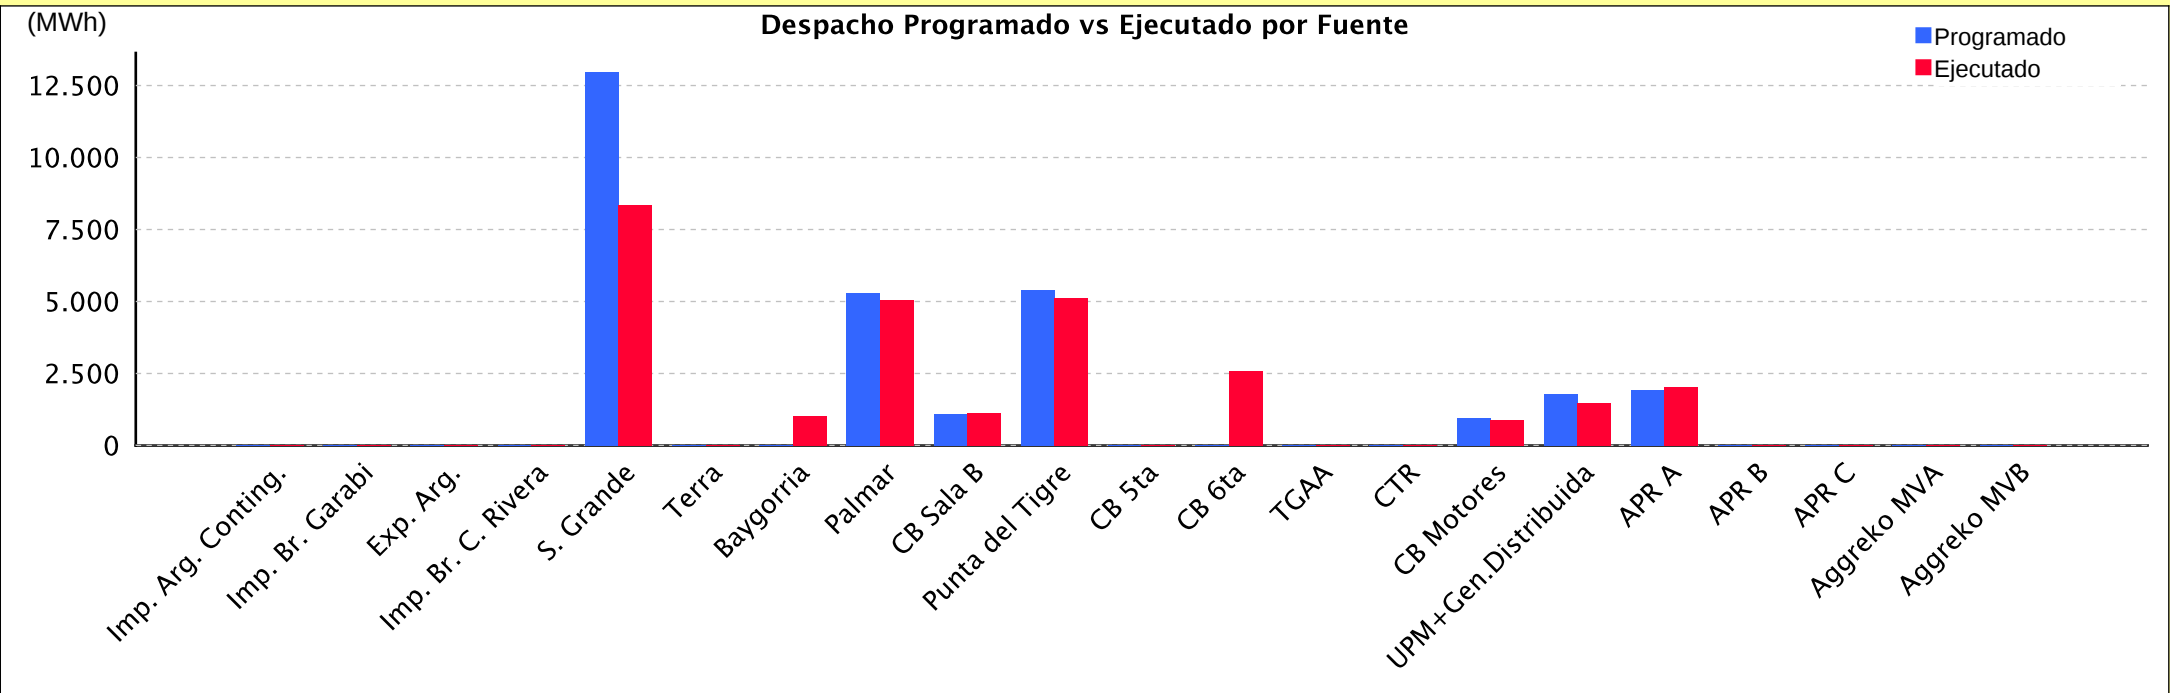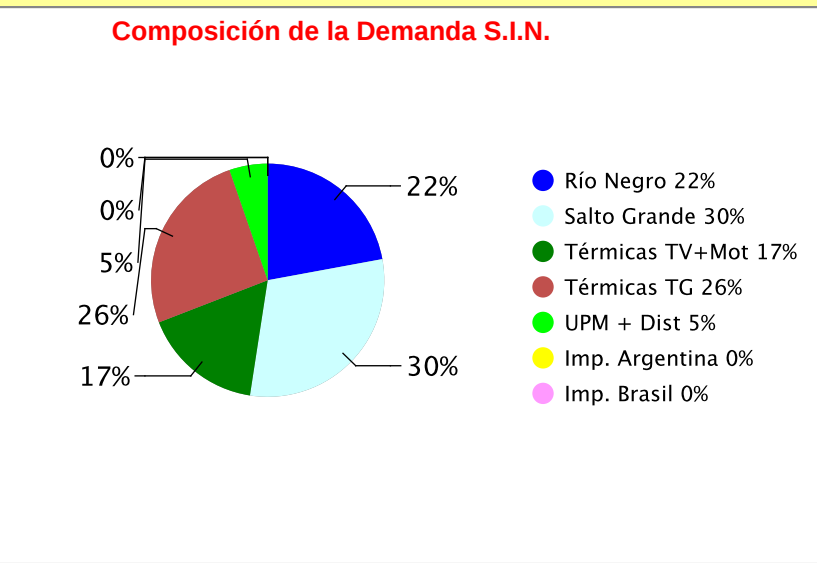



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

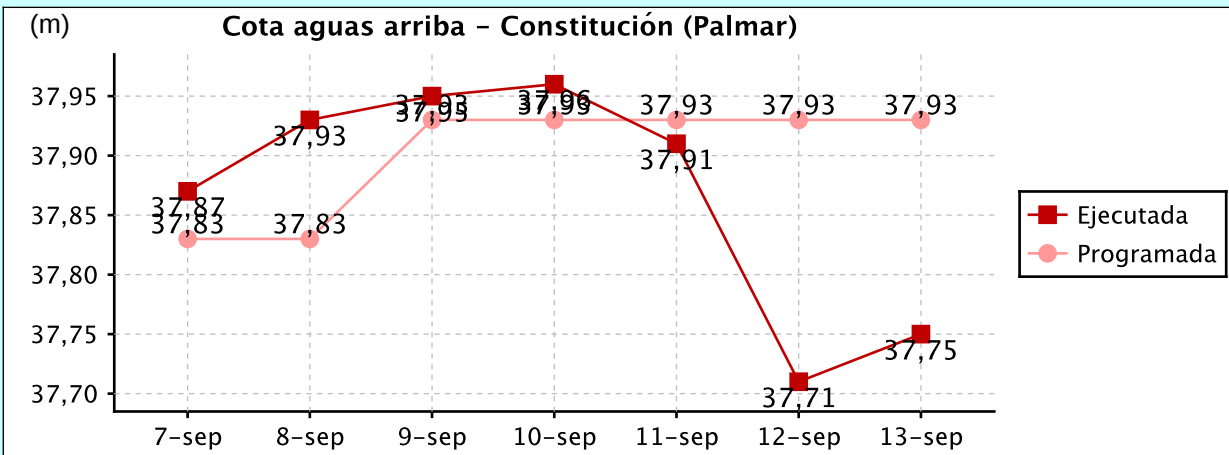
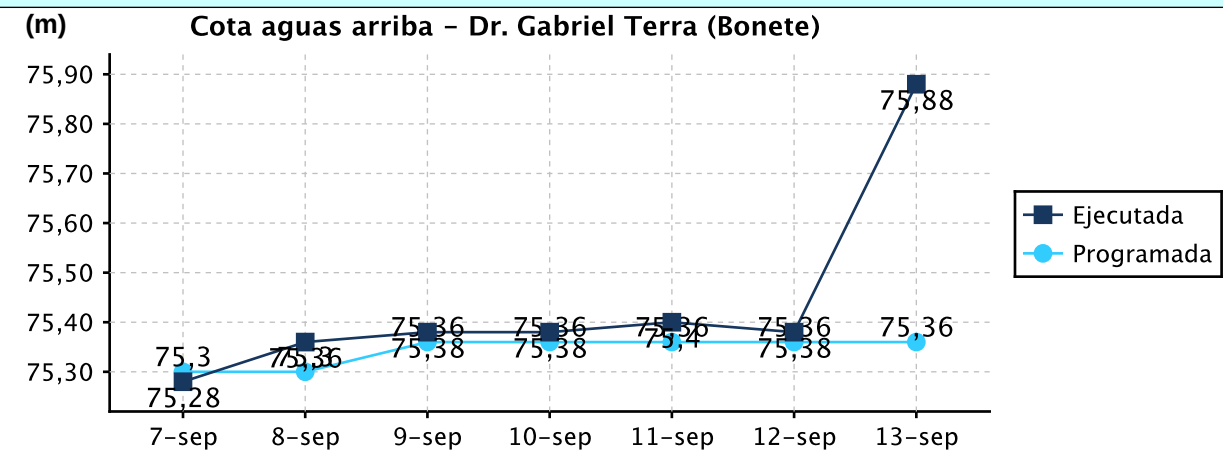


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	75,36	75,88
Baygorria	53,75	54,03
Palmar	37,93	37,75
SGU	32,48	33,18

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

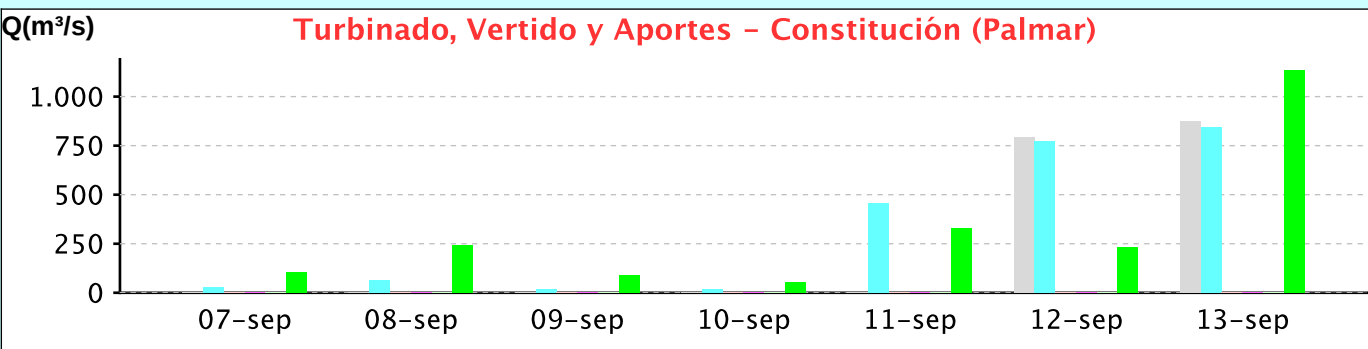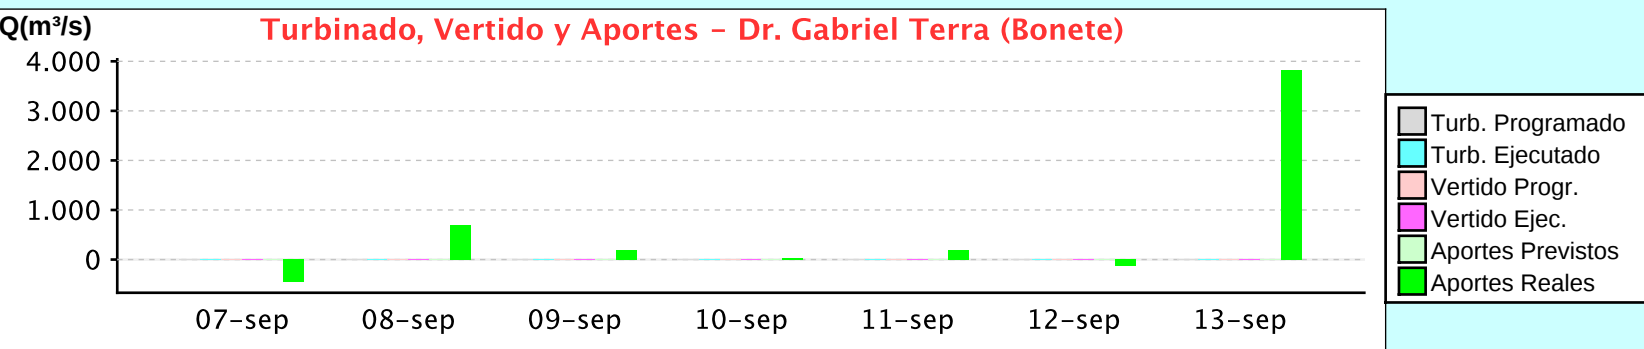

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

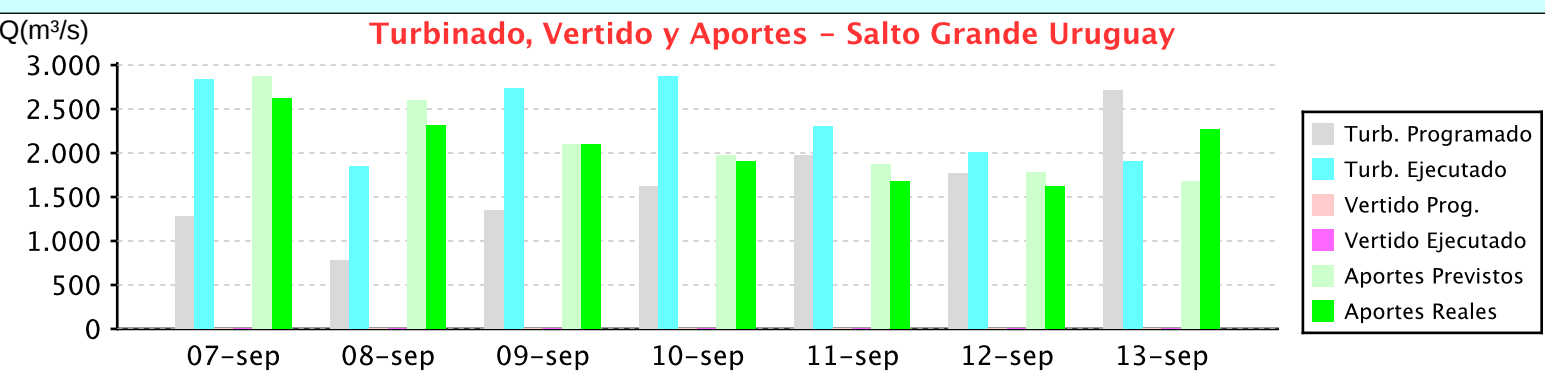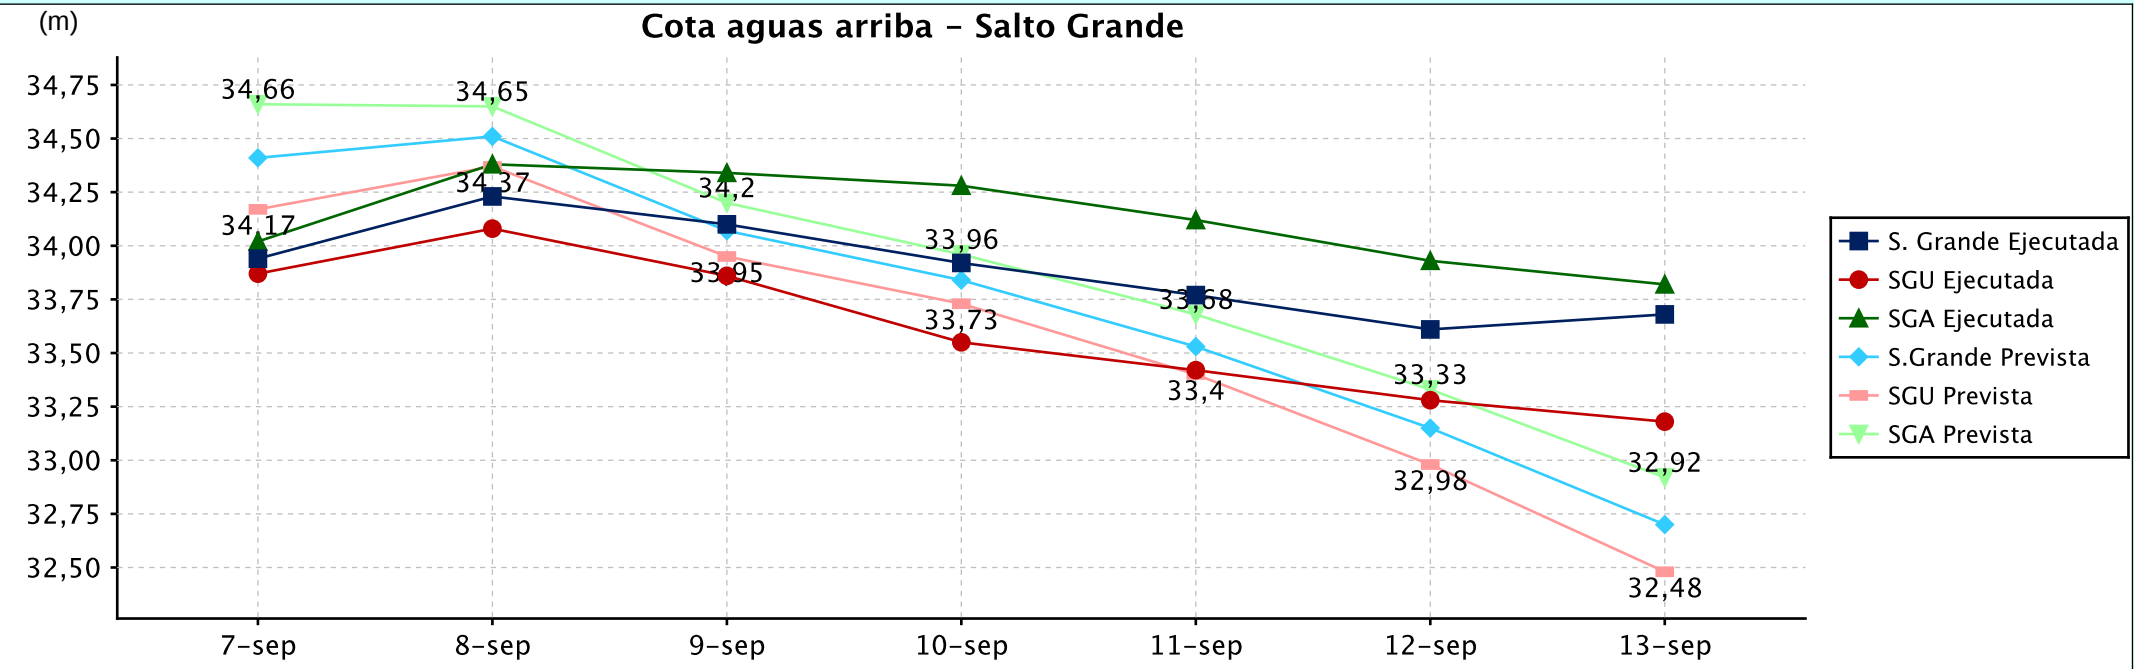

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,18
Cota Vista Arg	33,82
Cota real	33,68

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-12.203
------------------------------------	---------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	704
Palmar	873	842
SGU	2.712	1.905

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	3.826
Baygorria	0	1.476
Palmar	0	1.133
SGU	1.675	2.270

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
