




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 15 de septiembre de 2013


Generación Térmica	
Central Battle	4.853
Sala B	1.158
5ta.	0
6ta.	2.717
Motores	978
Central La Tablada	-96
Central P. del Tigre	5.106
APR A	1.206
APR B	-2
APR C	-1
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	41
C. Baygorria	2.202
C. Palmar	3.904
C. Salto Grande	8.658
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.137
TOTAL Generación	27.005

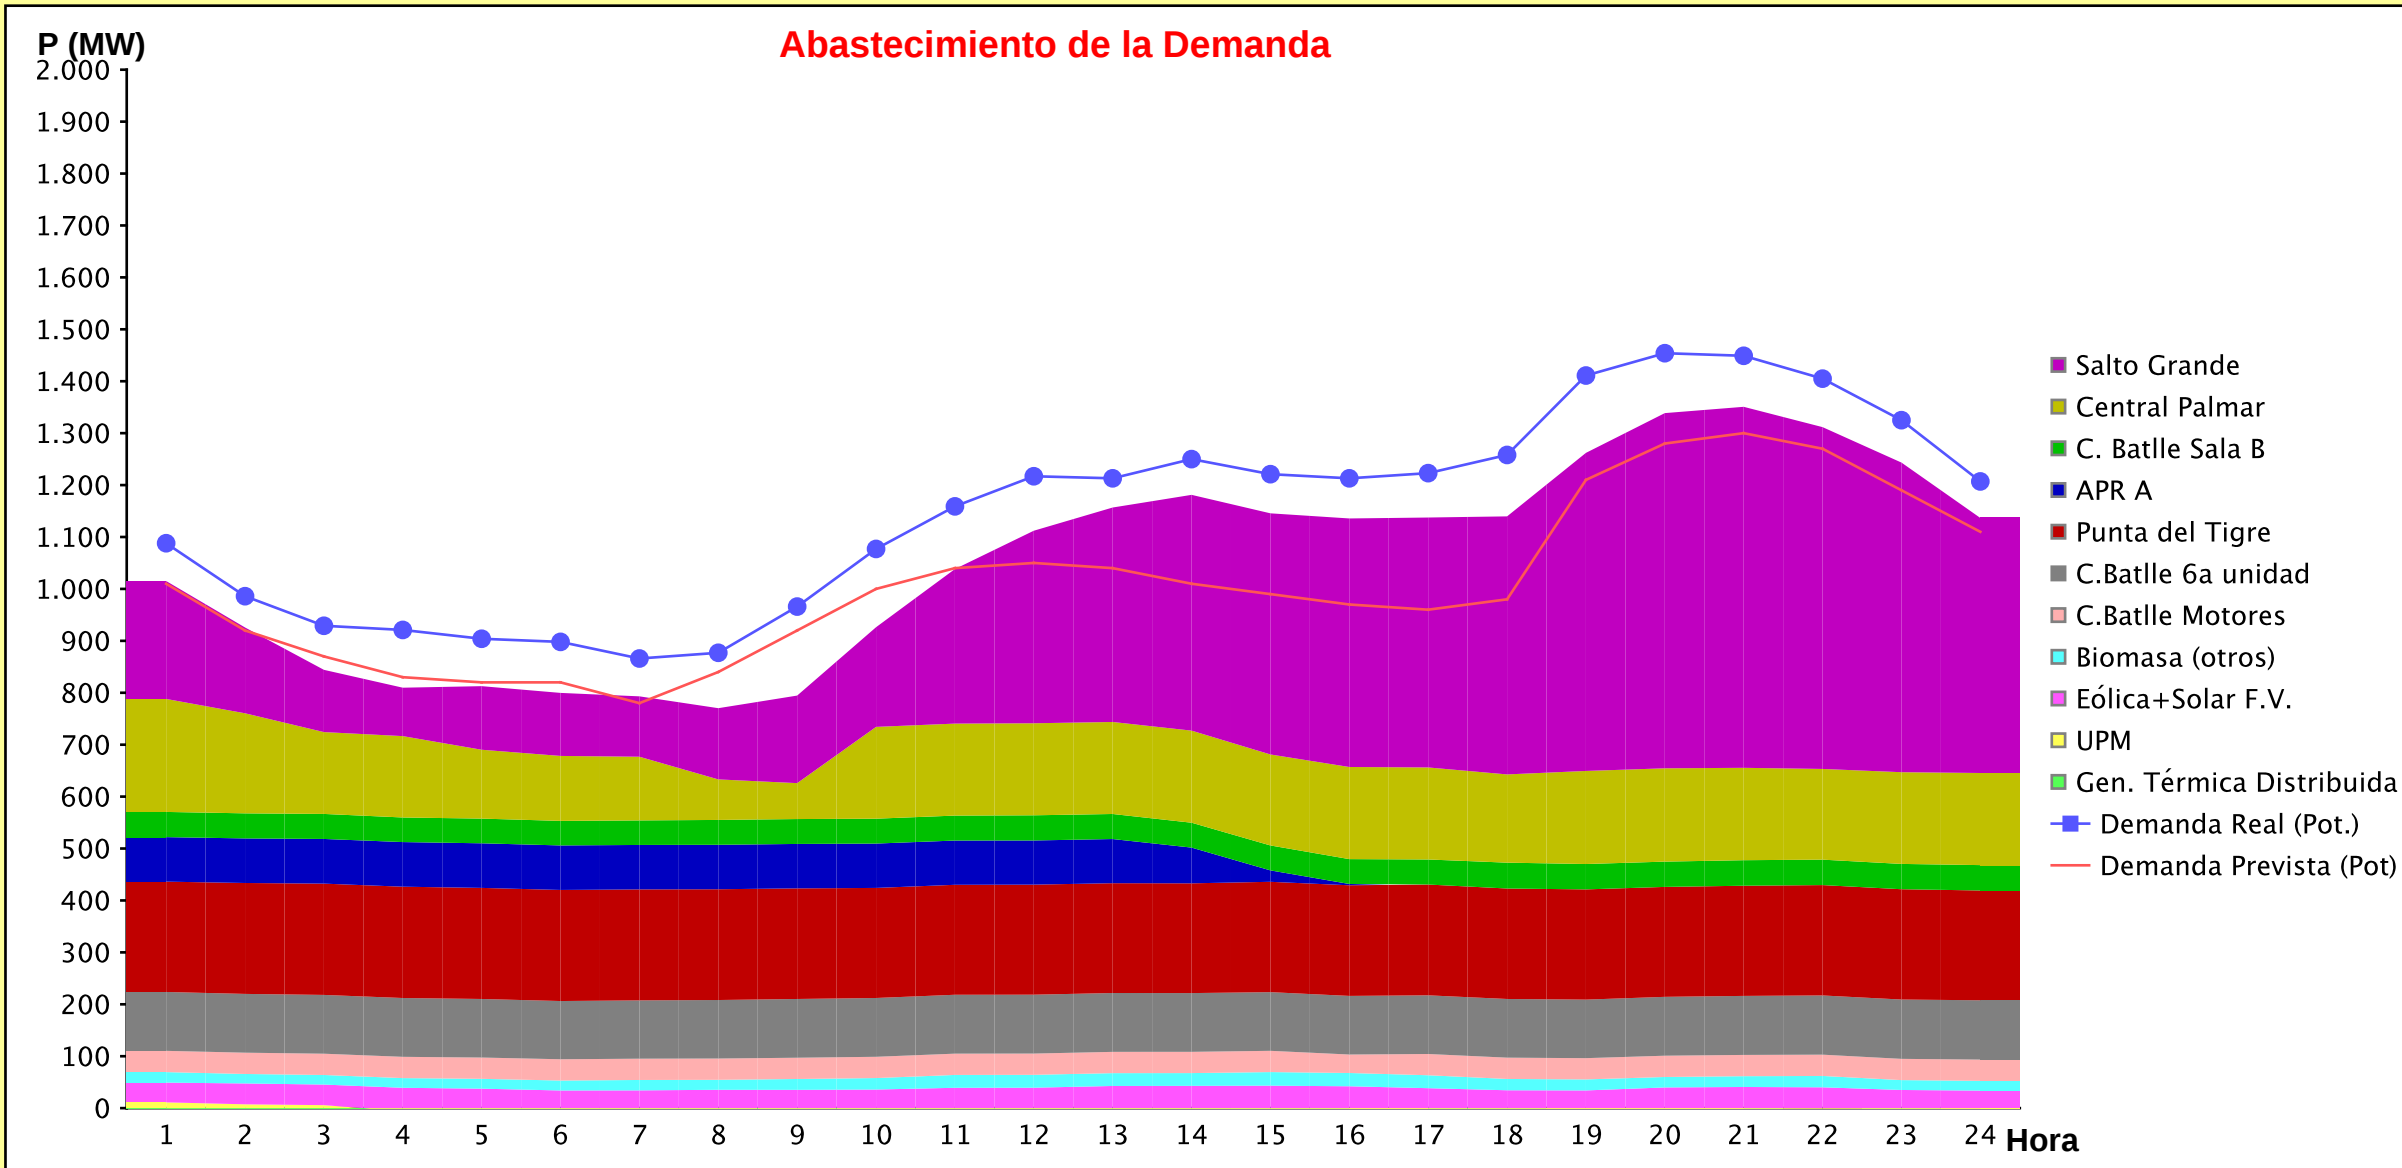

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.005
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	



Demanda Programada (MWh)	24.210
Diferencia (MWh)	2.795
Ejecutada - Programada	11,54 %

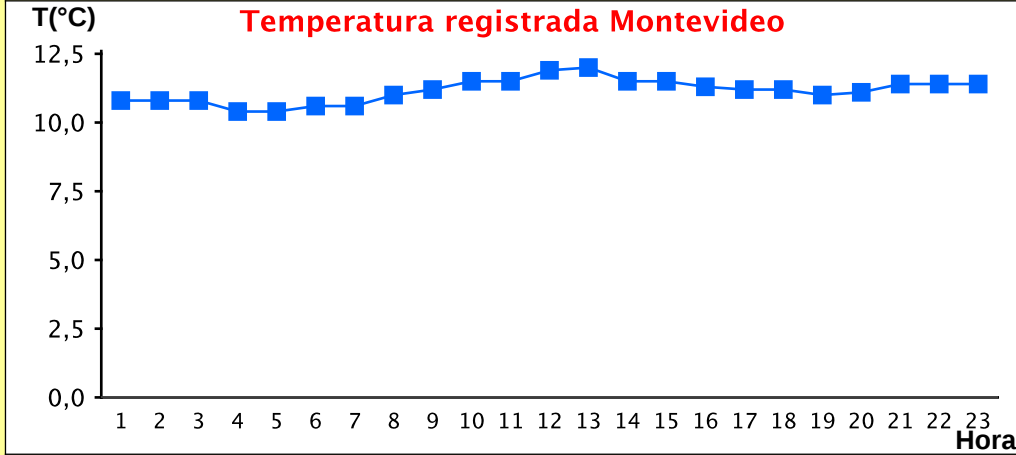


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1243 Hora 13:14
Potencia mínima:	826 Hora 07:19
Pico noche:	1452 Hora 20:33

Generación Media (MW)	
Eólica	38,2
Biomasa	25,2
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

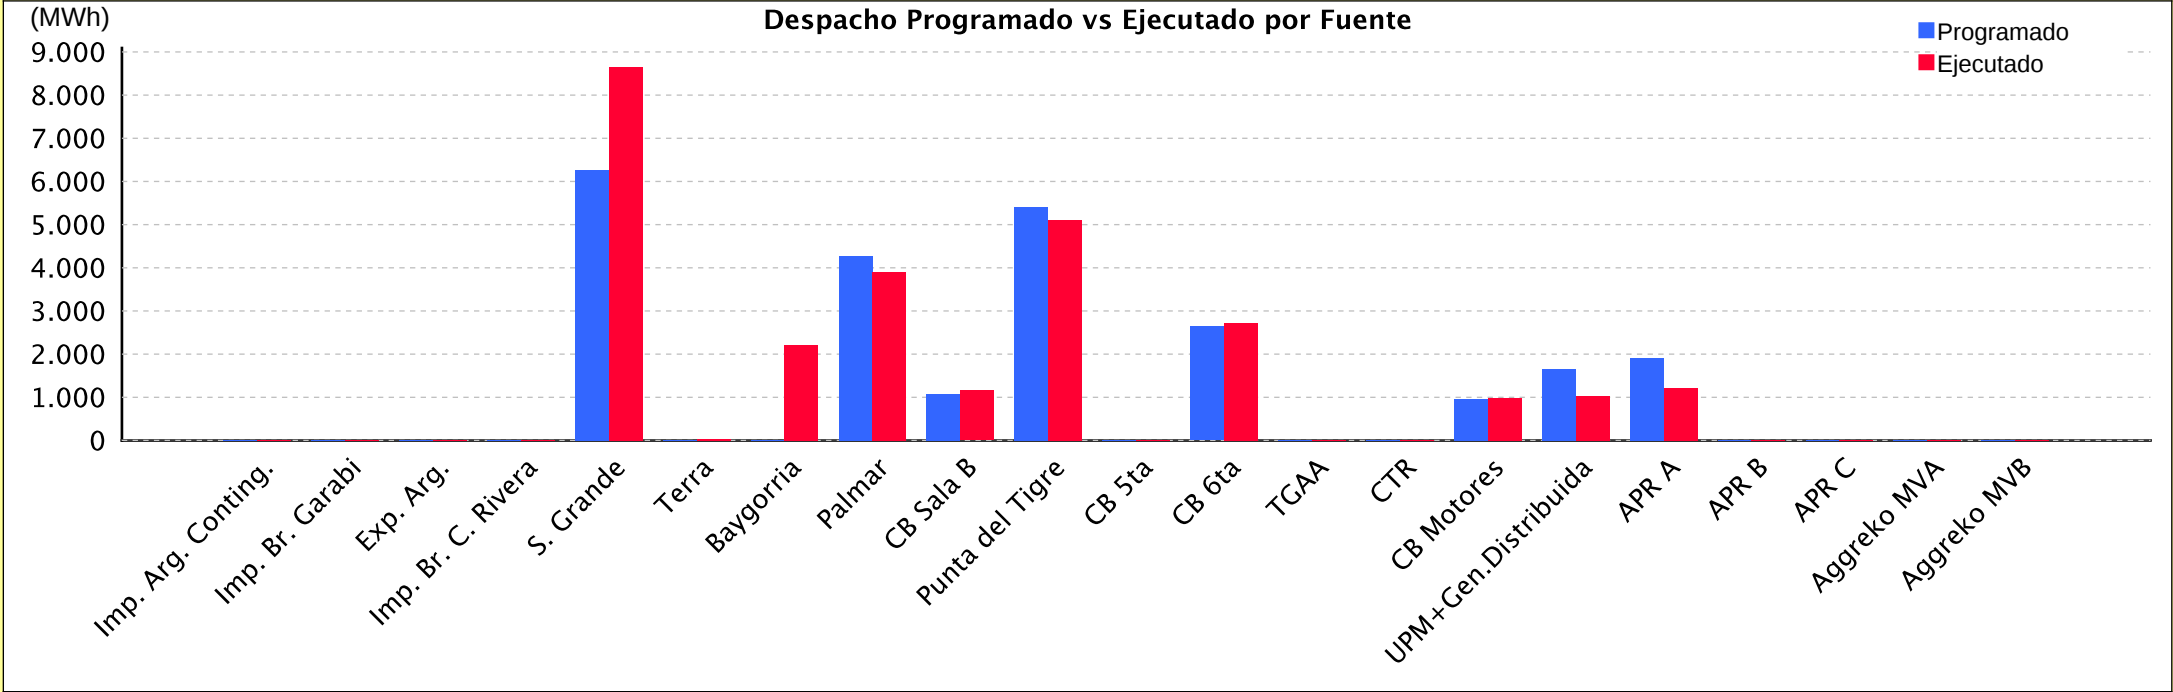
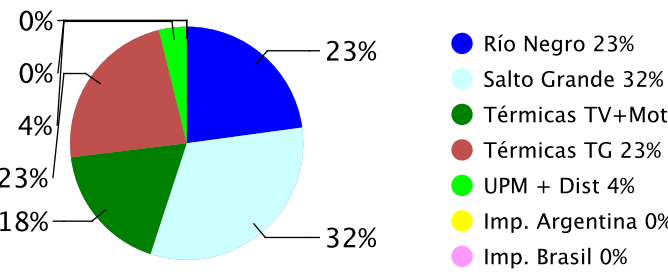


Generación (Demanda + Exportación)

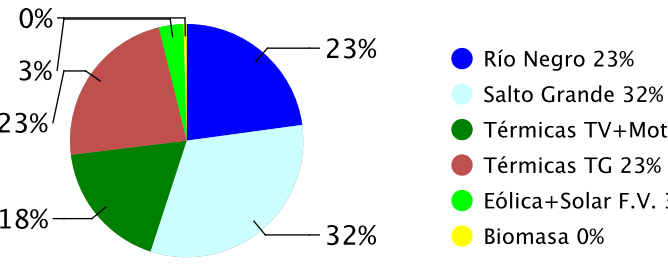



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

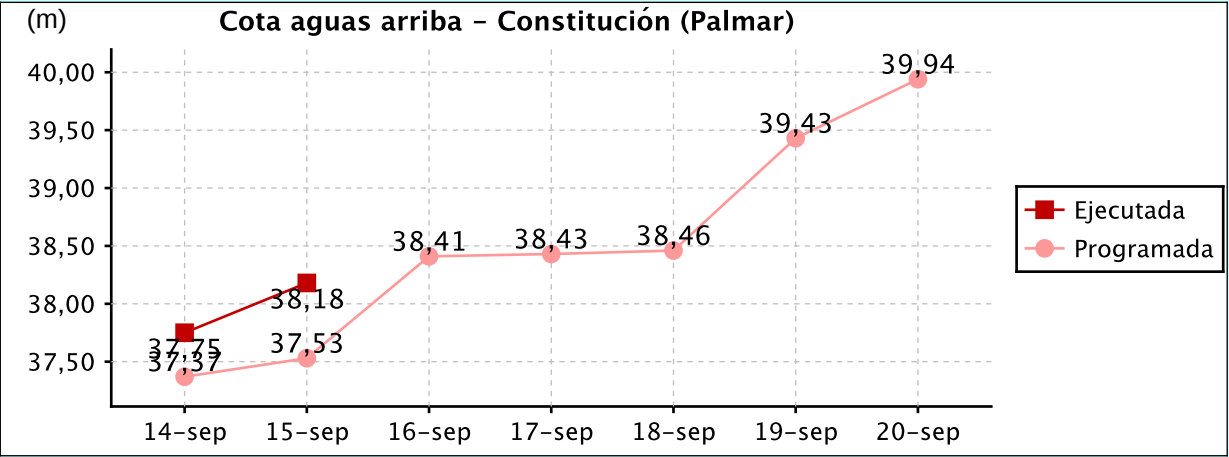
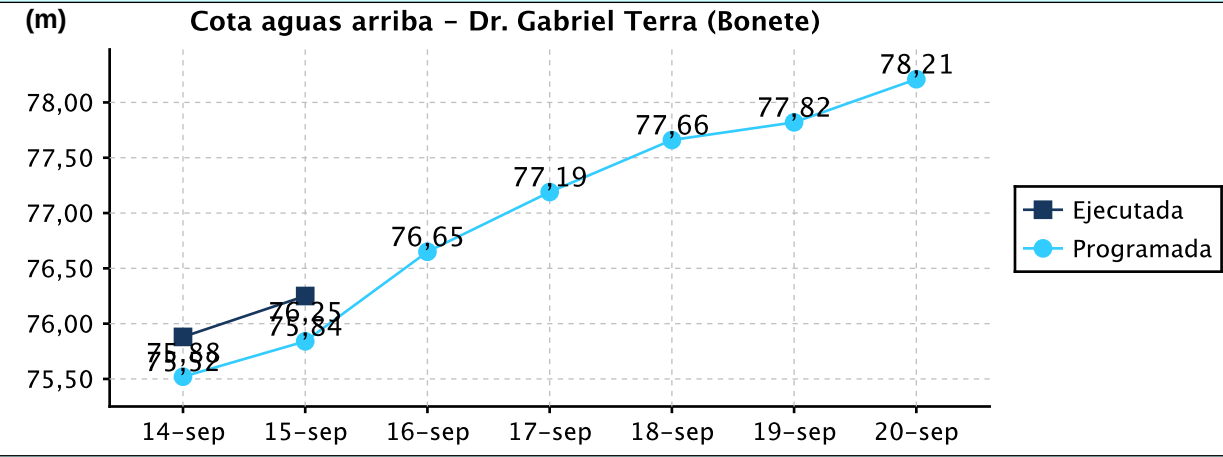


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	75,84	76,25
Baygorria	53,72	54,03
Palmar	37,53	38,18
SGU	33,69	33,98

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

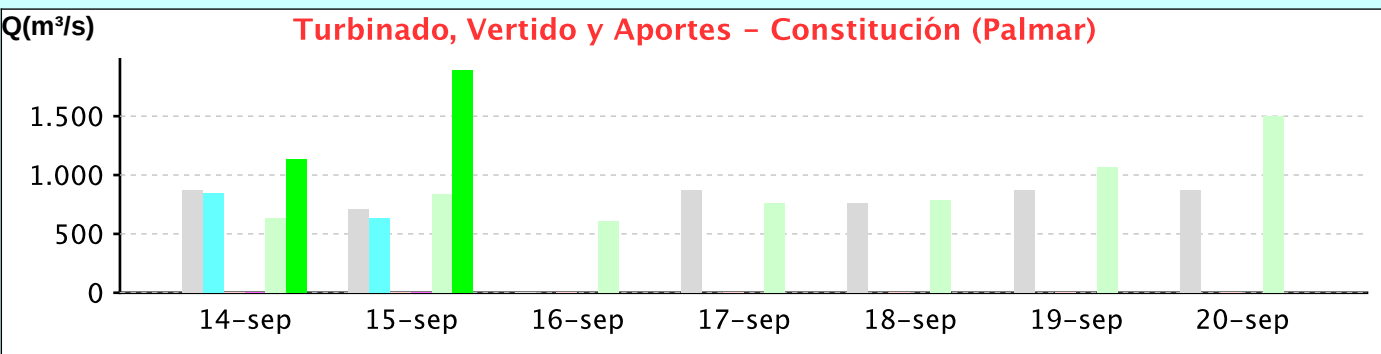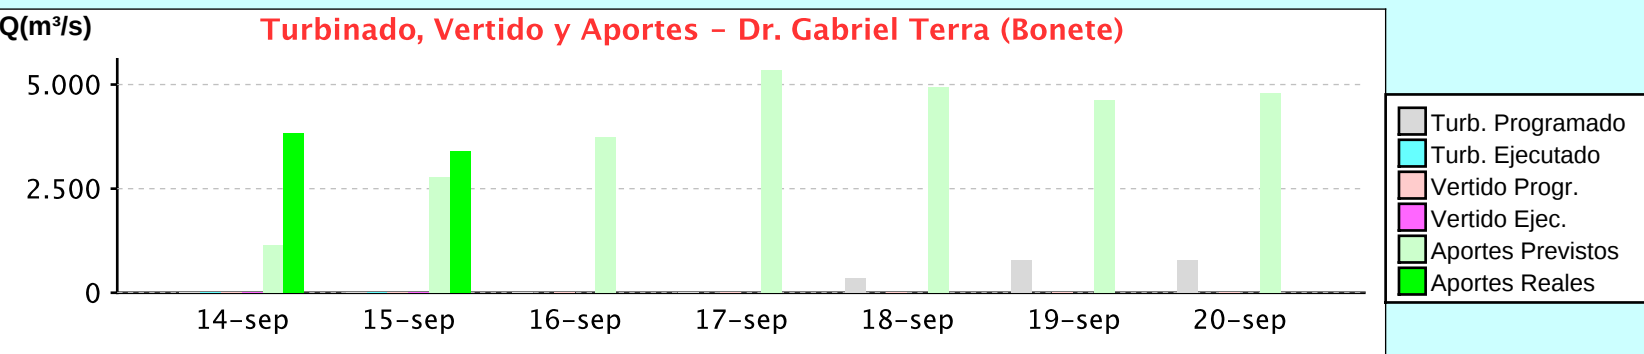

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

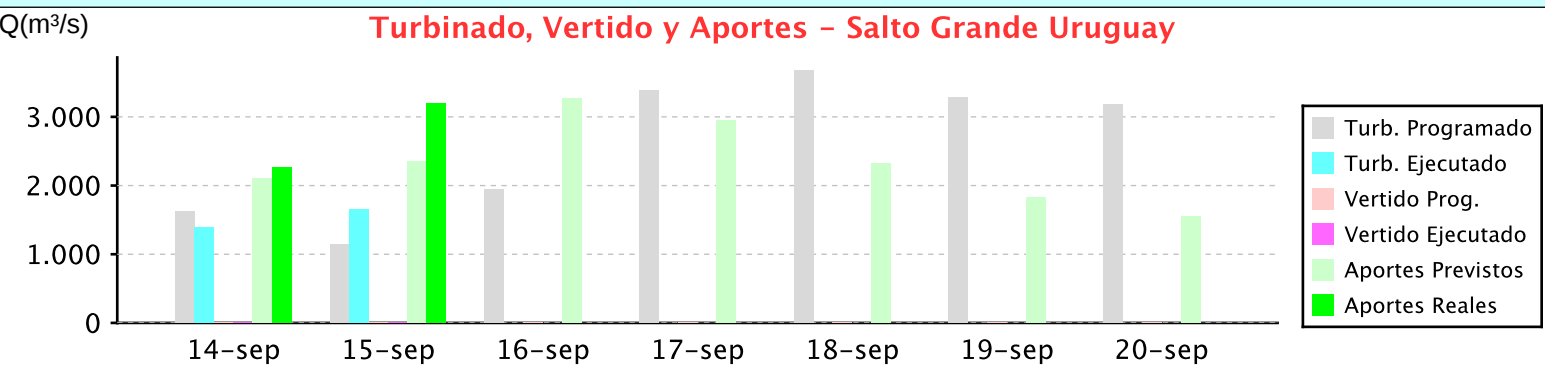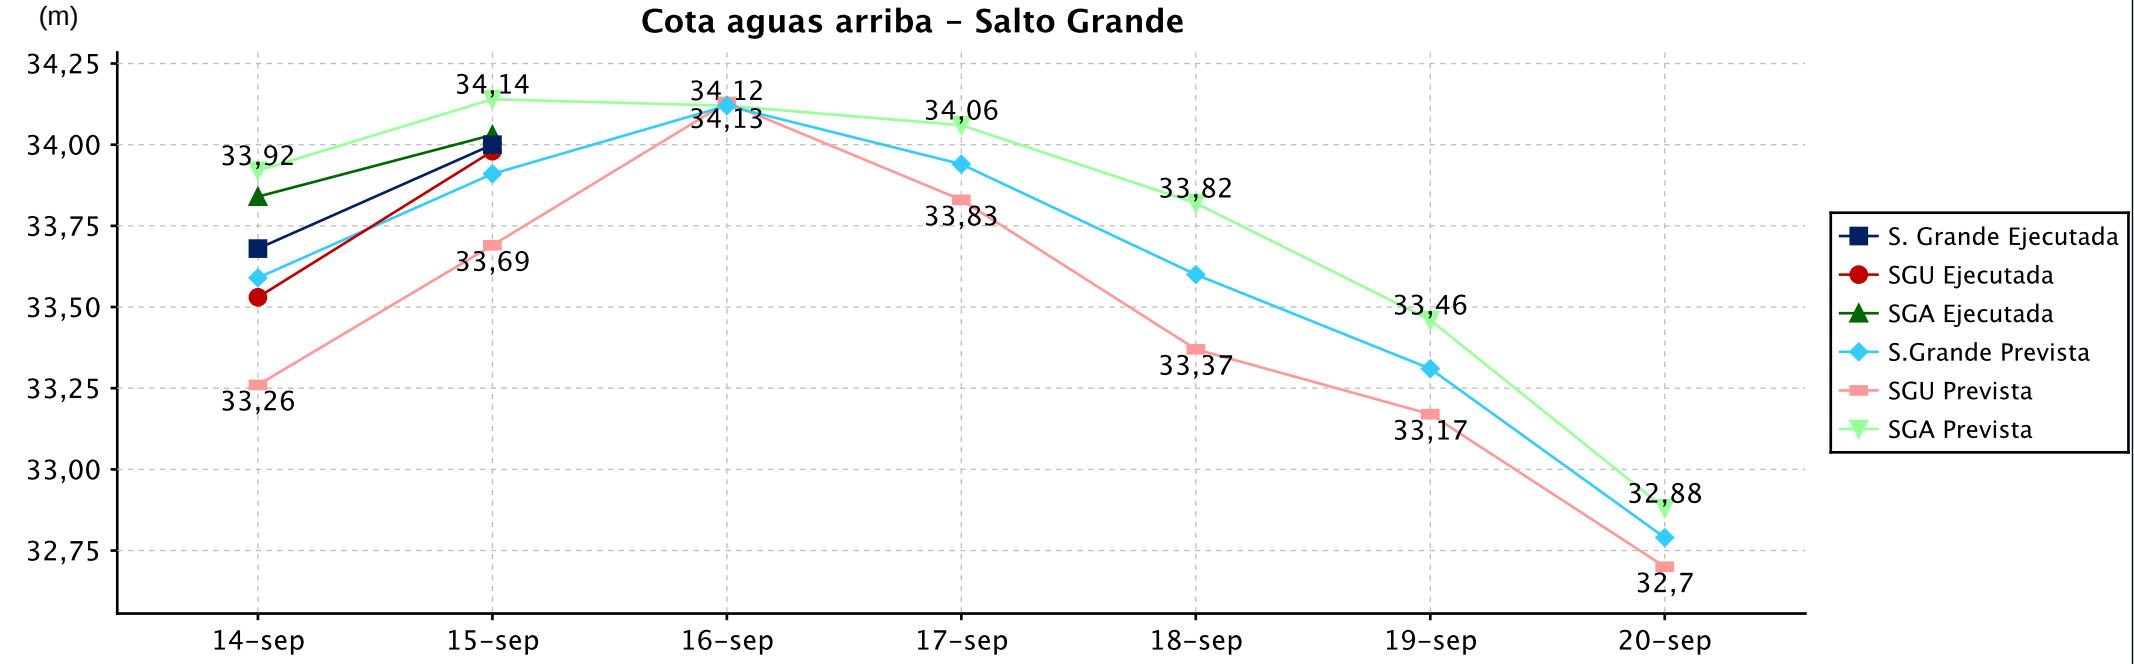

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,98
Cota Vista Arg	34,03
Cota real	34,00
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-1.086

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	10
Baygorria	0	755
Palmar	708	636
SGU	1.149	1.654

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	2.762	3.386
Baygorria	463	1.613
Palmar	839	1.889
SGU	2.350	3.198

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	850
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
