



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



lunes 16 de septiembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	4.848
Sala B	1.158
5ta.	0
6ta.	2.722
Motores	968
Central La Tablada	-83
Central P. del Tigre	5.100
APR A	124
APR B	-2
APR C	-2
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	-0
C. Baygorria	2.327
C. Palmar	5.069
C. Salto Grande	13.546
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.173
TOTAL Generación	32.098

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	32.098
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.930
Diferencia (MWh)	4.168
Ejecutada - Programada	14,92 %

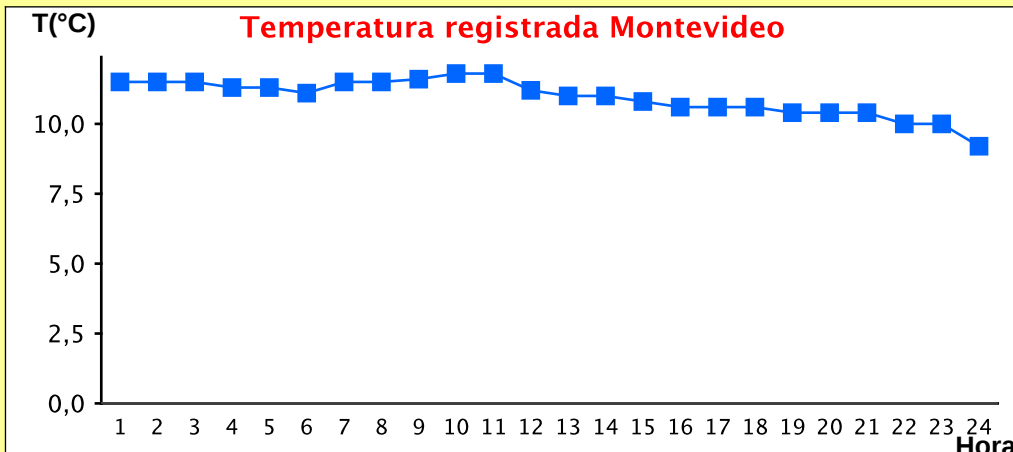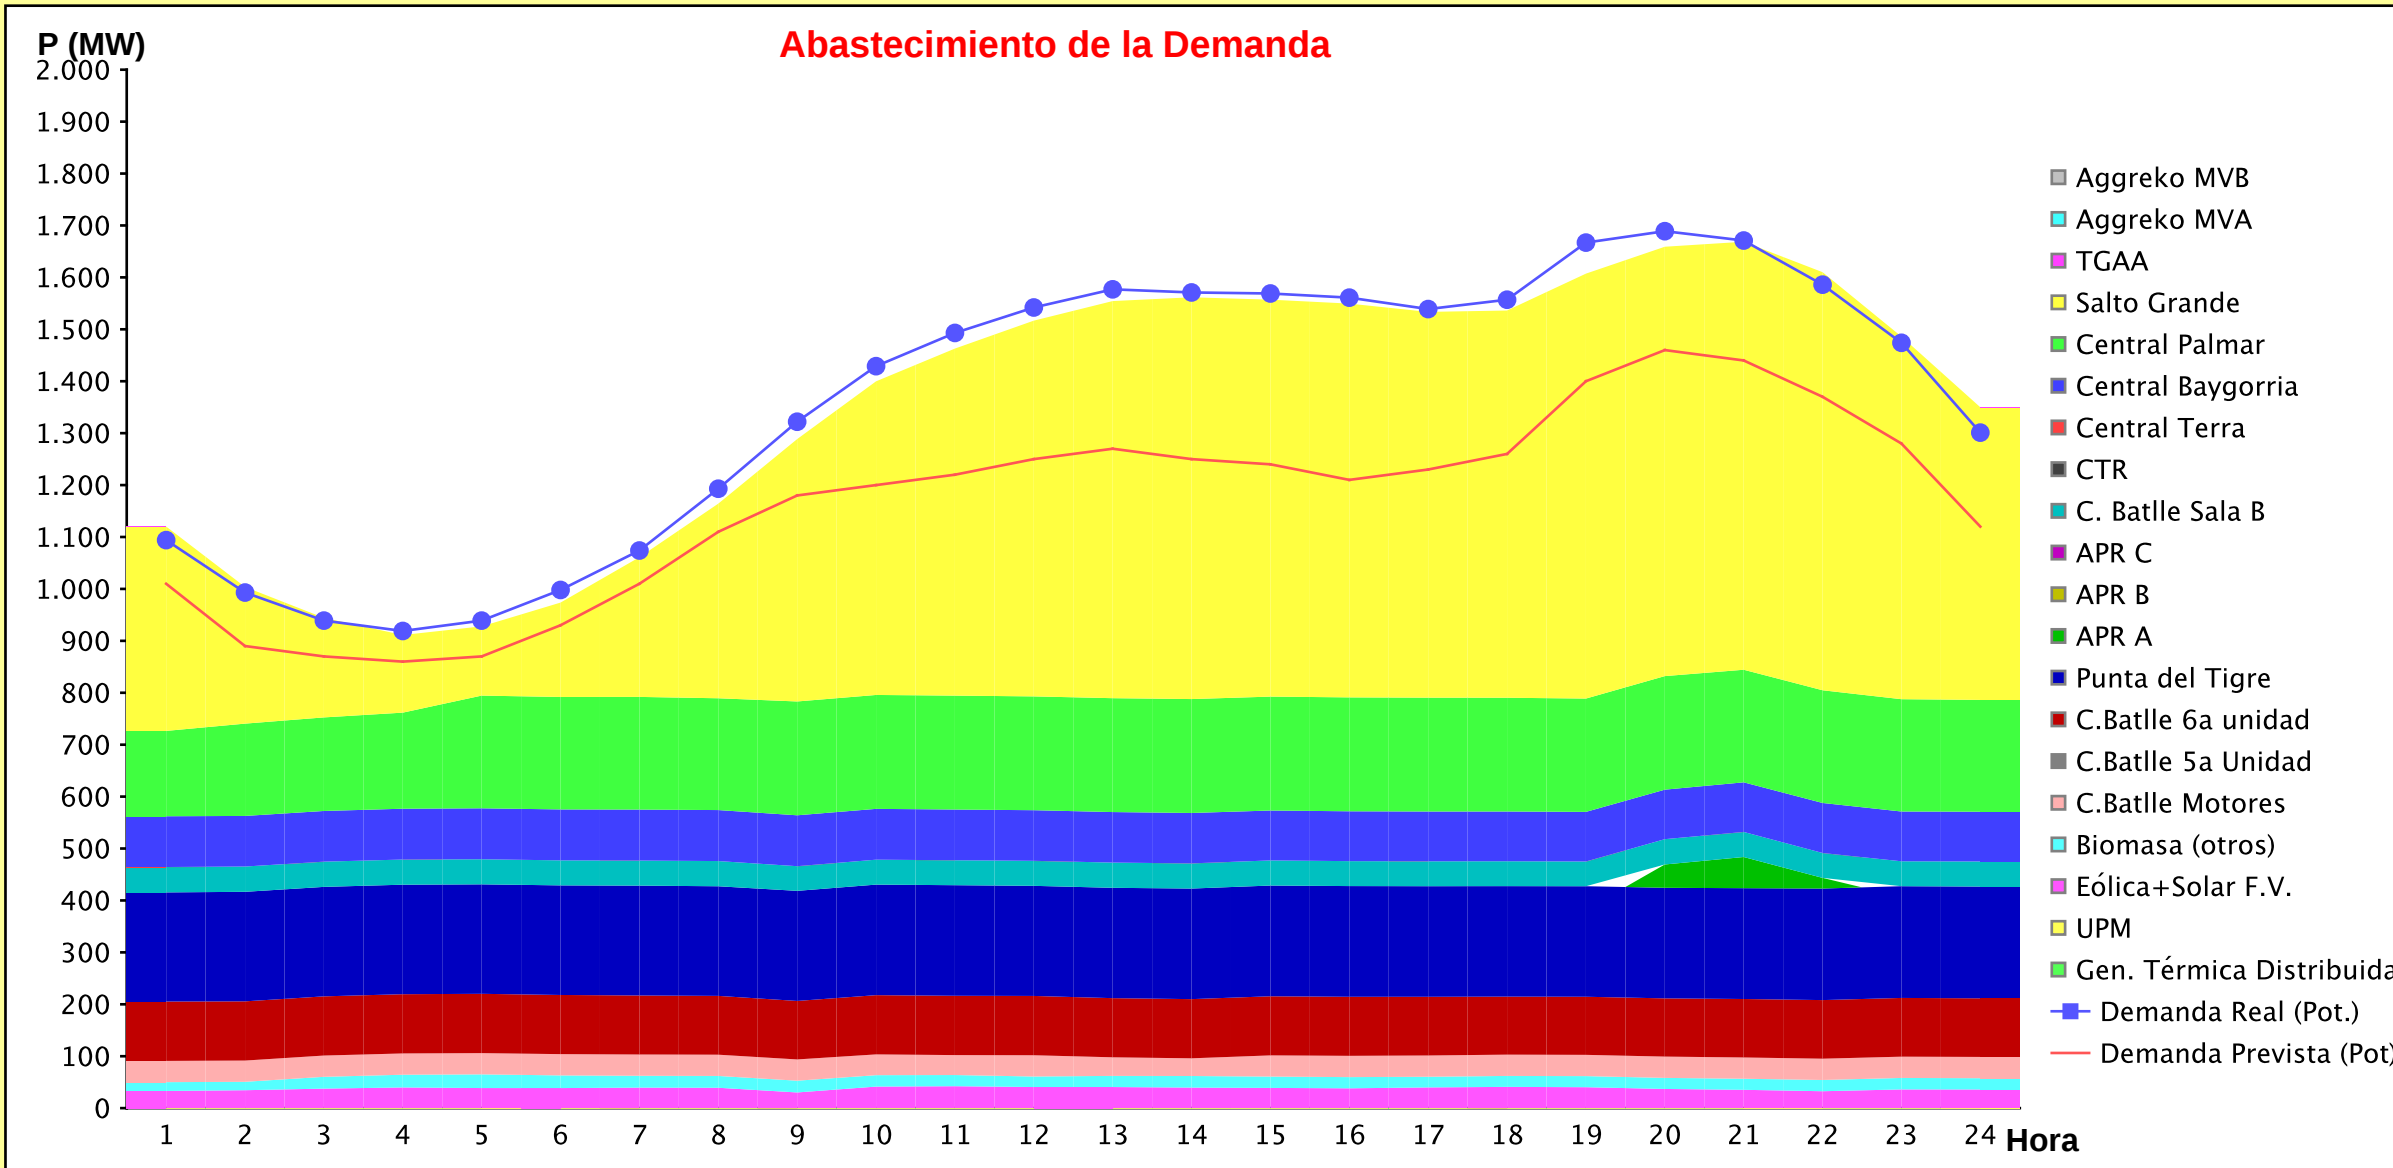



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1593,03 Hora 13:18
Potencia mínima:	914 Hora 03:50
Pico noche:	1704,71 Hora 19:50

Generación Media (MW)	
Eólica	38,5
Biomasa	25,8
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

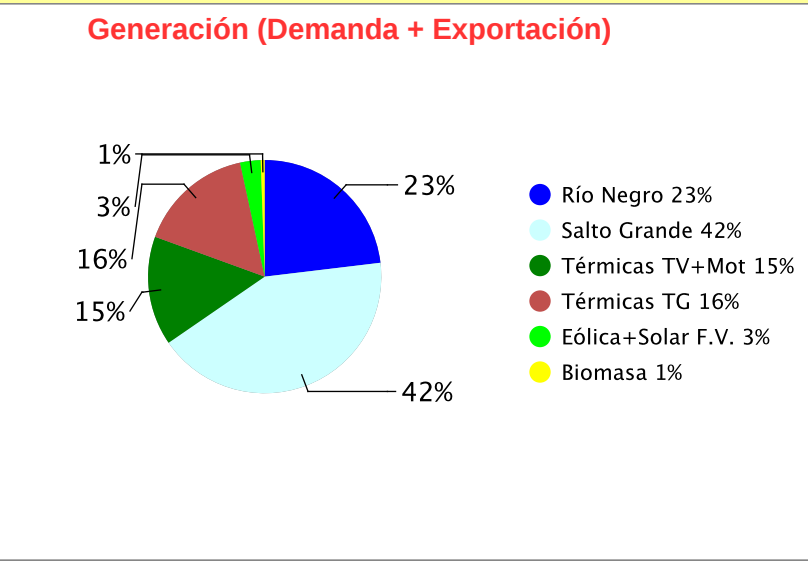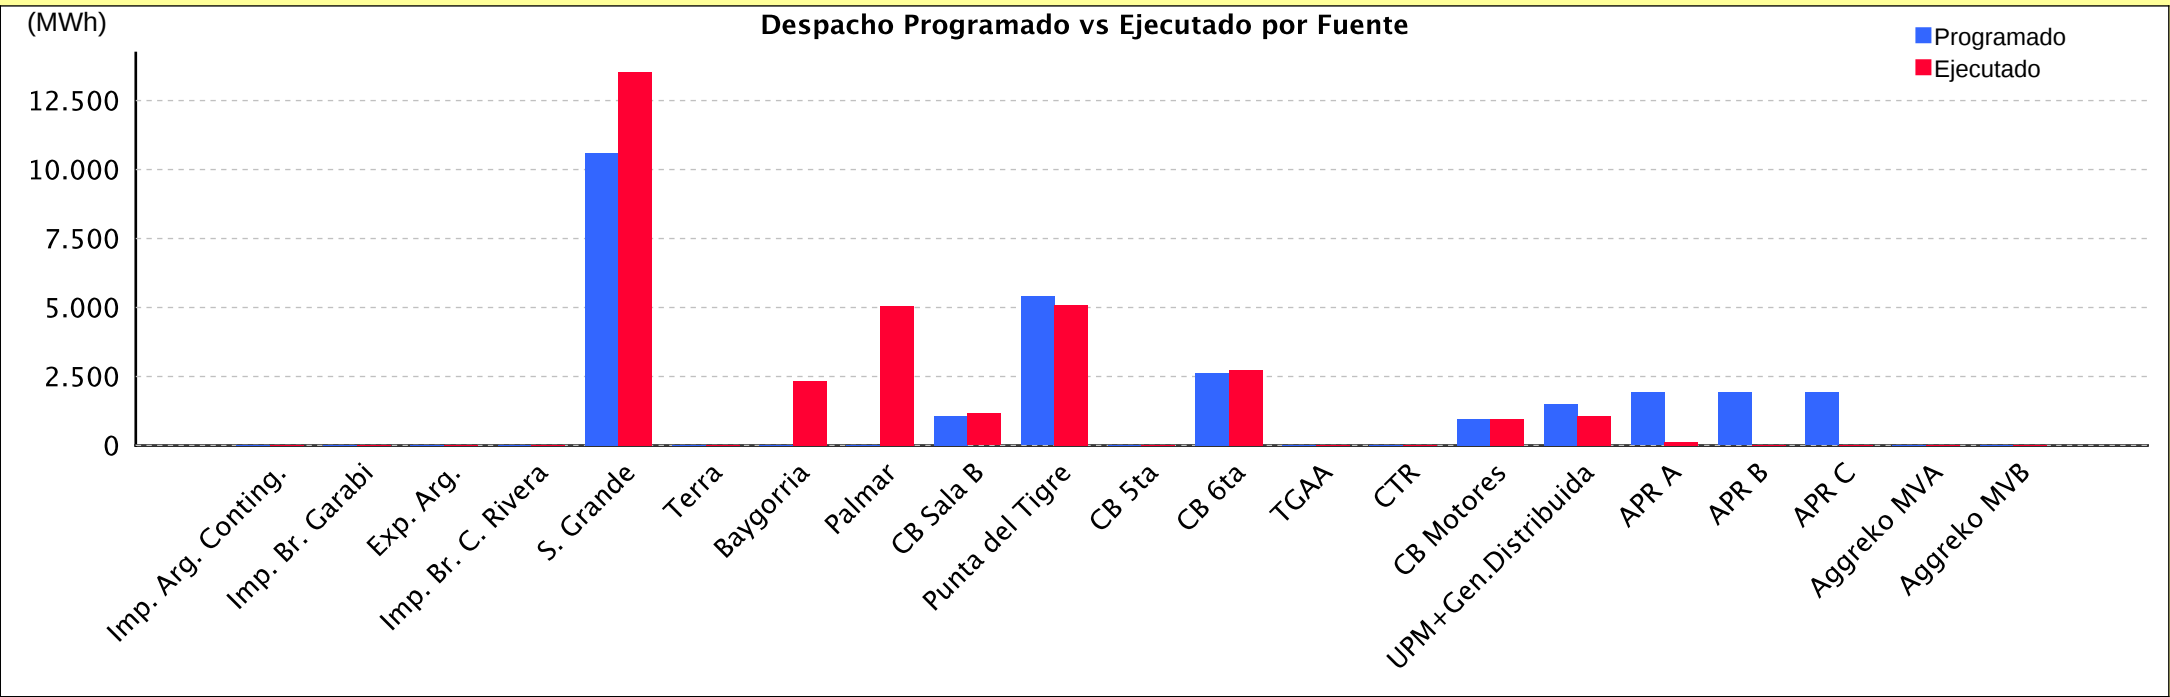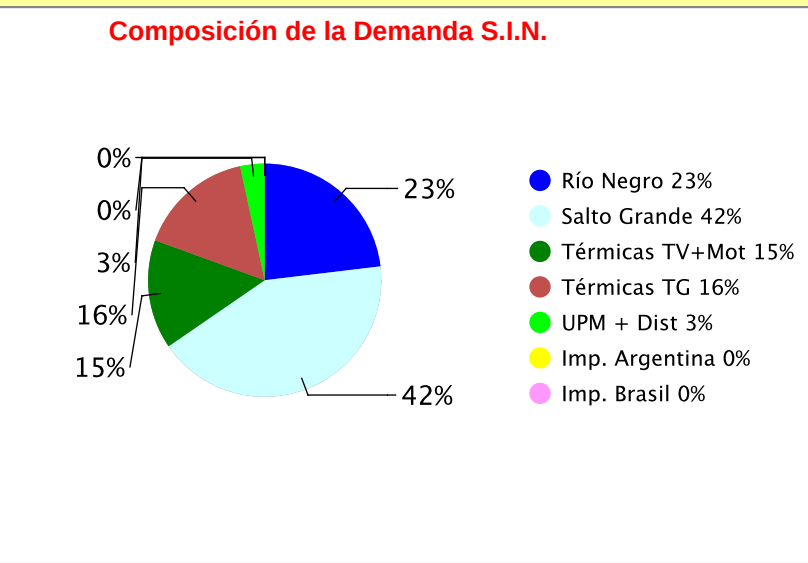



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

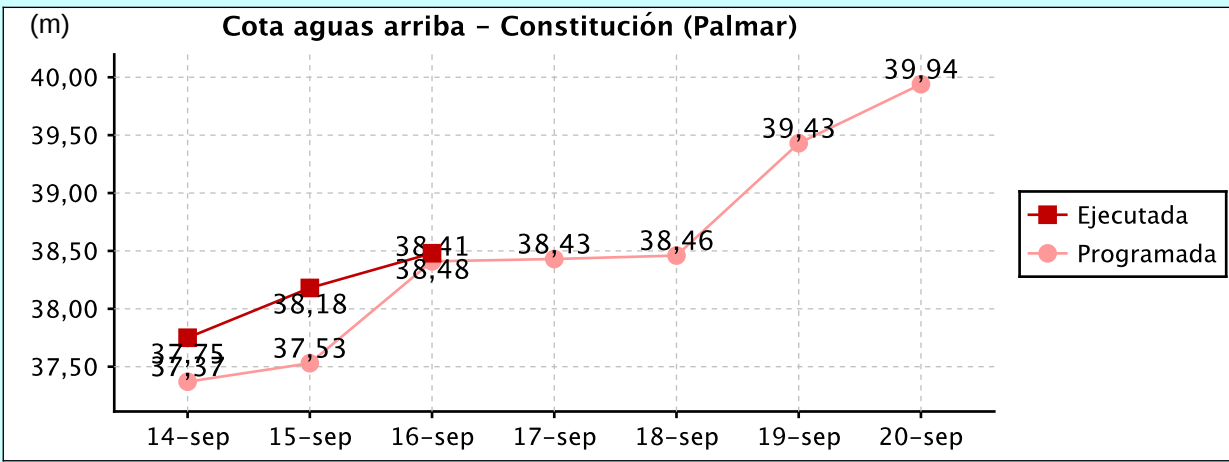
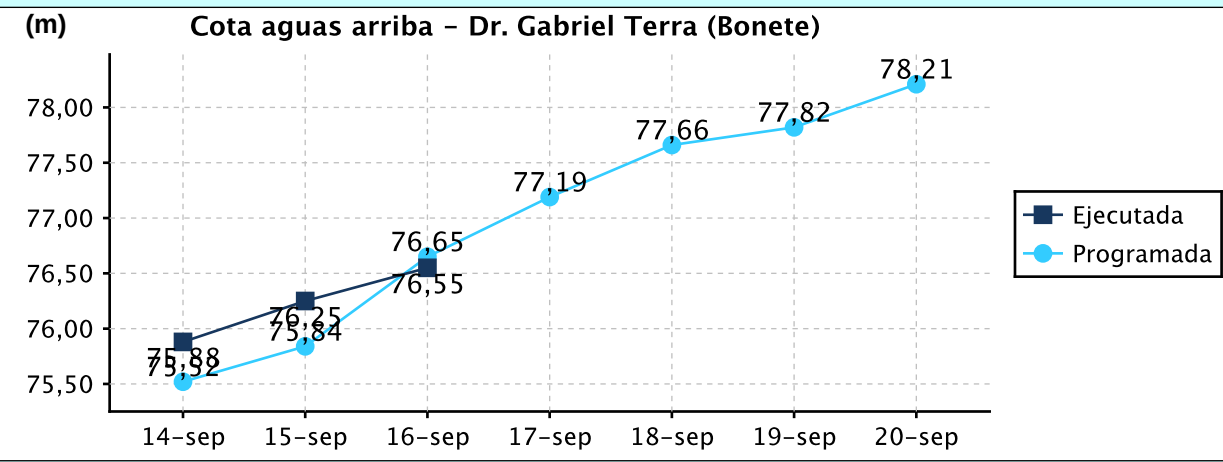


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,65	76,55
Baygorria	53,95	53,87
Palmar	38,41	38,48
SGU	34,13	34,06

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

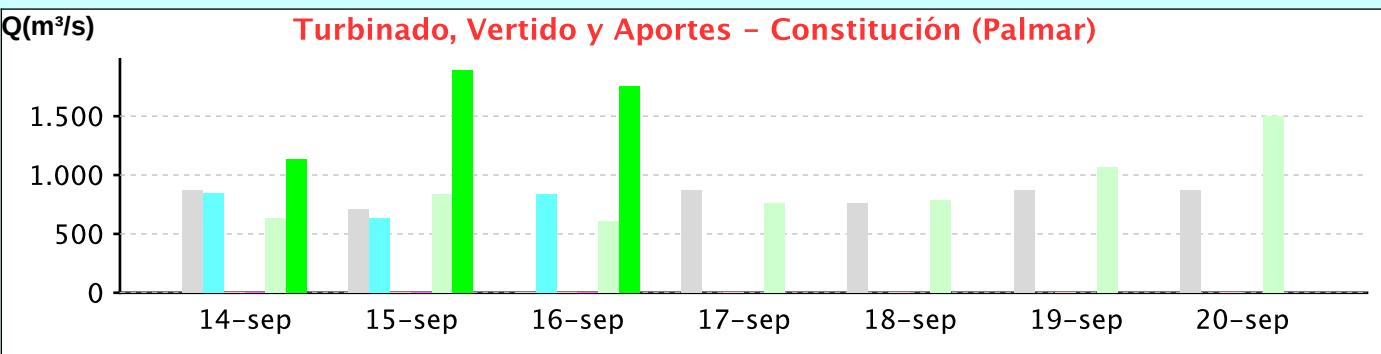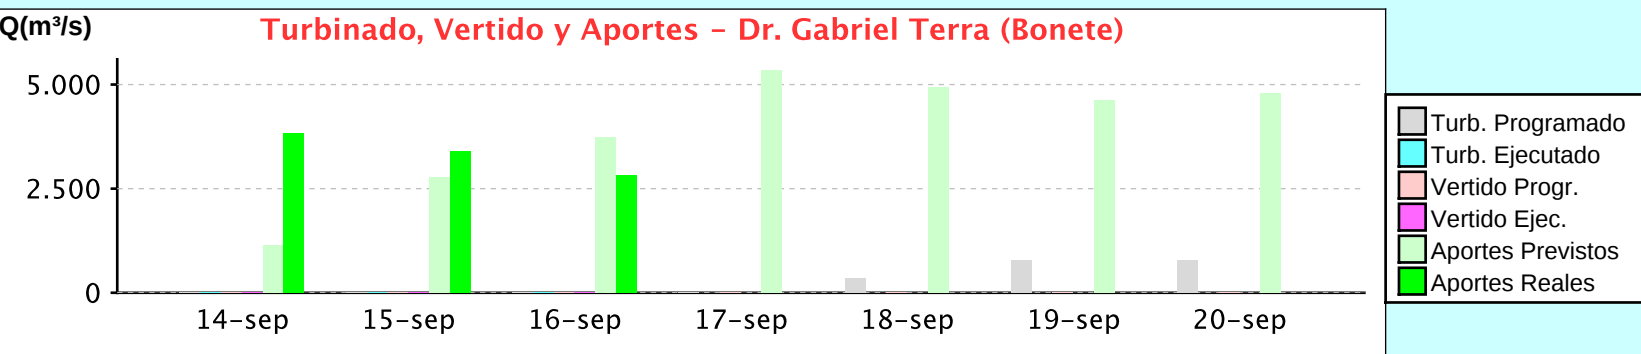

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

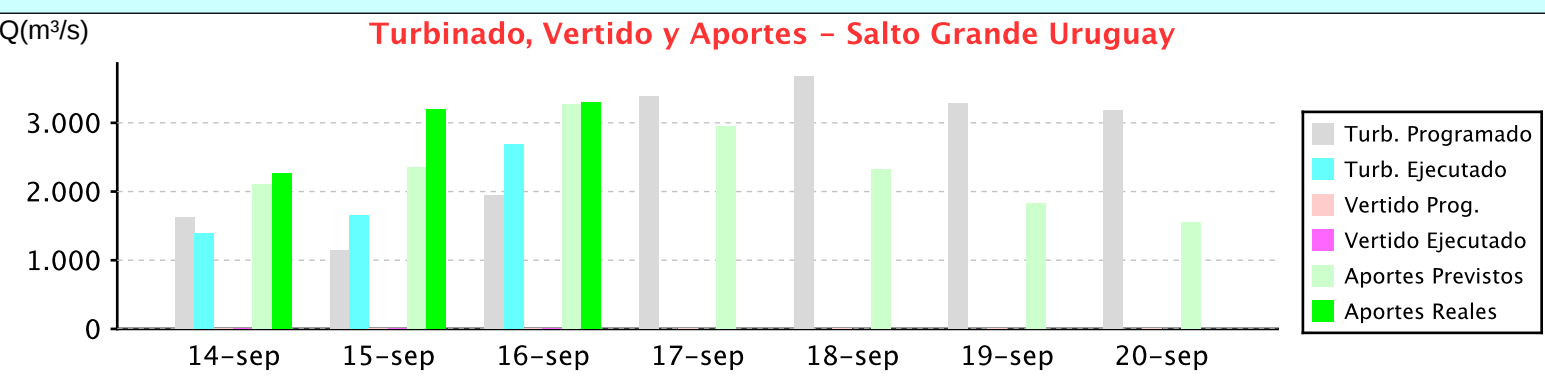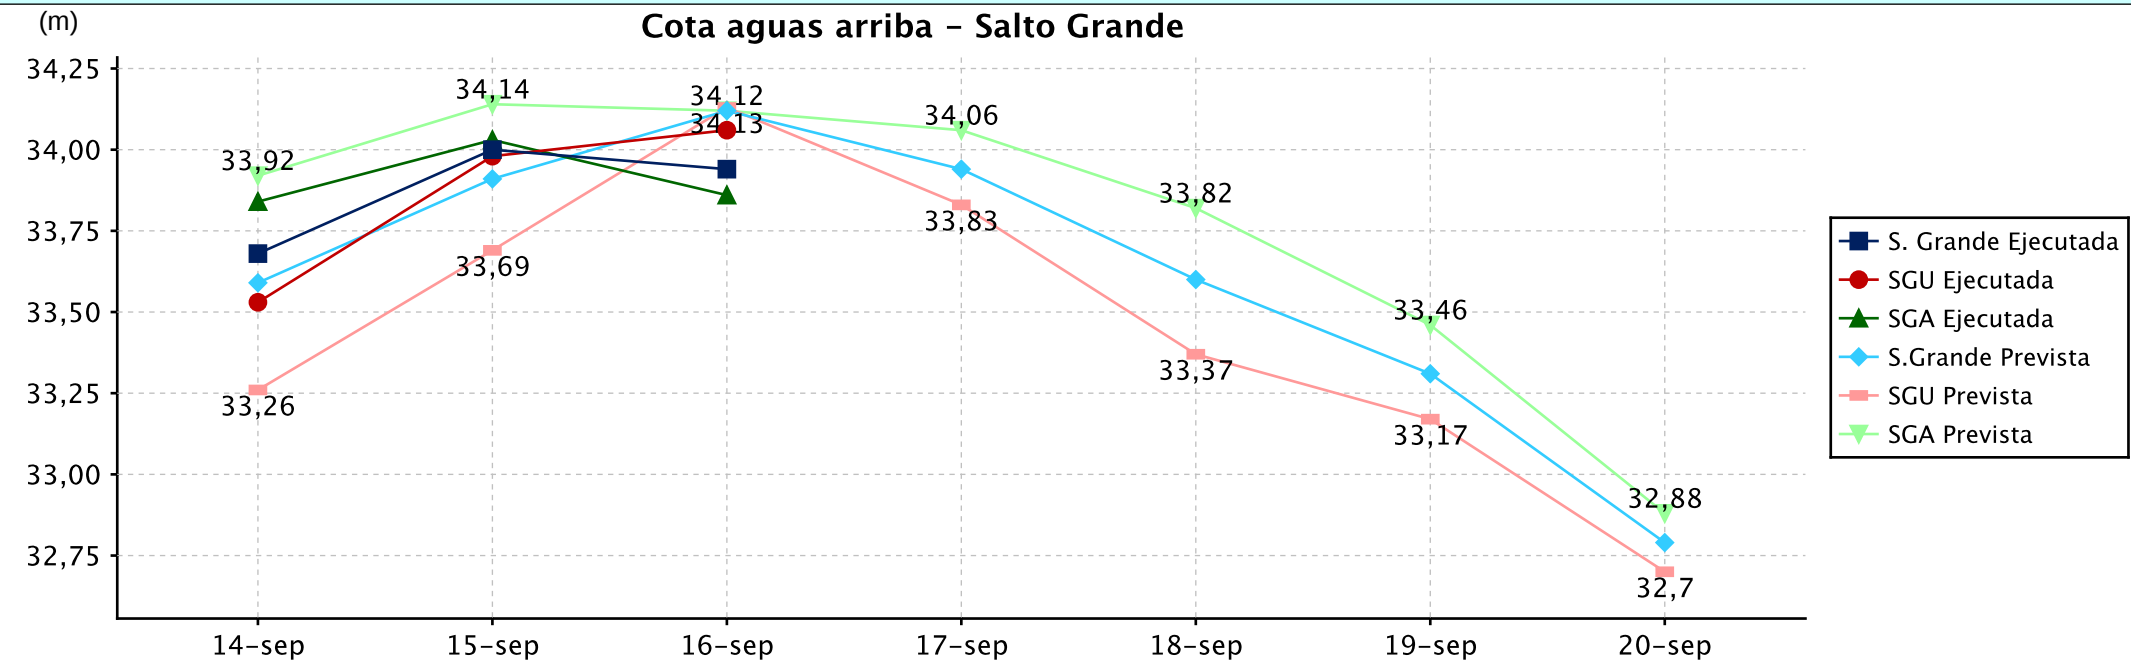

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,06
Cota Vista Arg	33,86
Cota real	33,94

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	4.877
------------------------------------	-------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	755
Palmar	0	835
SGU	1.942	2.690

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	3.729	2.822
Baygorria	819	578
Palmar	605	1.753
SGU	3.275	3.292

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	800	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
