



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



viernes 20 de septiembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	3.172
Sala B	1.111
5ta.	0
6ta.	850
Motores	1.211
Central La Tablada	-82
Central P. del Tigre	328
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-1
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.993
C. Baygorria	1.366
C. Palmar	5.228
C. Salto Grande	15.589
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	624
TOTAL Generación	29.210

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.210
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.080
Diferencia (MWh)	-870
Ejecutada - Programada	-2,89 %

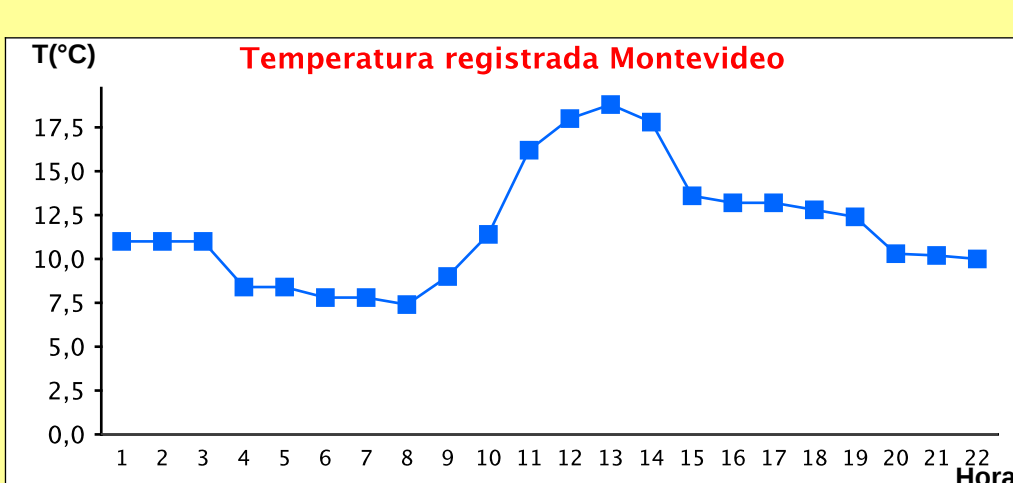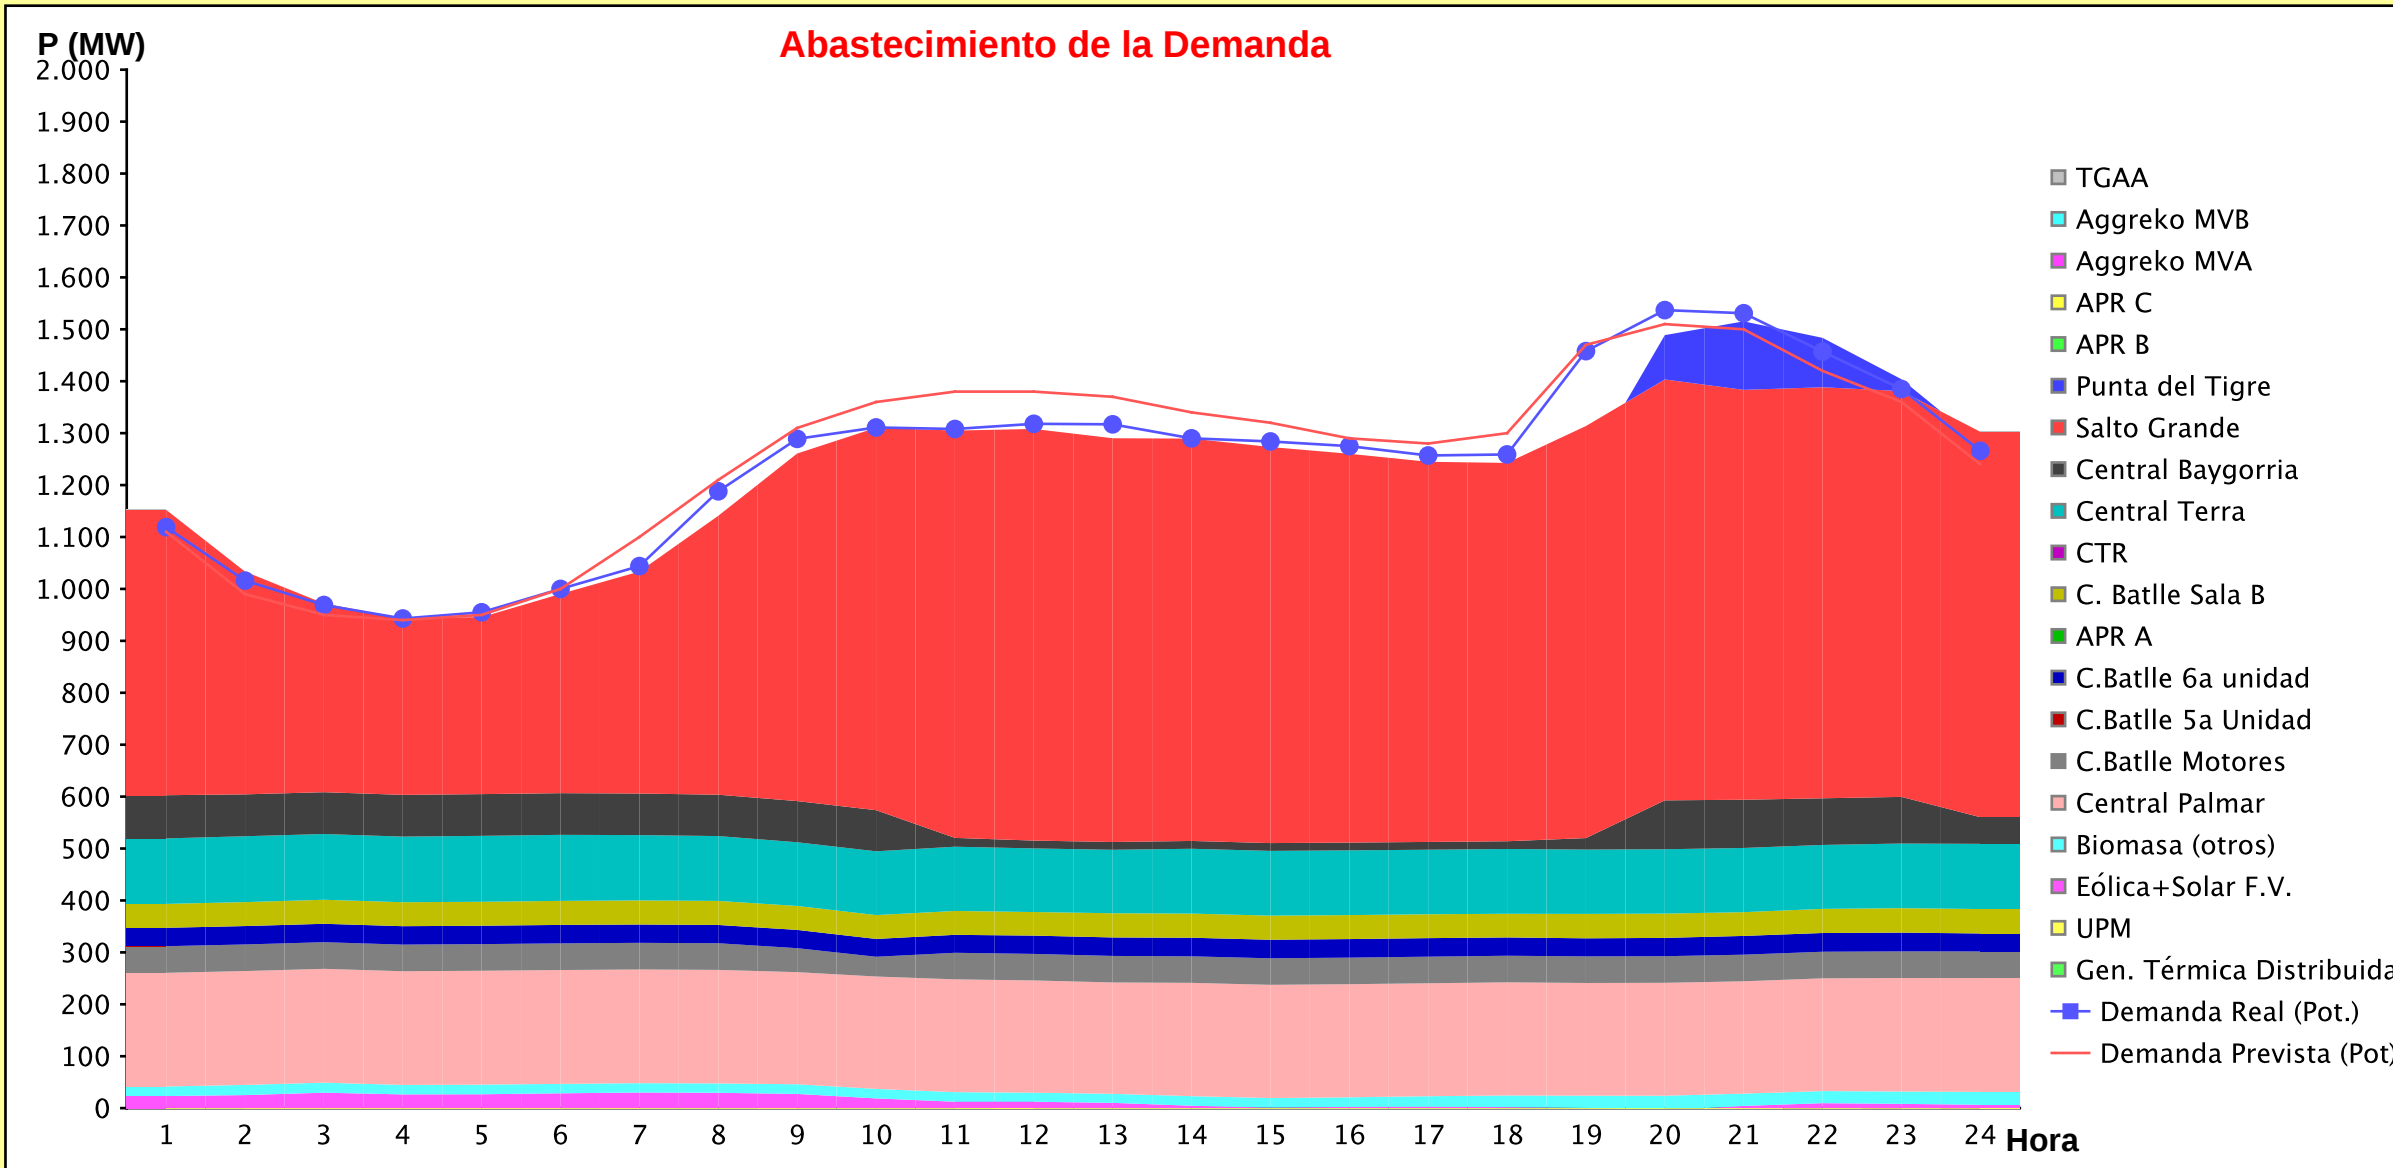



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1330,48 Hora 10:00
Potencia mínima:	934,2 Hora 04:27
Pico noche:	1547,49 Hora 20:06

Generación Media (MW)	
Eólica	14,8
Biomasa	22,9
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

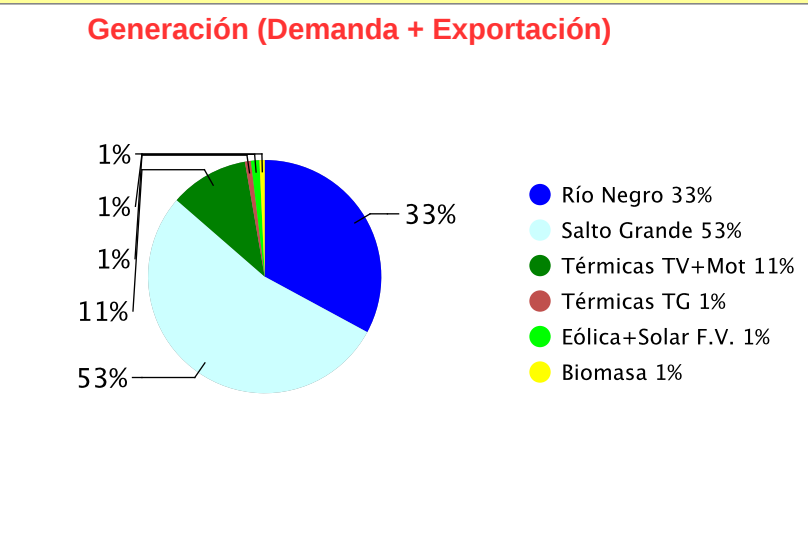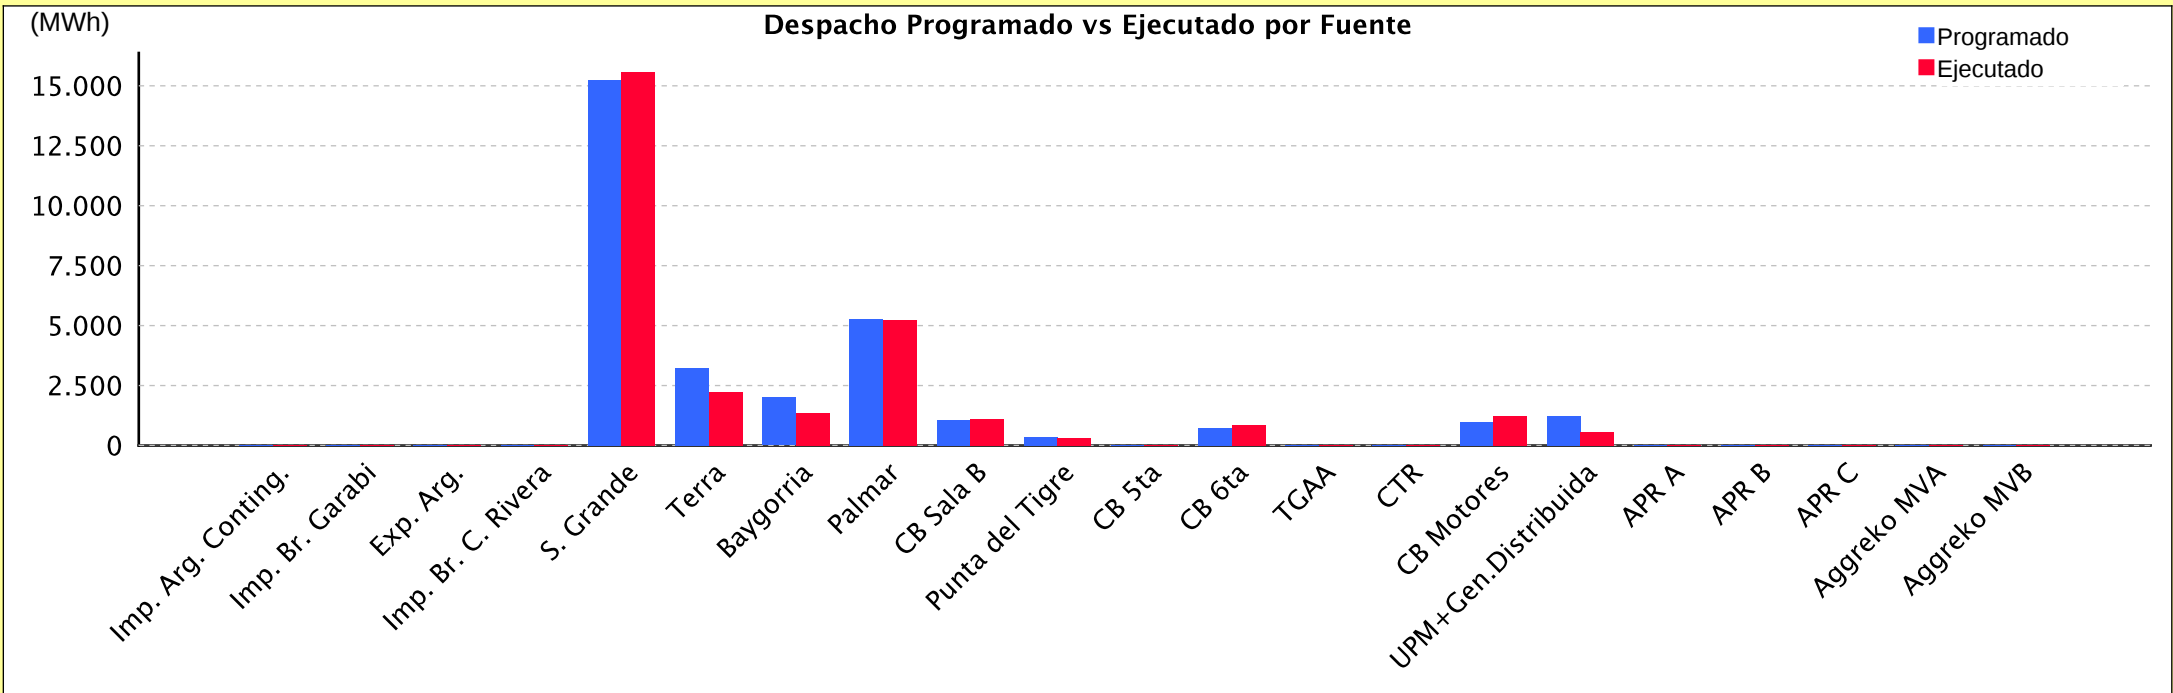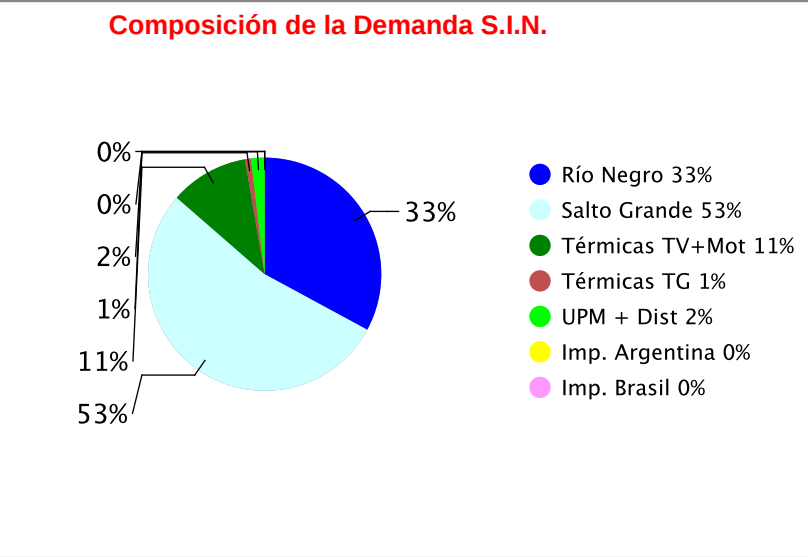



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

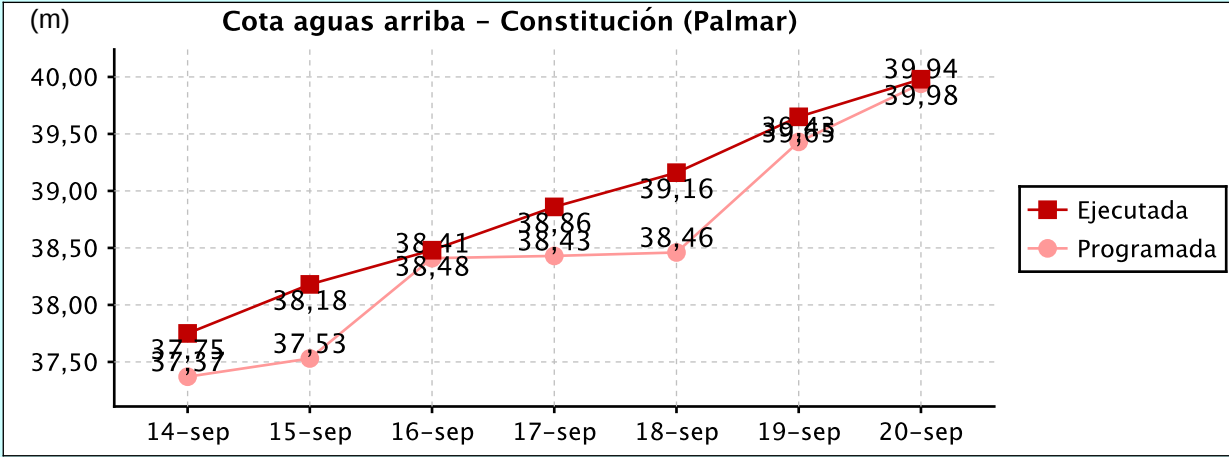
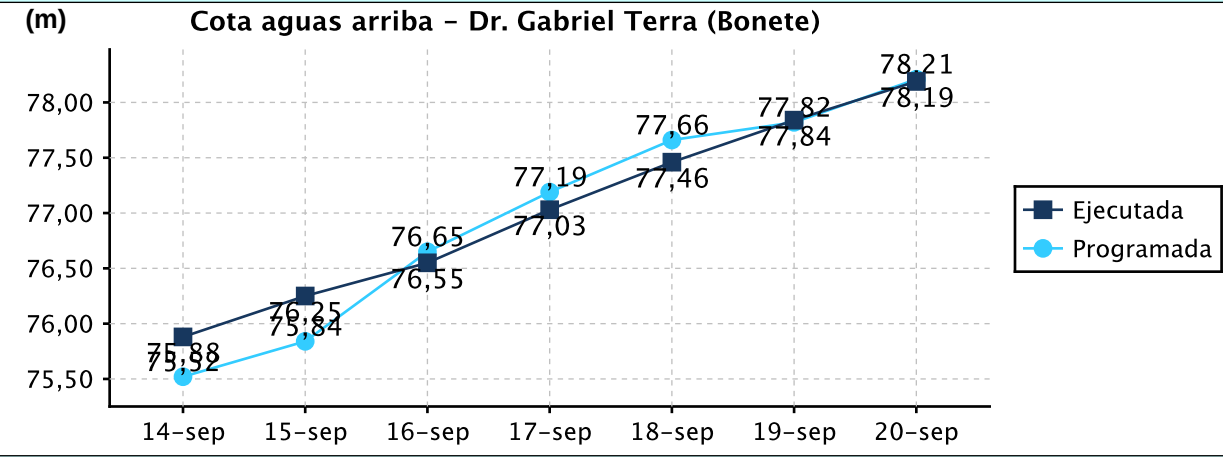


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,21	78,19
Baygorria	53,86	53,79
Palmar	39,94	39,98
SGU	32,70	32,65

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

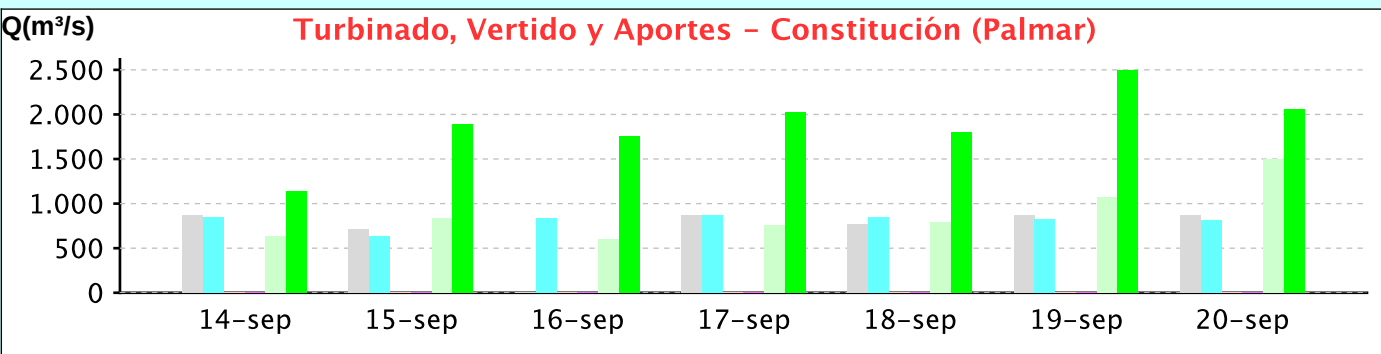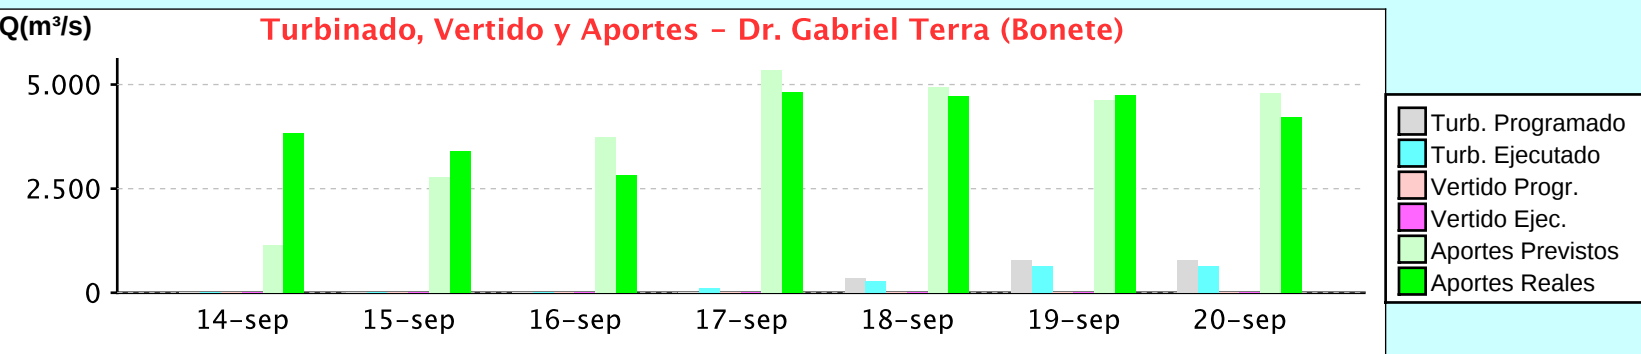

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

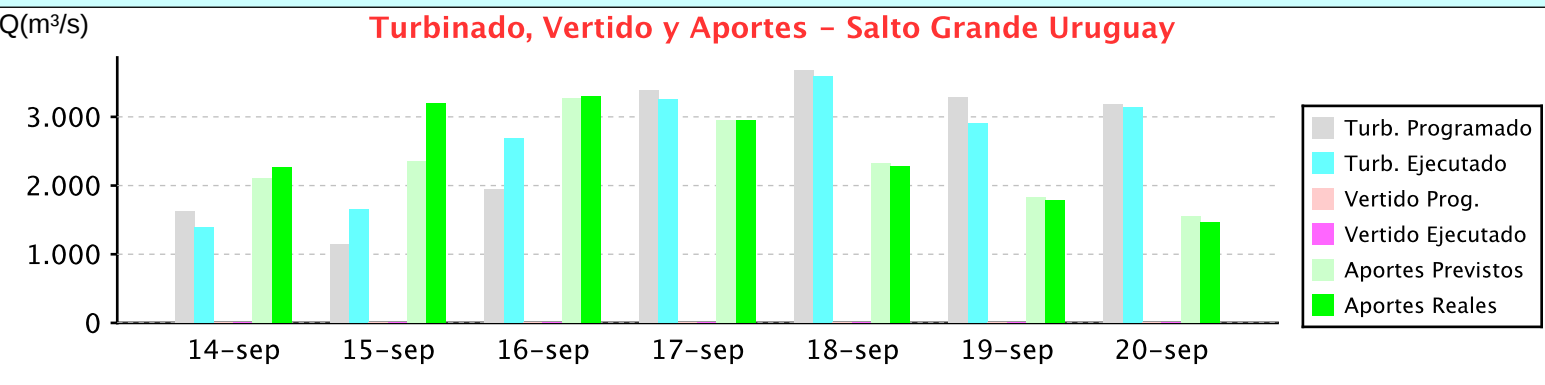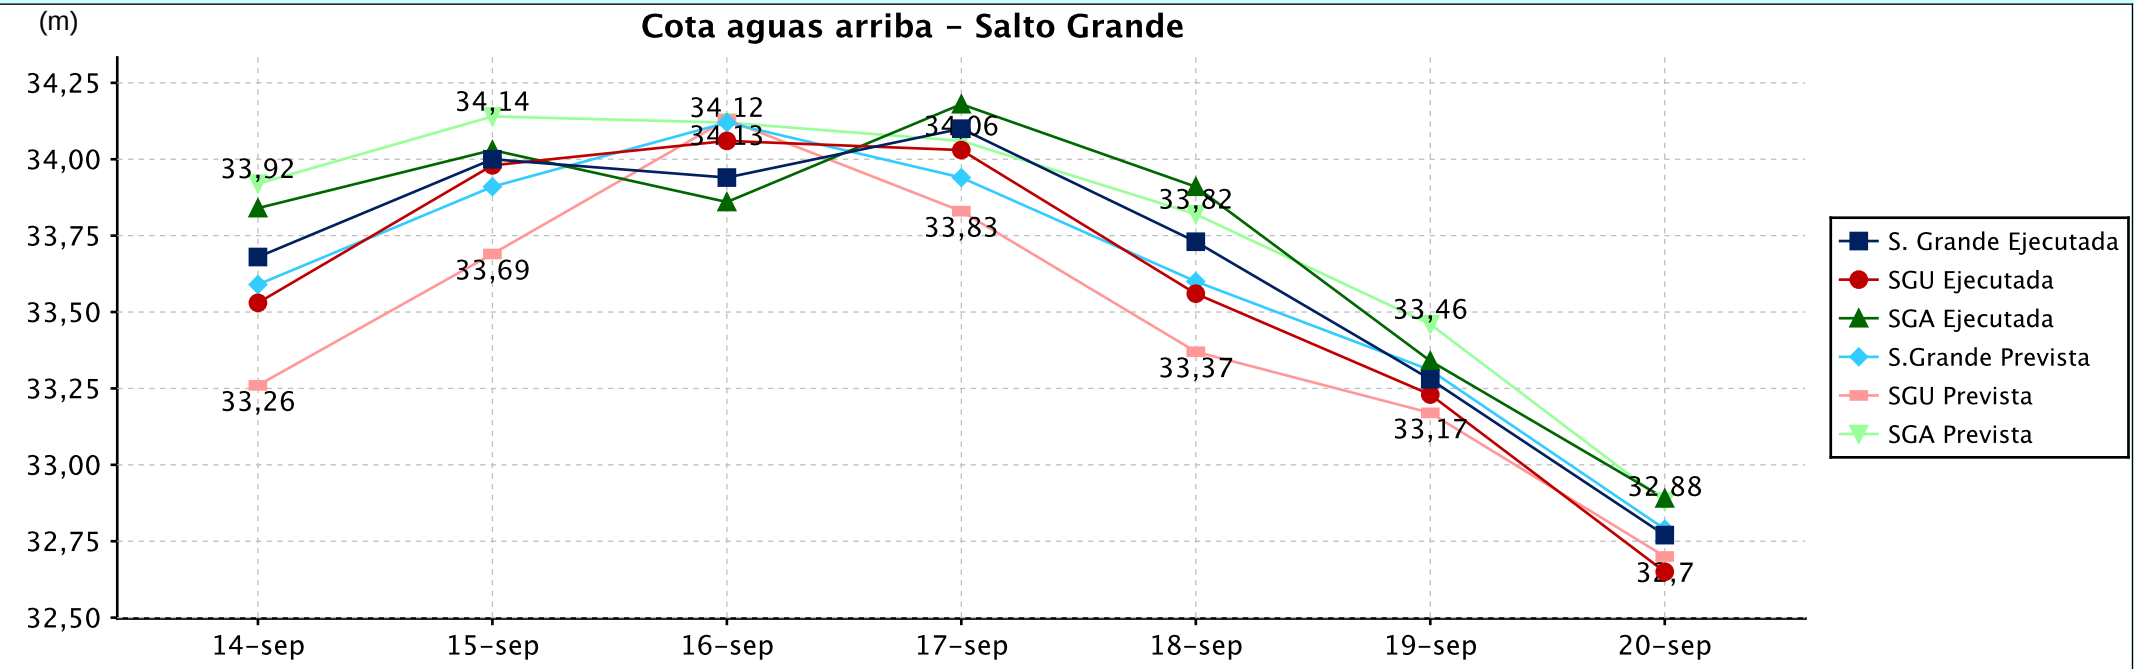

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	32,65
Cota Vista Arg	32,89
Cota real	32,77
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-4.247

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	773	635
Baygorria	661	492
Palmar	873	808
SGU	3.186	3.133

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	4.784	4.226
Baygorria	0	673
Palmar	1.500	2.055
SGU	1.550	1.463

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
