



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



sábado 21 de septiembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	3.191
Sala B	1.106
5ta.	0
6ta.	860
Motores	1.225
Central La Tablada	-95
Central P. del Tigre	44
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-1
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.002
C. Baygorria	1.171
C. Palmar	4.304
C. Salto Grande	14.977
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	556
TOTAL Generación	27.143

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.143
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.030
Diferencia (MWh)	-887
Ejecutada - Programada	-3,17 %

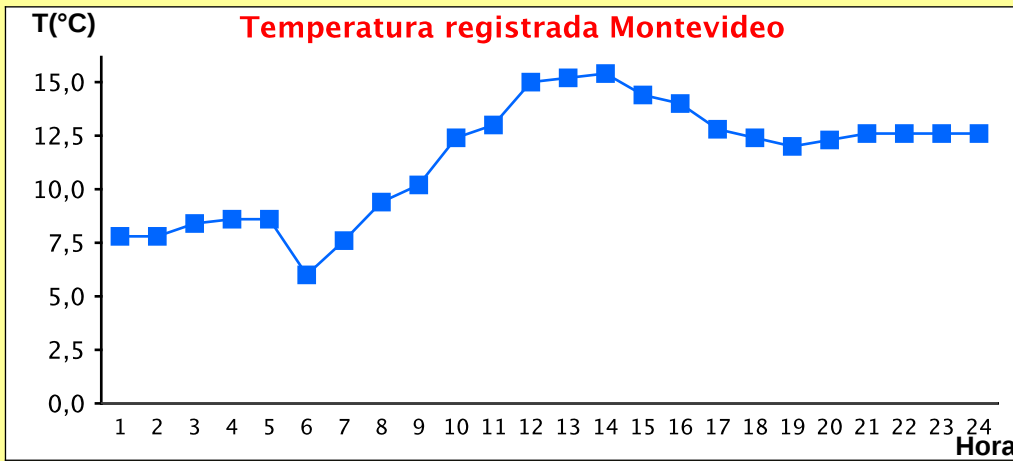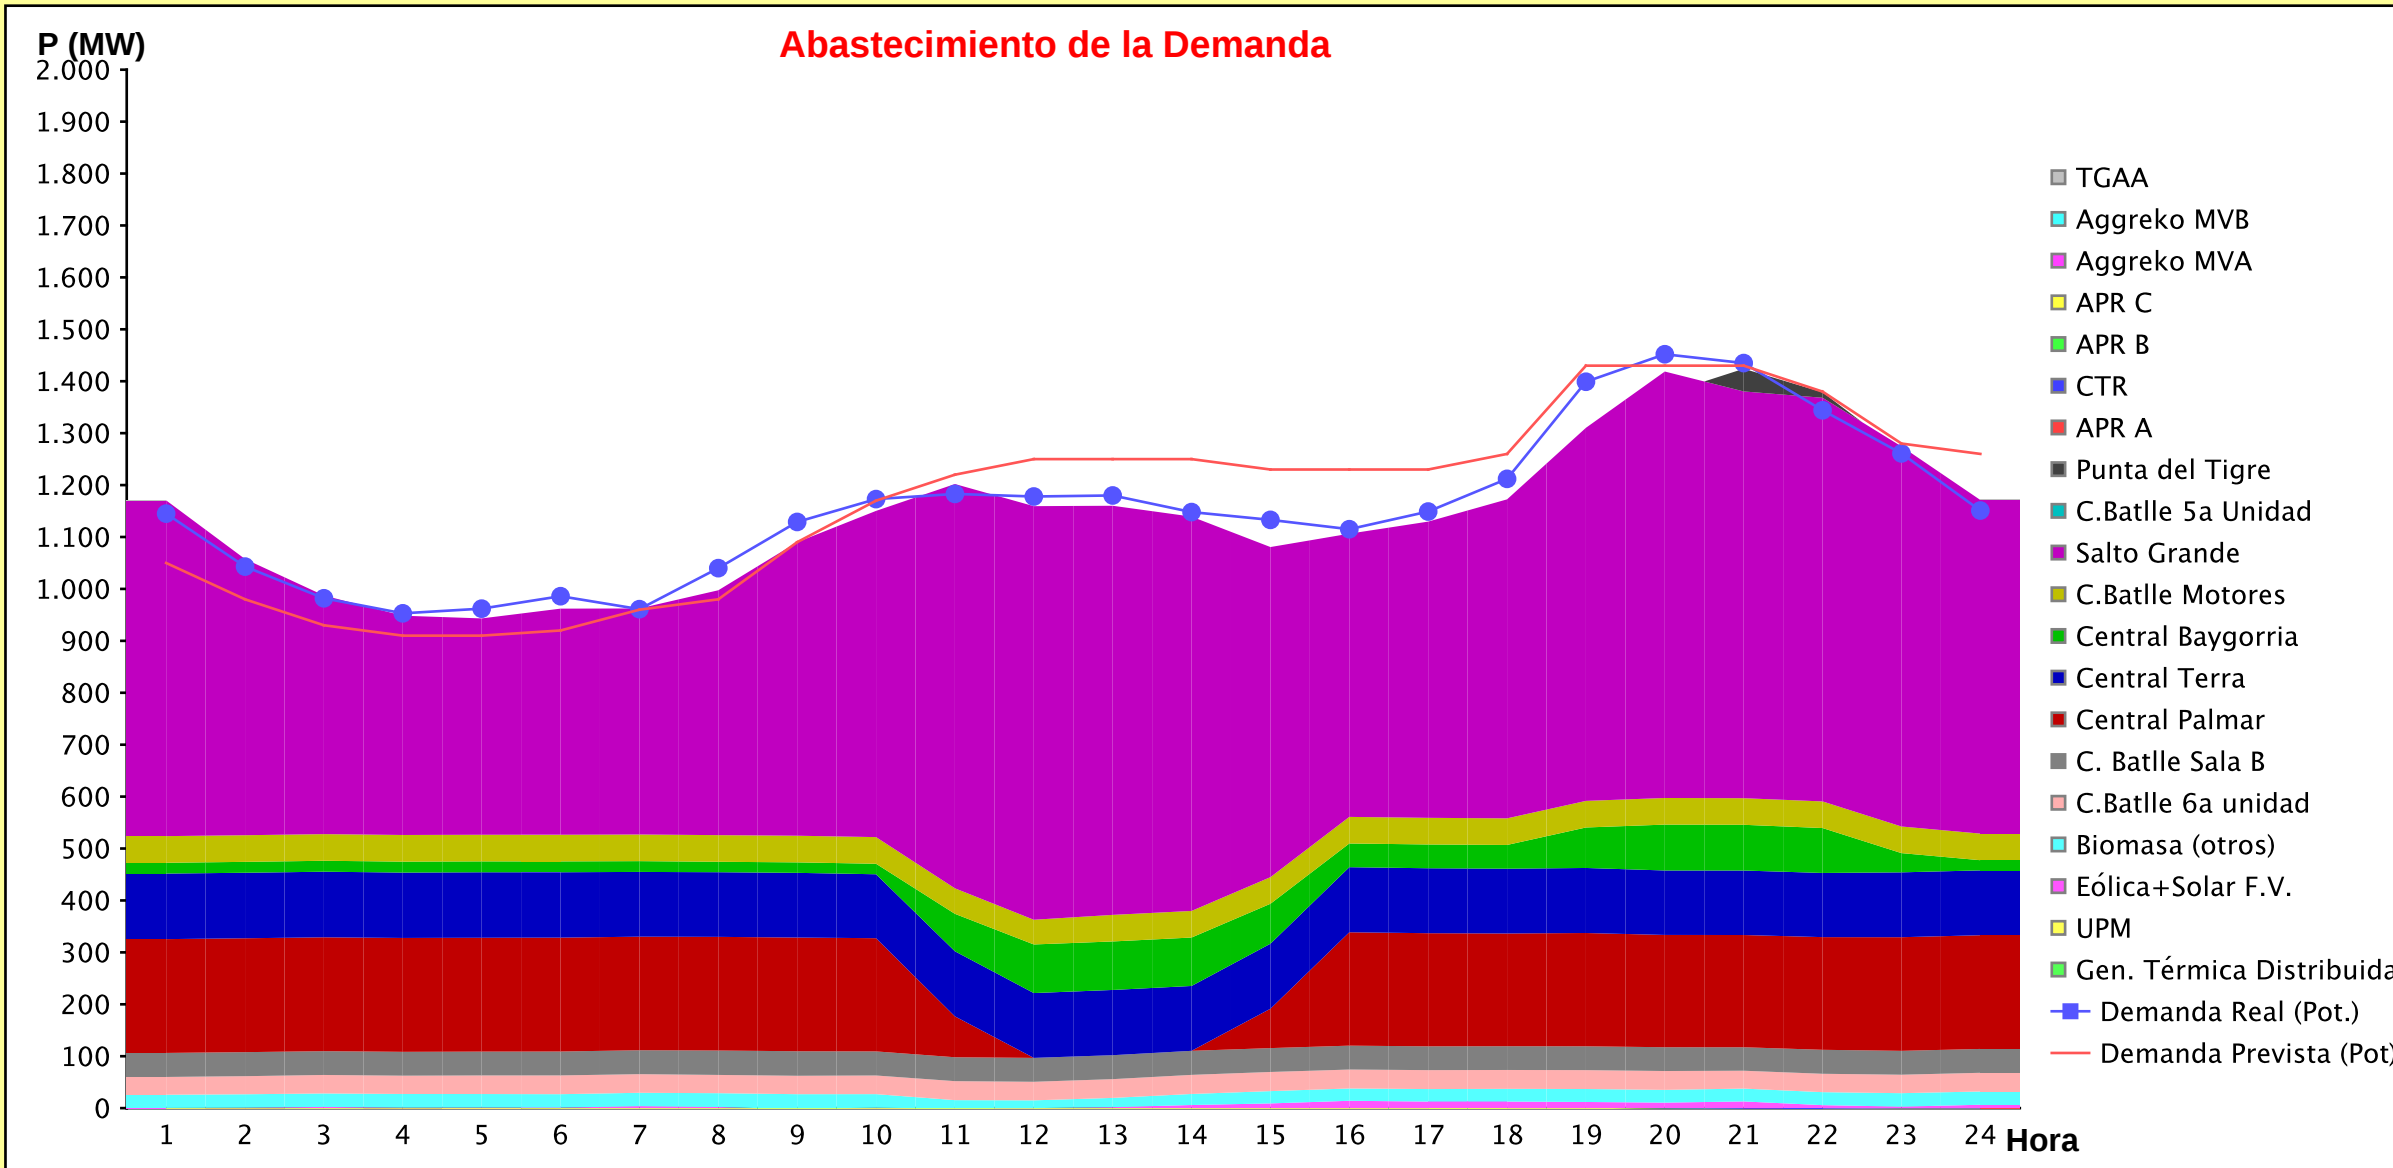



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1198,86 Hora 10:20
Potencia mínima:	944,43 Hora 04:18
Pico noche:	1458,68 Hora 19:56

Generación Media (MW)	
Eólica	5,5
Biomasa	27,1
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

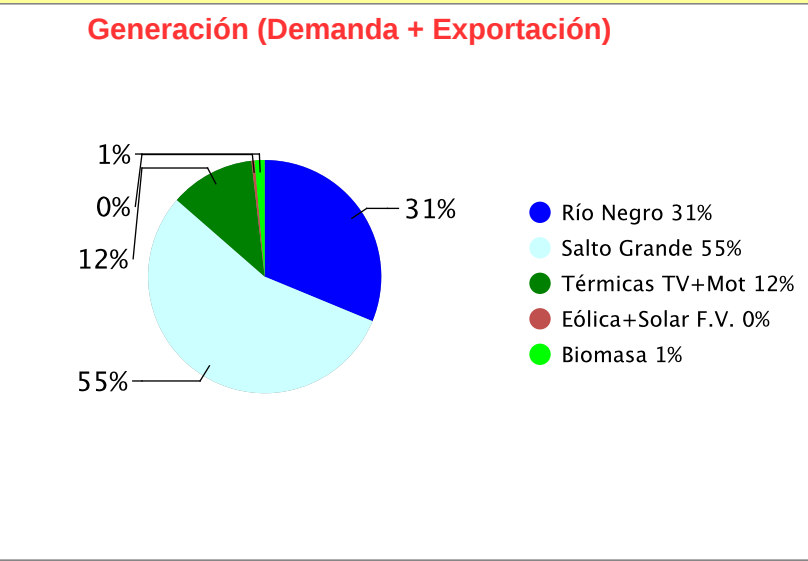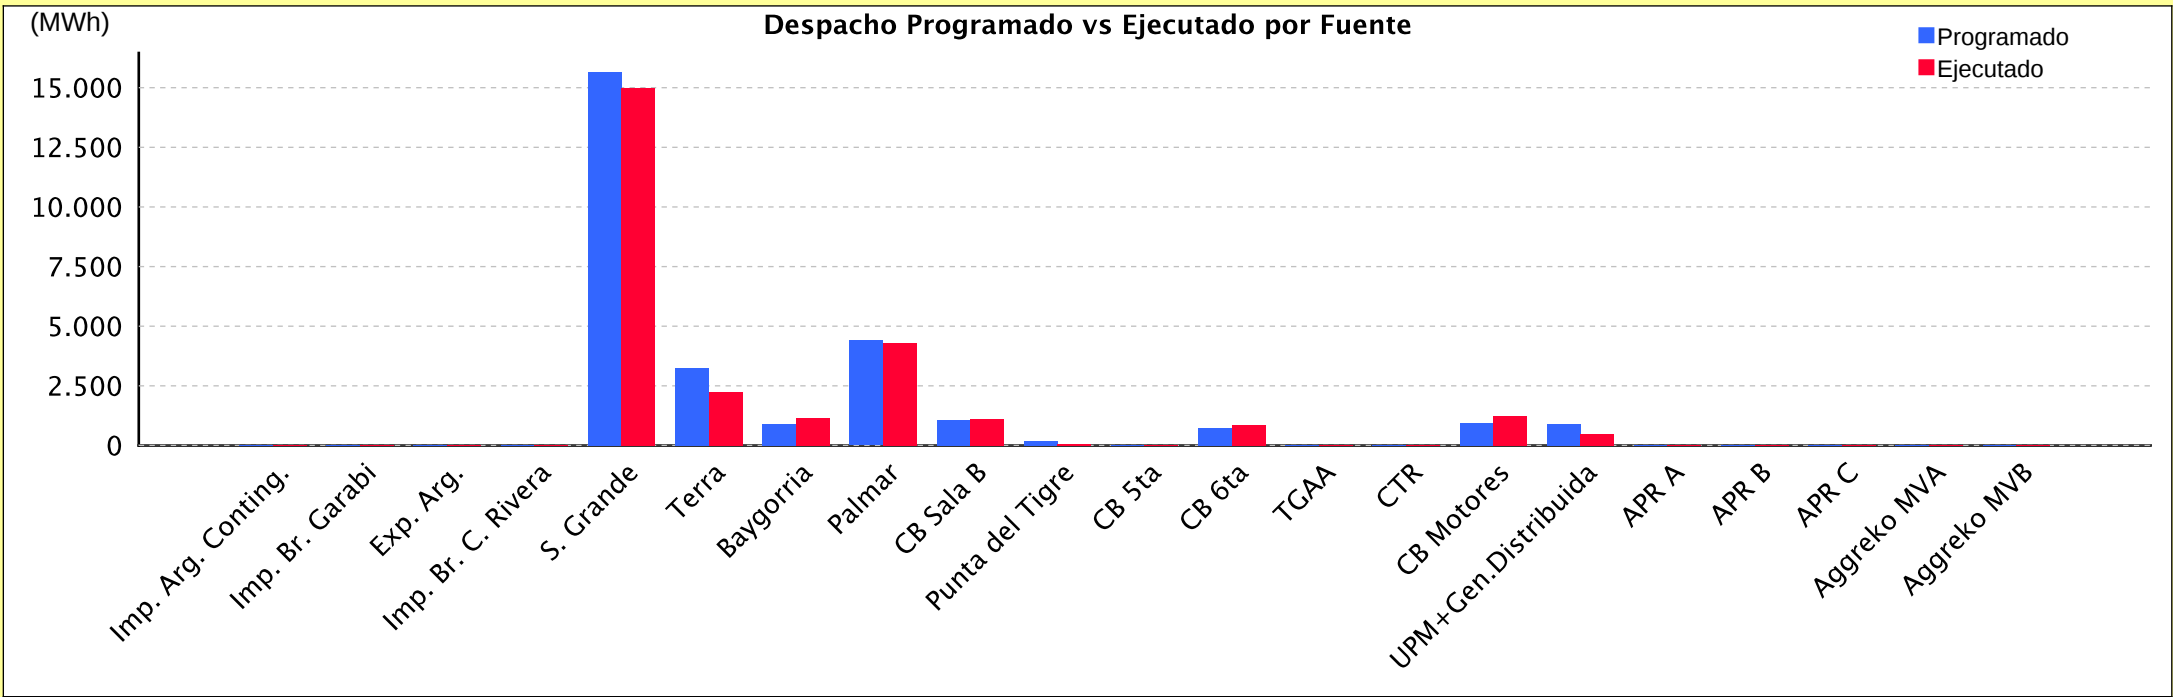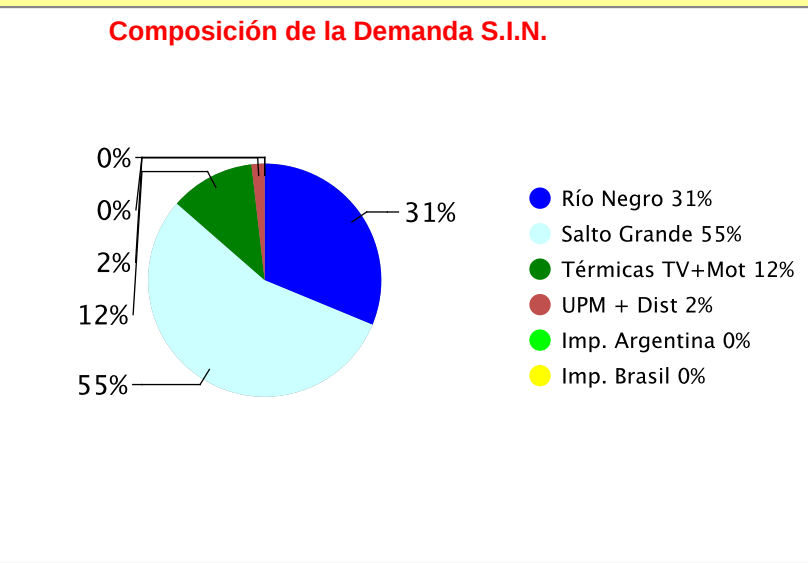



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

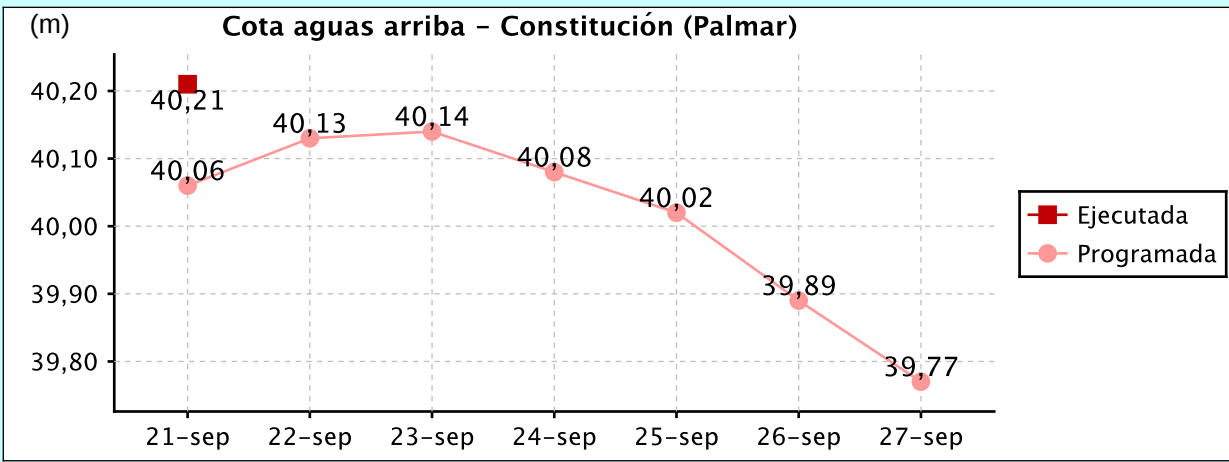
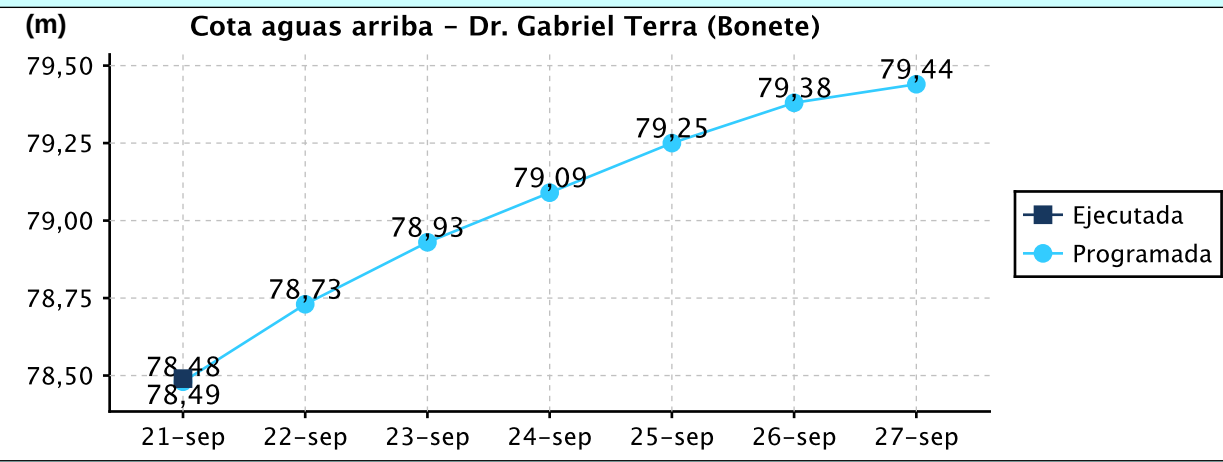


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,48	78,49
Baygorria	54,29	53,99
Palmar	40,06	40,21
SGU	32,35	32,13

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

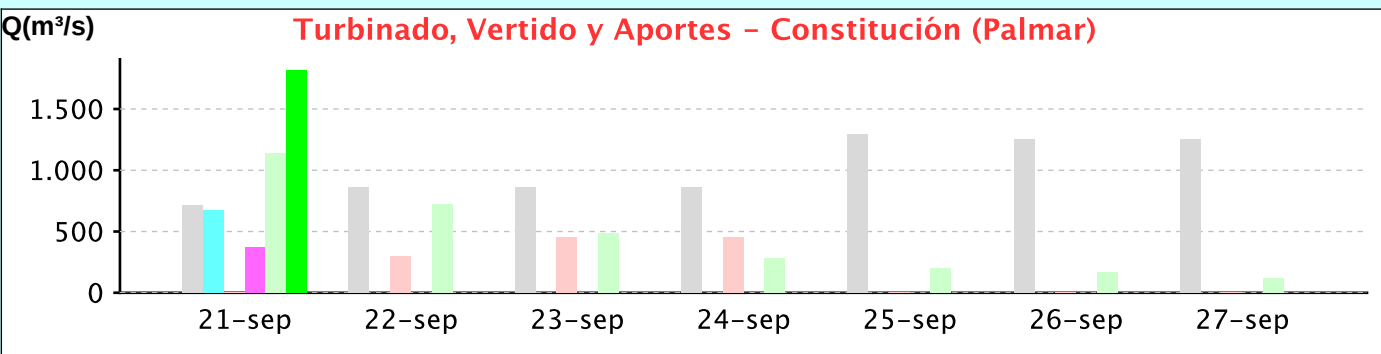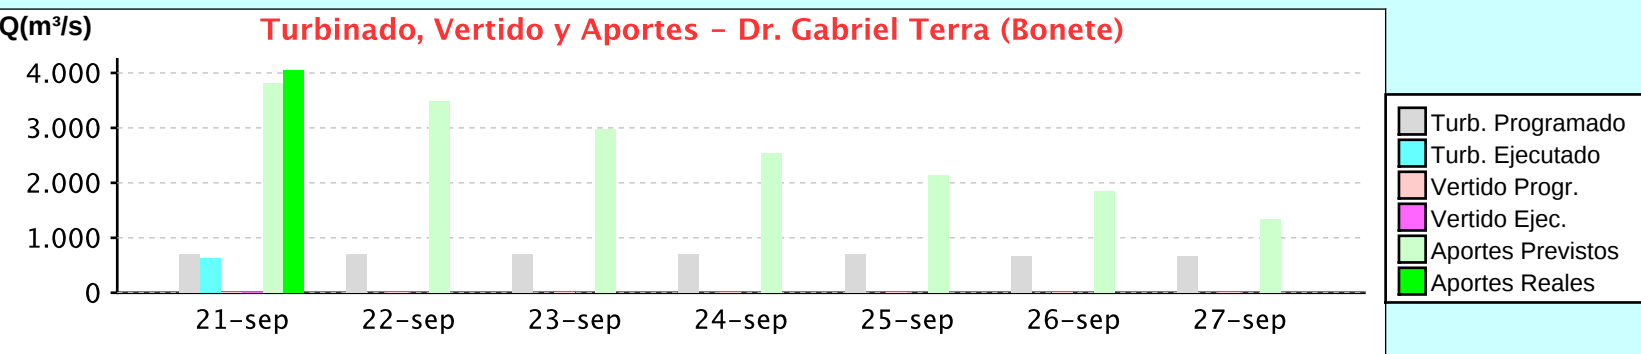

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

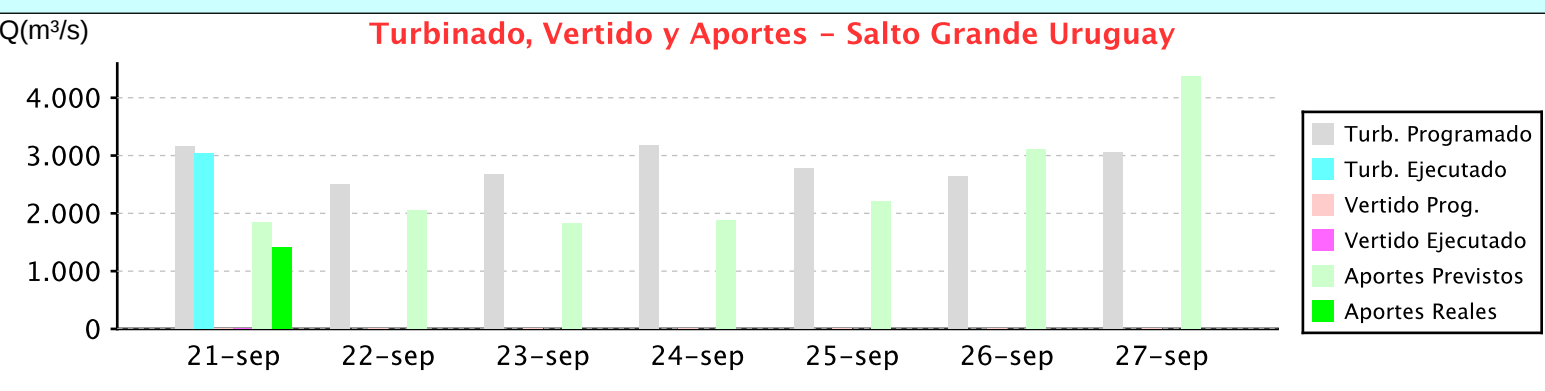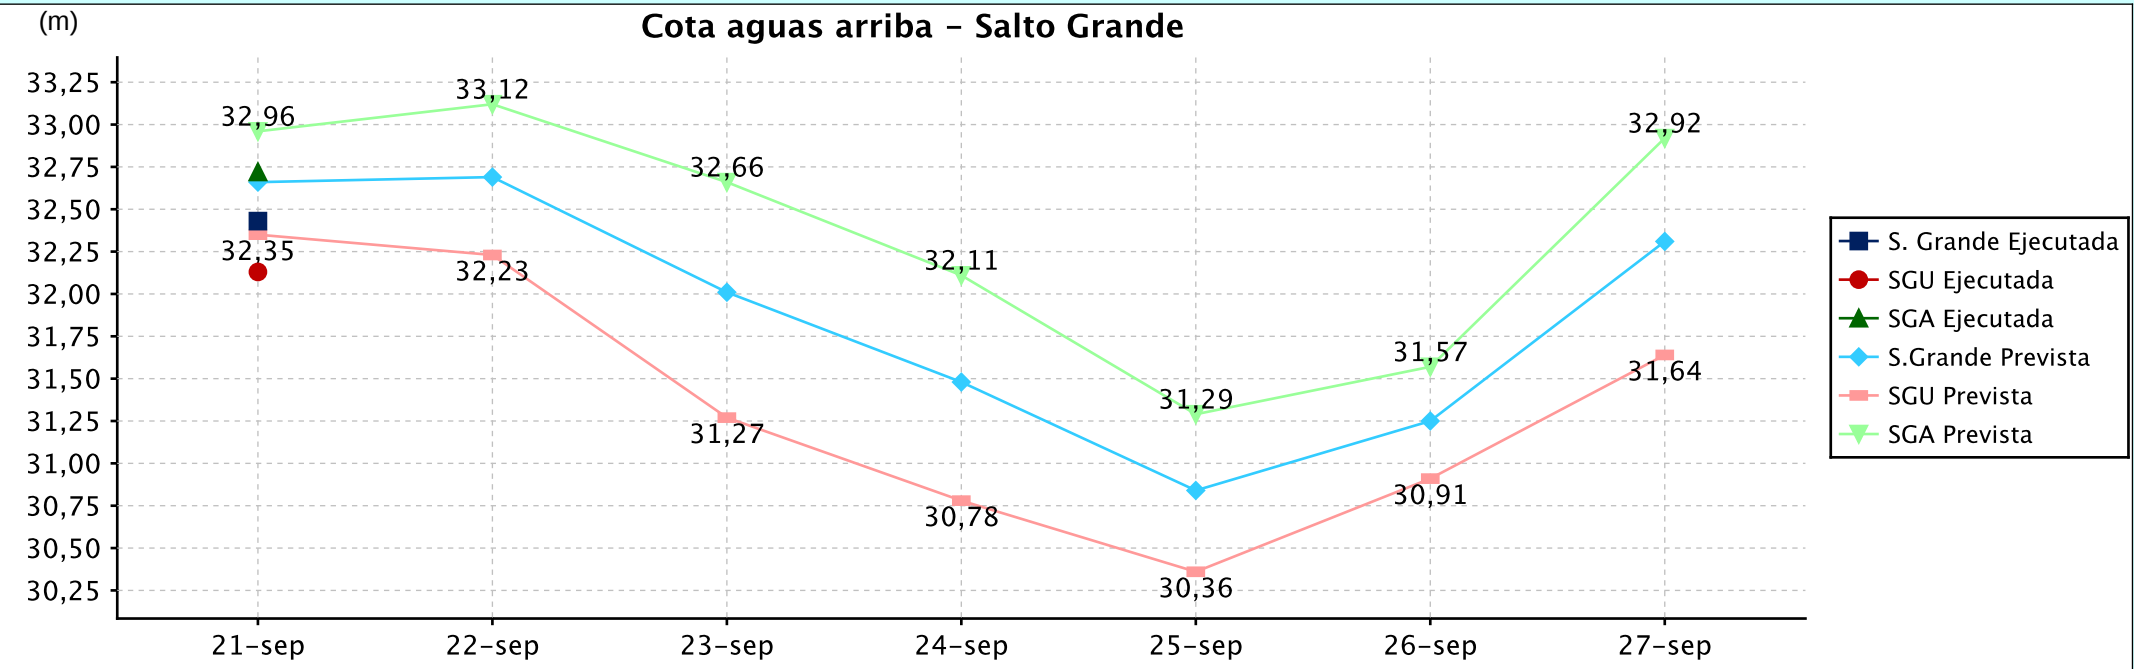

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	32,13
Cota Vista Arg	32,72
Cota real	32,43

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-9.616
---------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	698	628
Baygorria	310	428
Palmar	717	671
SGU	3.155	3.044

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	3.819	4.046
Baygorria	0	668
Palmar	1.135	1.815
SGU	1.850	1.410

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	372
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
