



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



martes 24 de septiembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	3.649
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	2.676
Motores	977
Central La Tablada	-83
Central P. del Tigre	411
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-1
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.172
C. Baygorria	2.050
C. Palmar	5.801
C. Salto Grande	14.957
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.179
TOTAL Generación	31.129

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	31.129
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.650
Diferencia (MWh)	479
Ejecutada - Programada	1,56 %

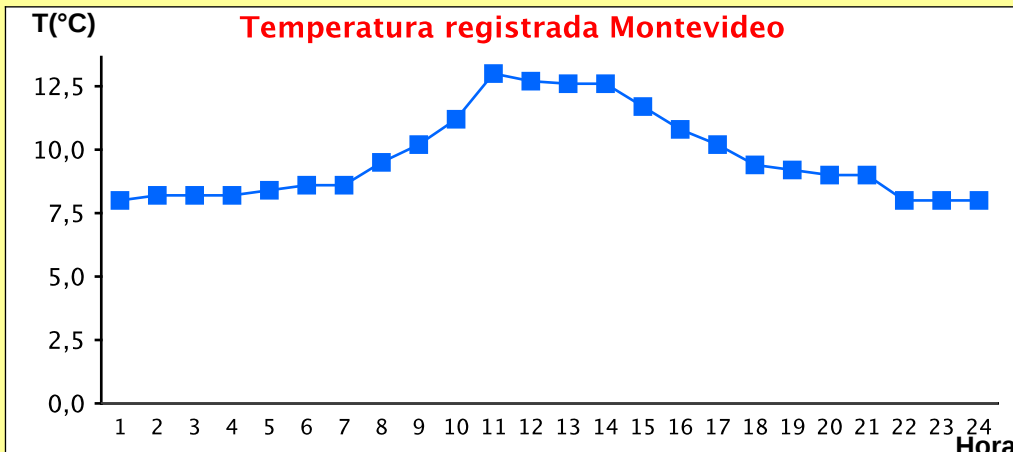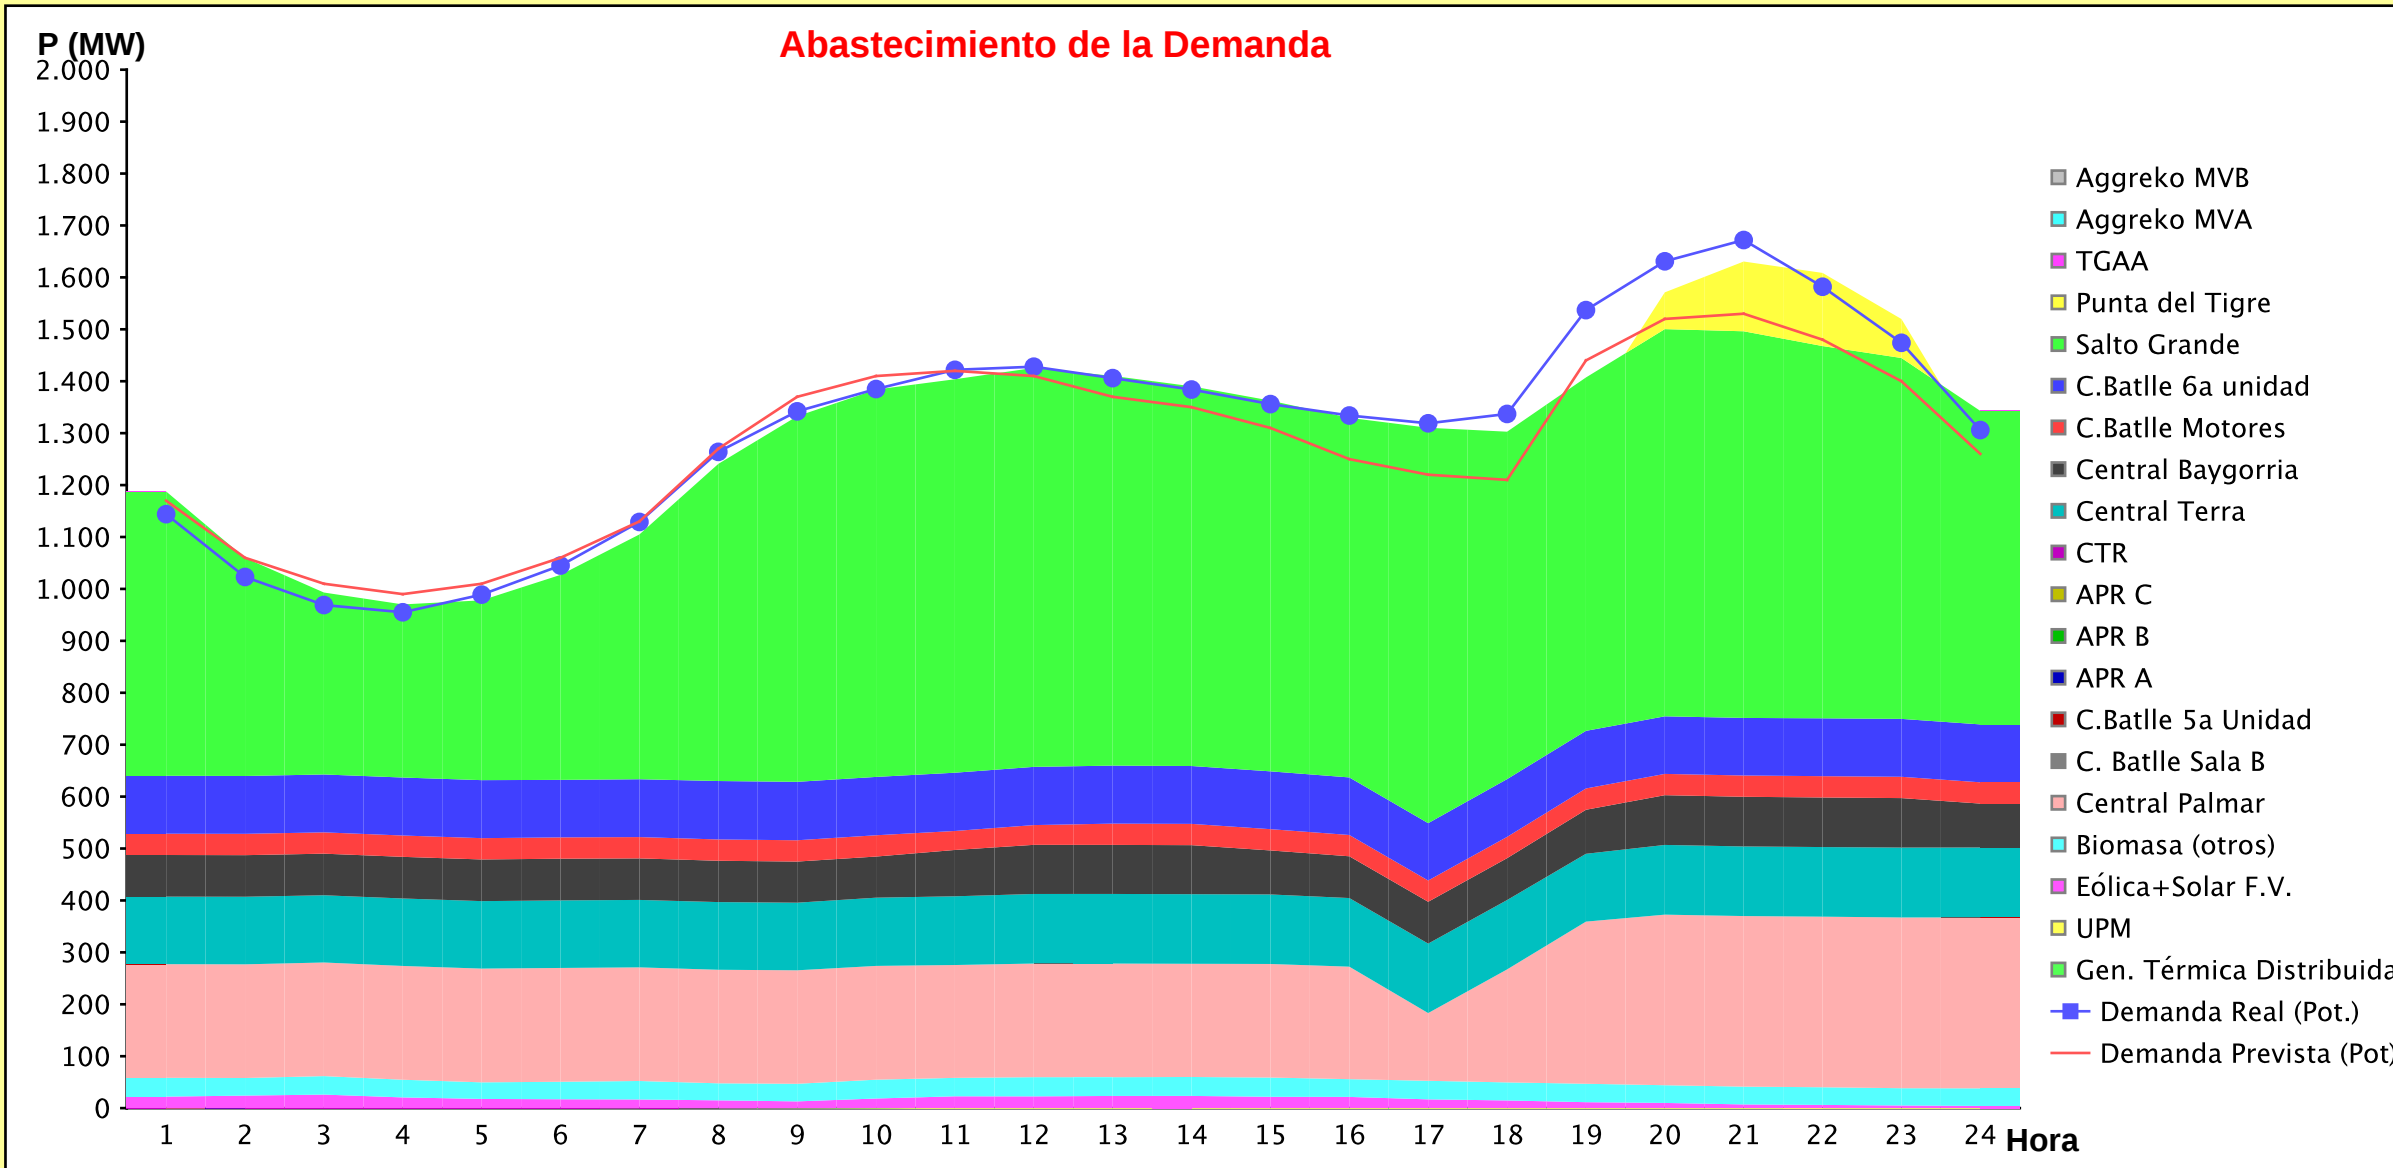



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1449,59 Hora 11:43
Potencia mínima:	951,96 Hora 03:58
Pico noche:	1677,75 Hora 20:58

Generación Media (MW)	
Eólica	17,2
Biomasa	38,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

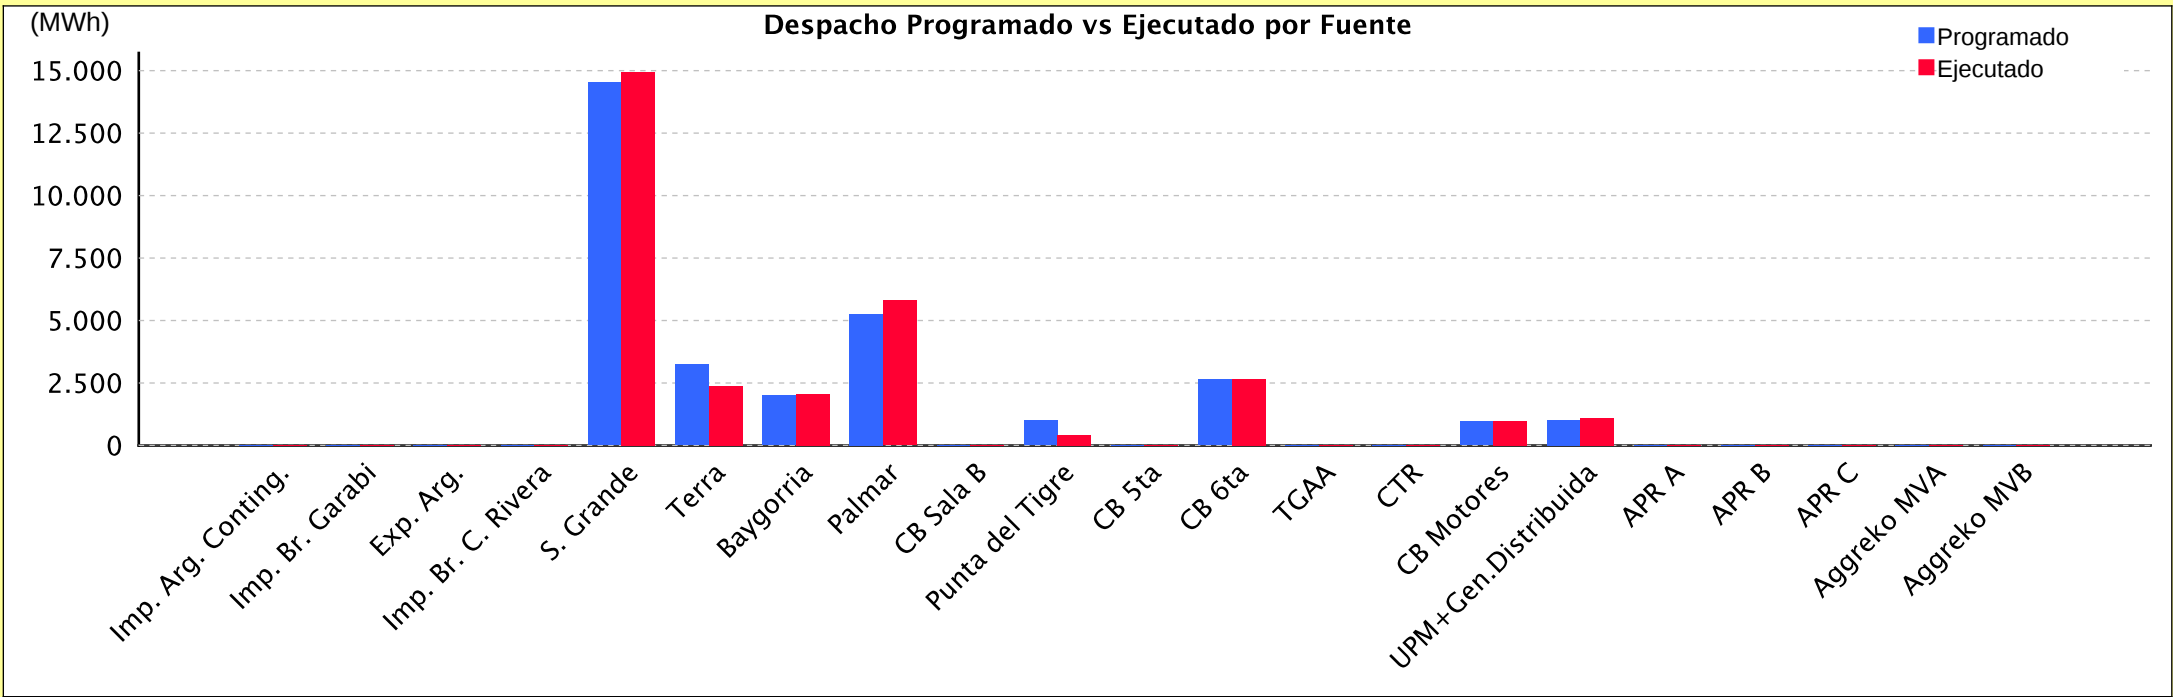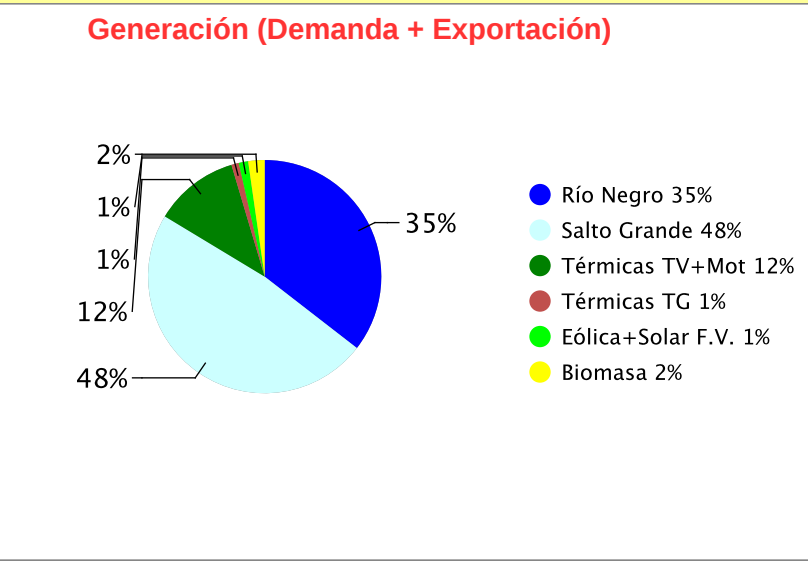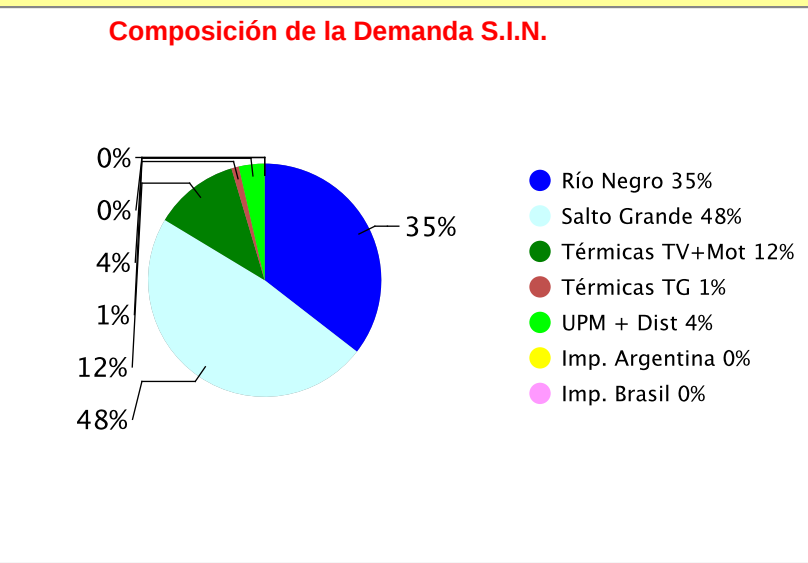



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

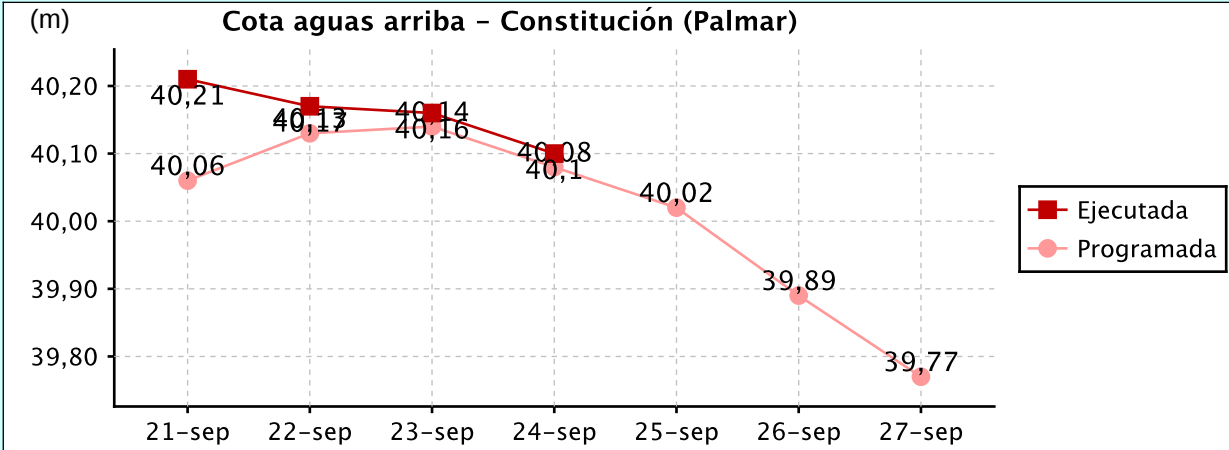
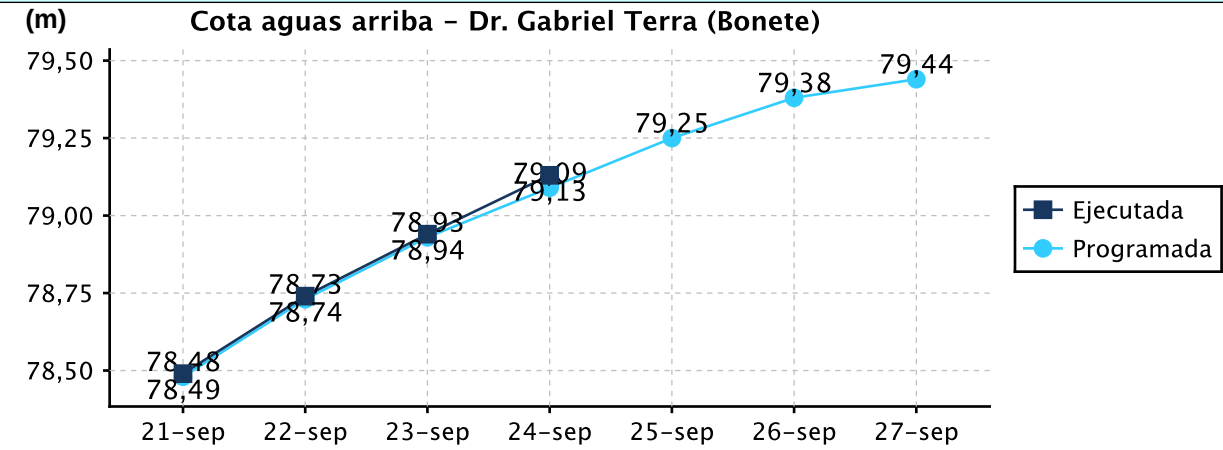


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,09	79,13
Baygorria	54,16	54,14
Palmar	40,08	40,1
SGU	30,78	30,62

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

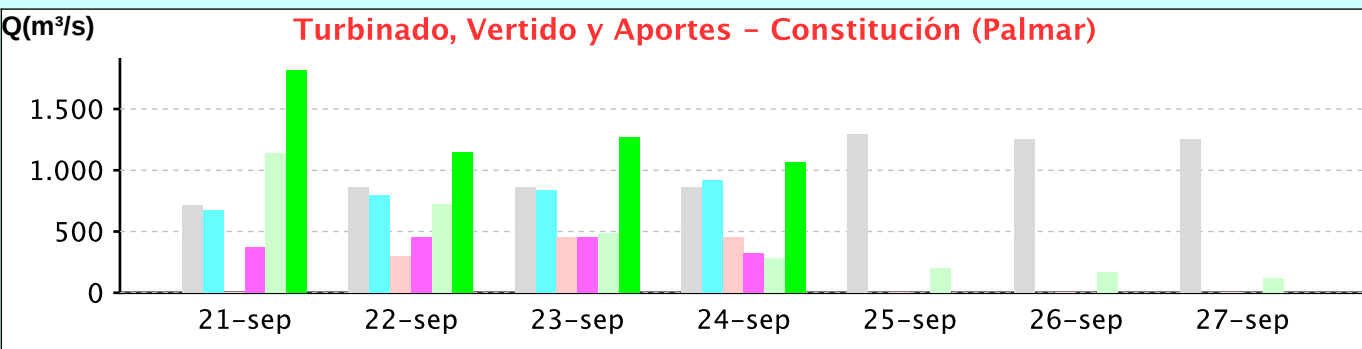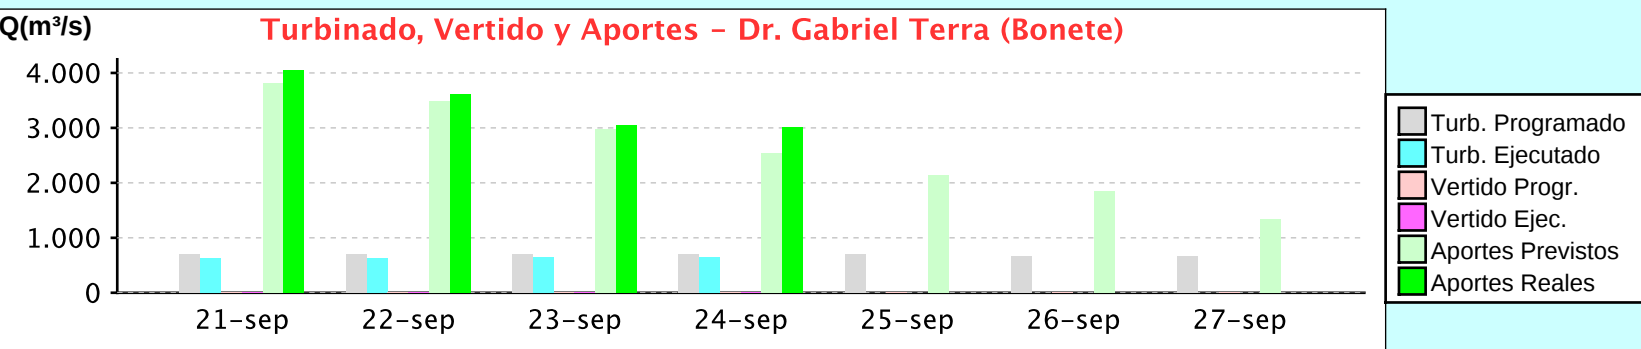

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

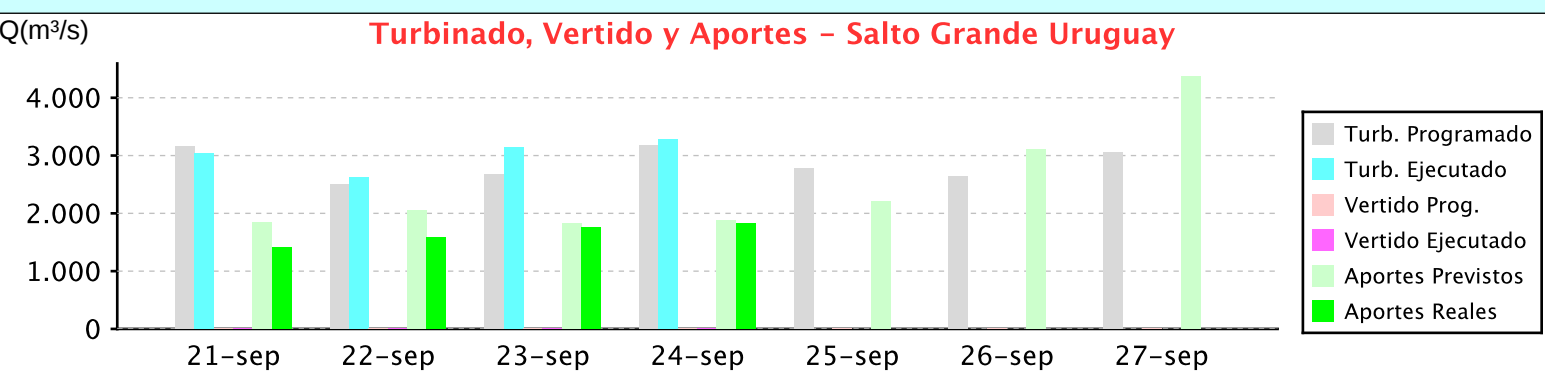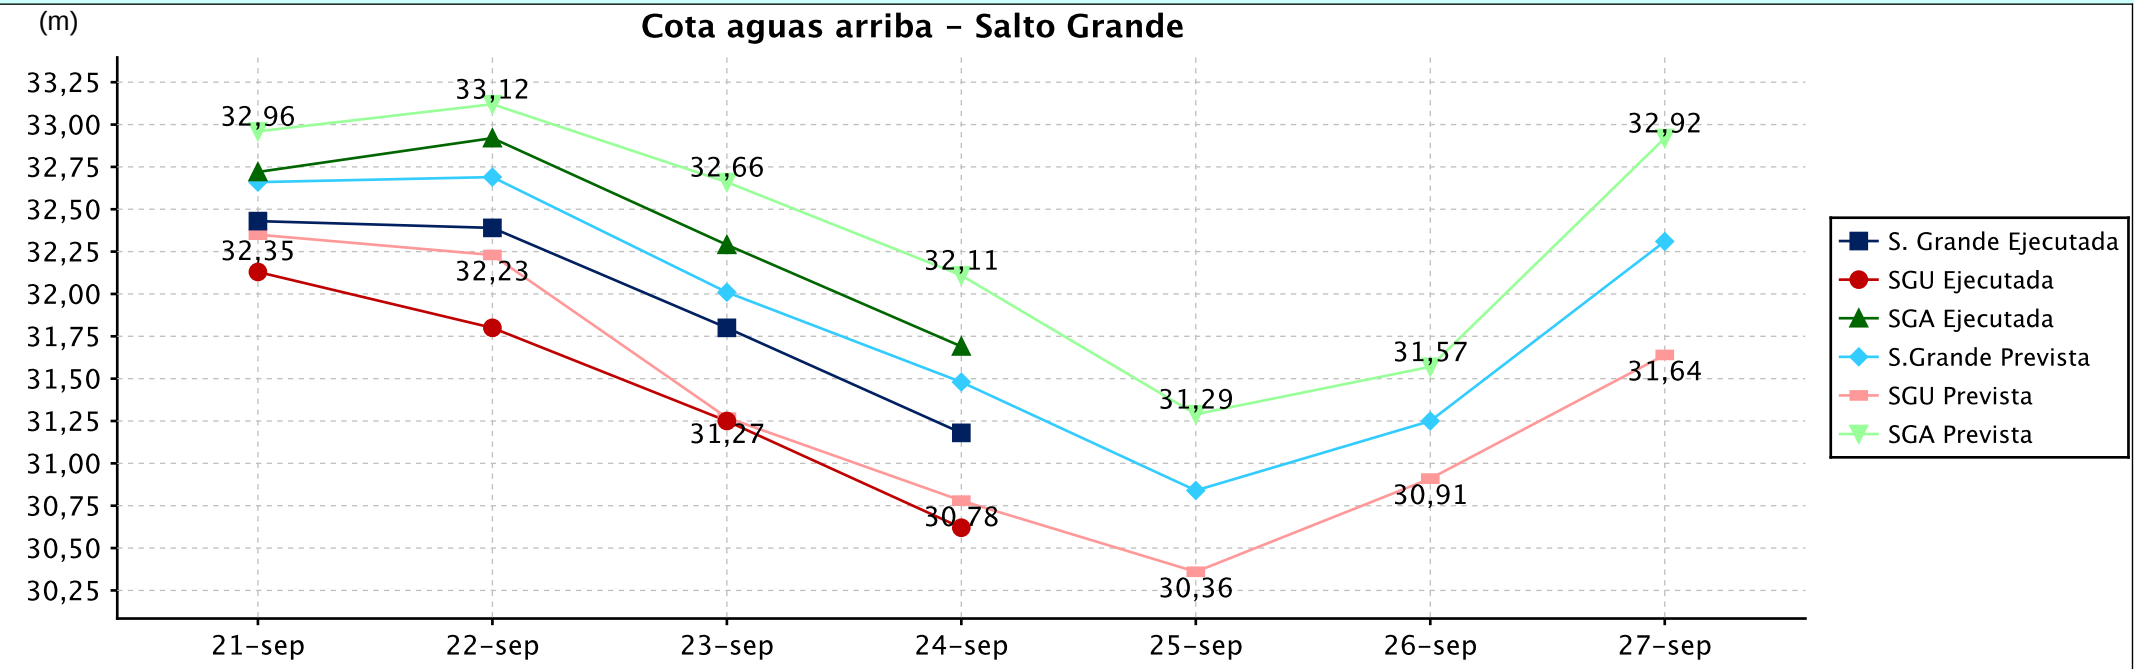

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	30,62
Cota Vista Arg	31,69
Cota real	31,18
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-14.213

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	698	653
Baygorria	697	736
Palmar	861	919
SGU	3.178	3.277

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	2.535	3.009
Baygorria	0	675
Palmar	280	1.068
SGU	1.875	1.832

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	450	324
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
