



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



jueves 26 de septiembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	3.348
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	2.628
Motores	724
Central La Tablada	22
Central P. del Tigre	78
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-1
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.207
C. Baygorria	1.989
C. Palmar	7.857
C. Salto Grande	11.793
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	807
TOTAL Generación	29.094

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.094
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.930
Diferencia (MWh)	-836
Ejecutada - Programada	-2,79 %

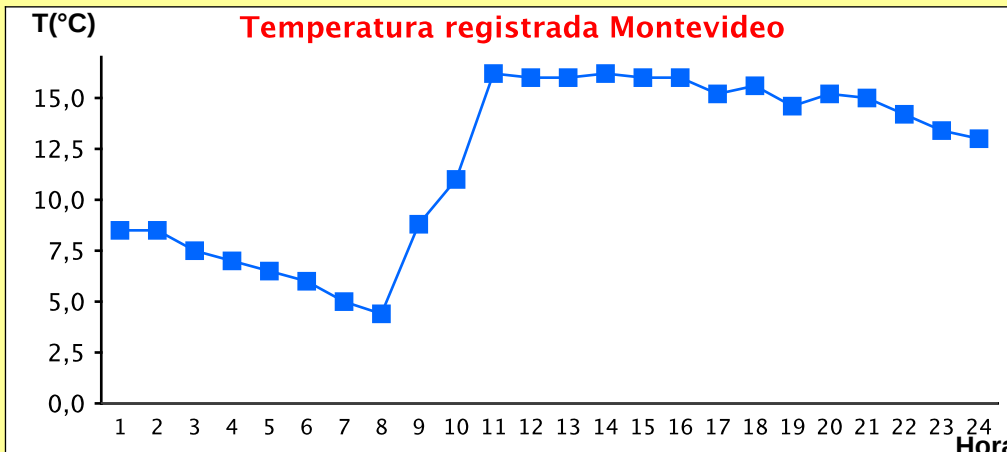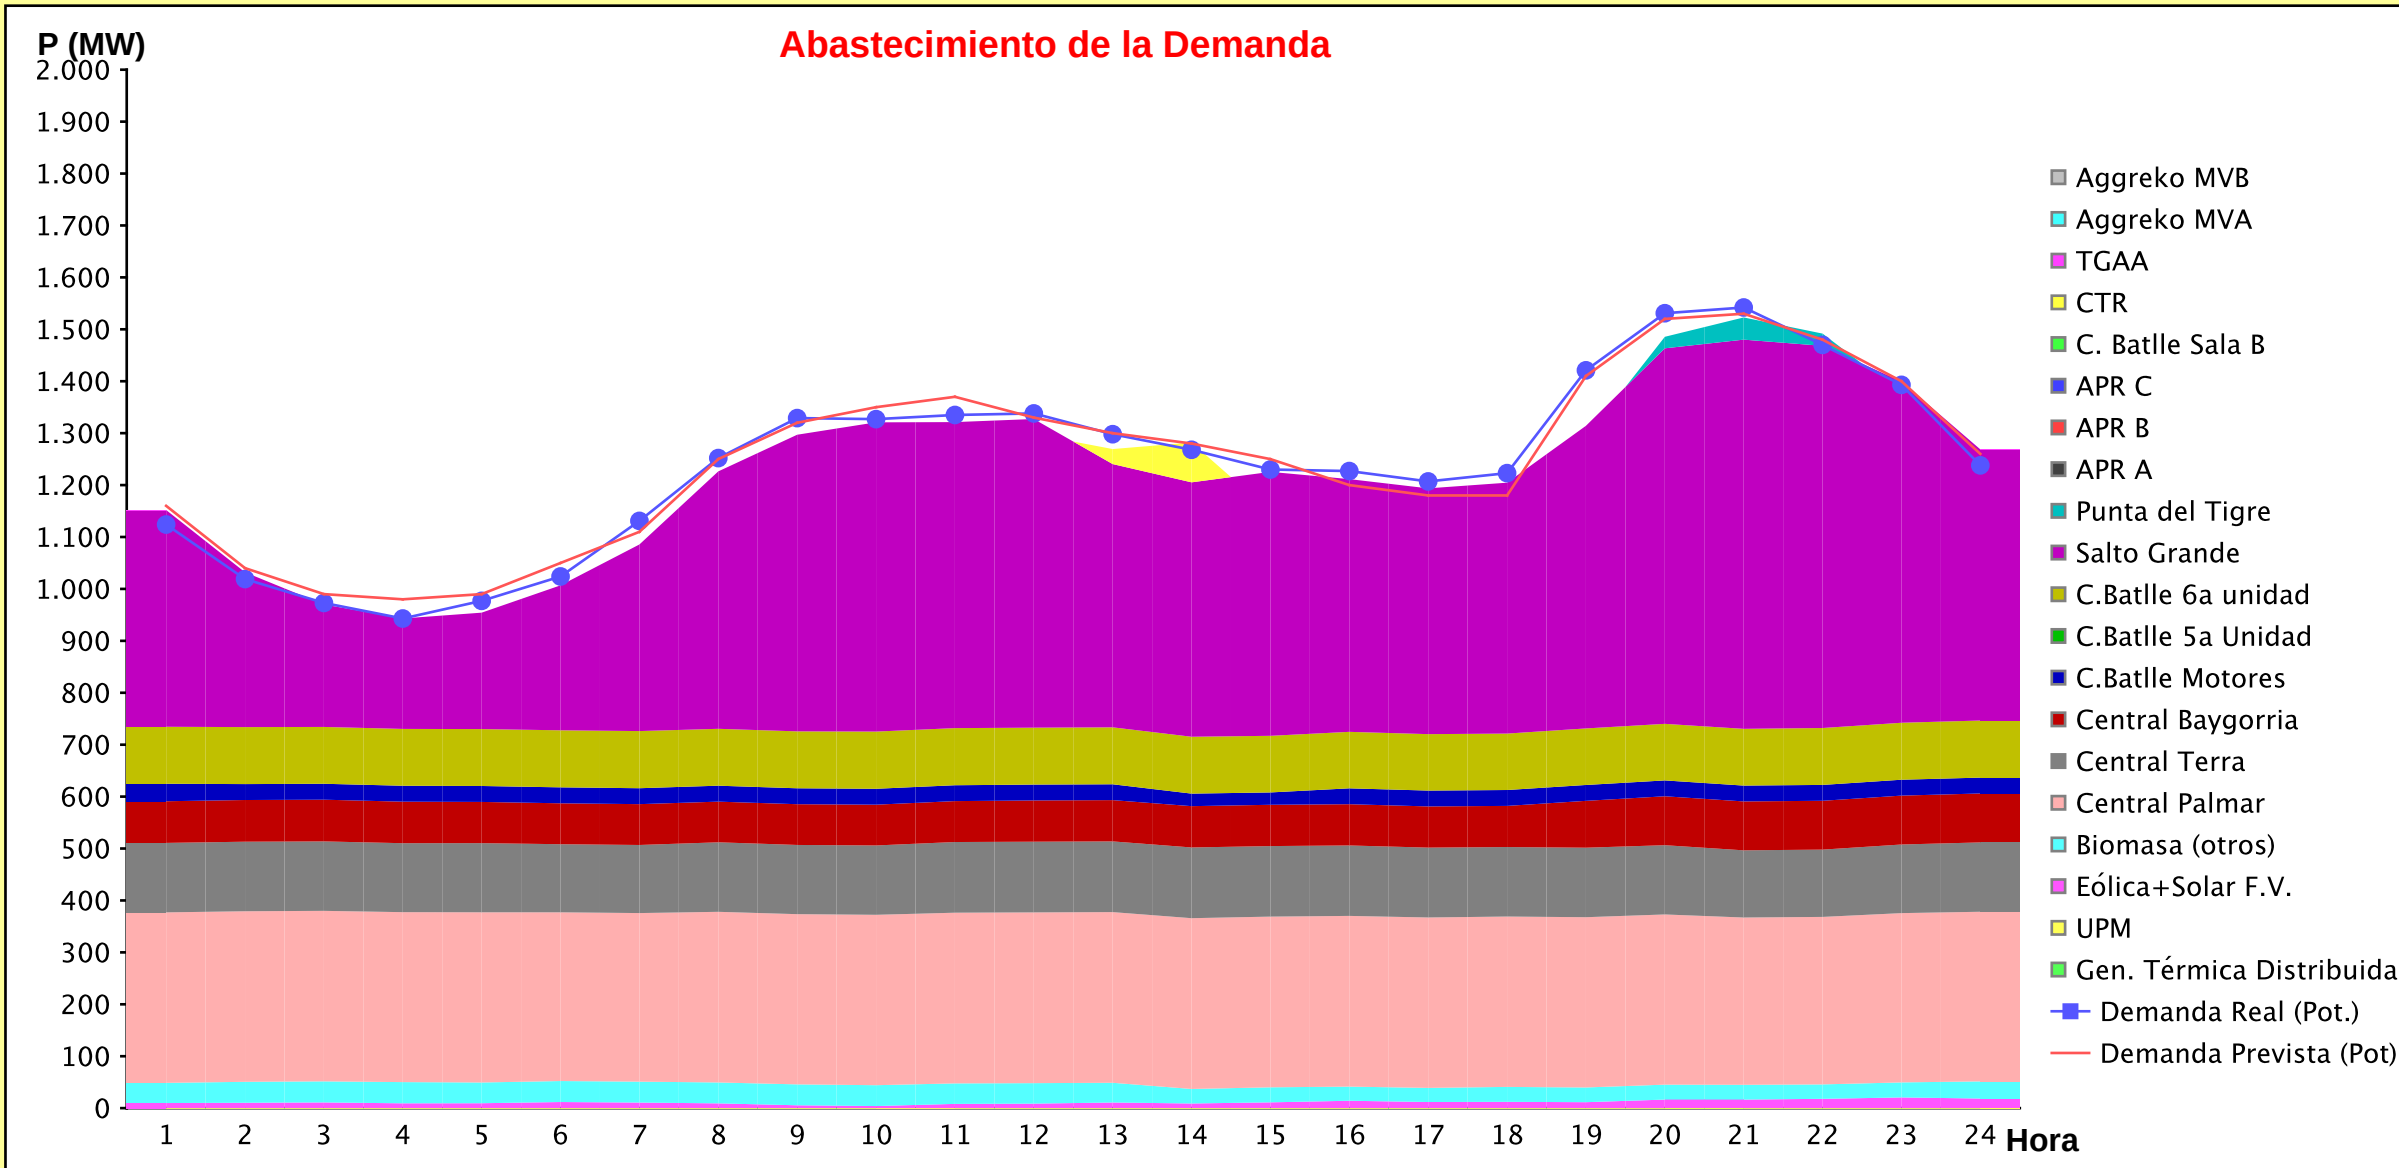



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1358,22 Hora 11:29
Potencia mínima:	944,87 Hora 04:06
Pico noche:	1556,43 Hora 20:38

Generación Media (MW)	
Eólica	11,9
Biomasa	37,9
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

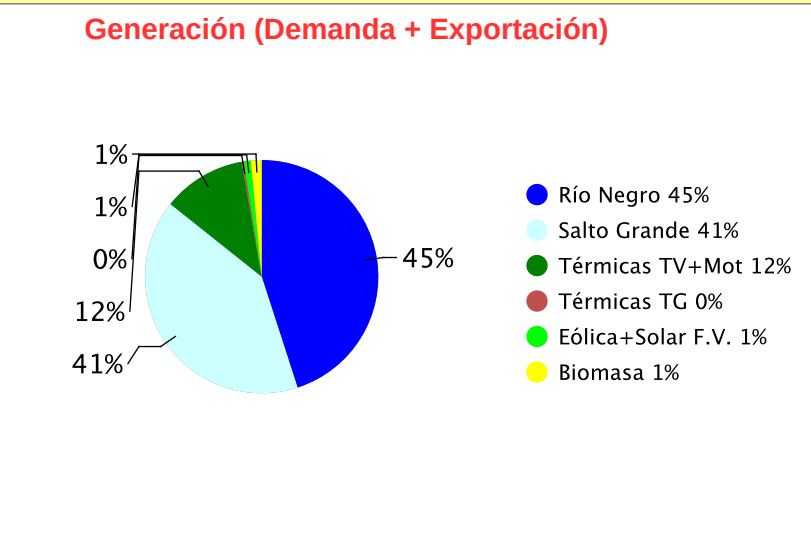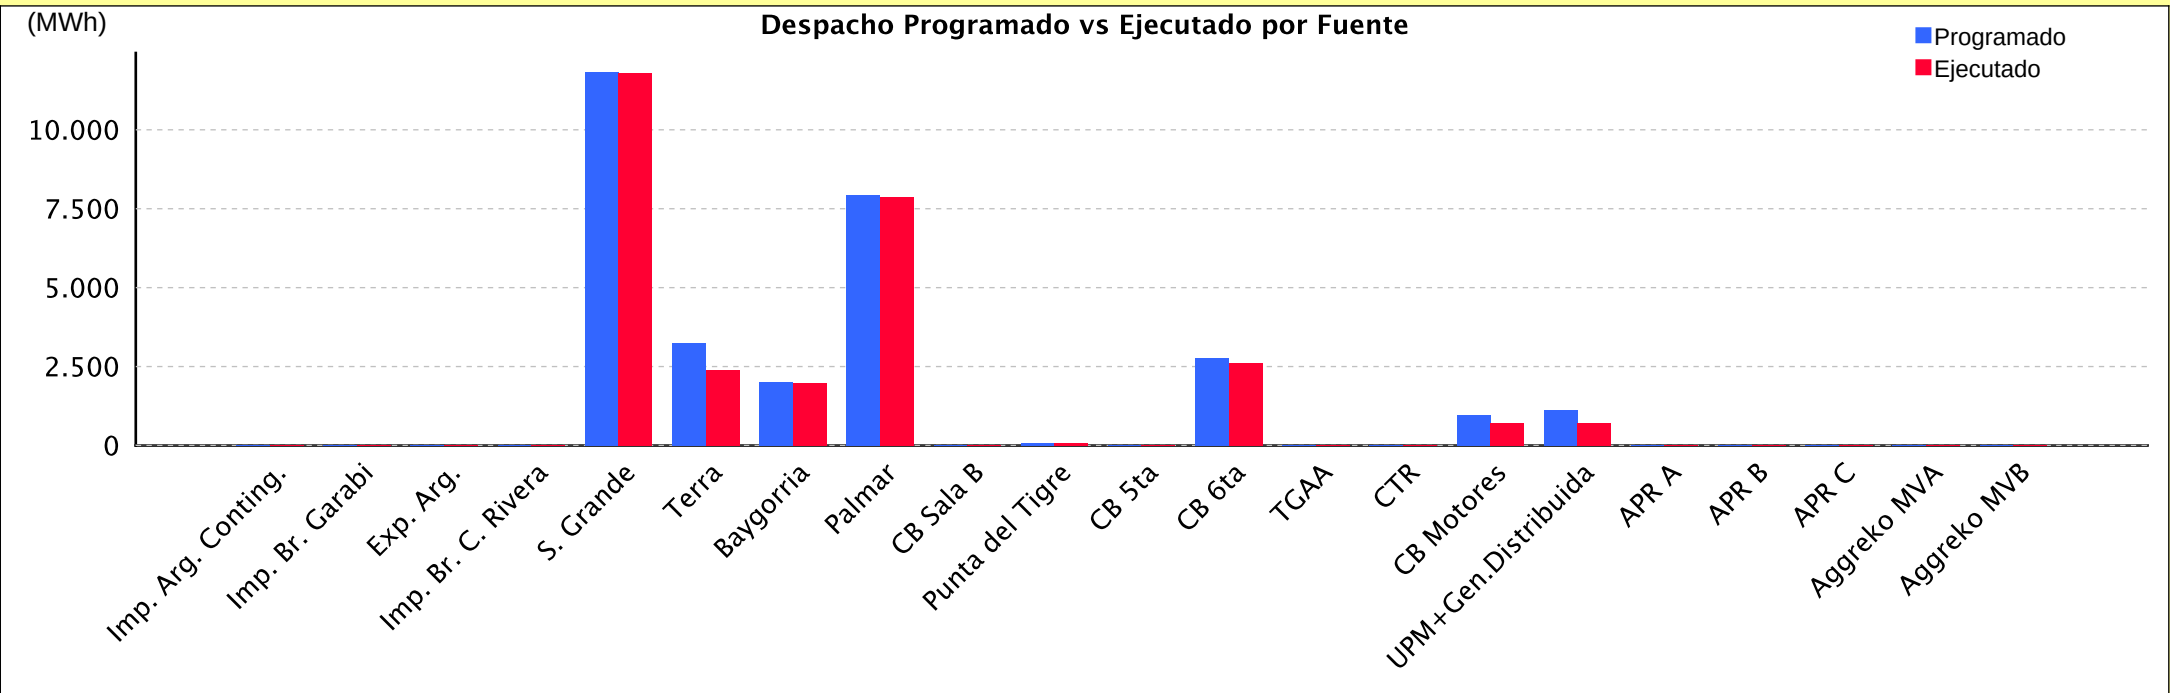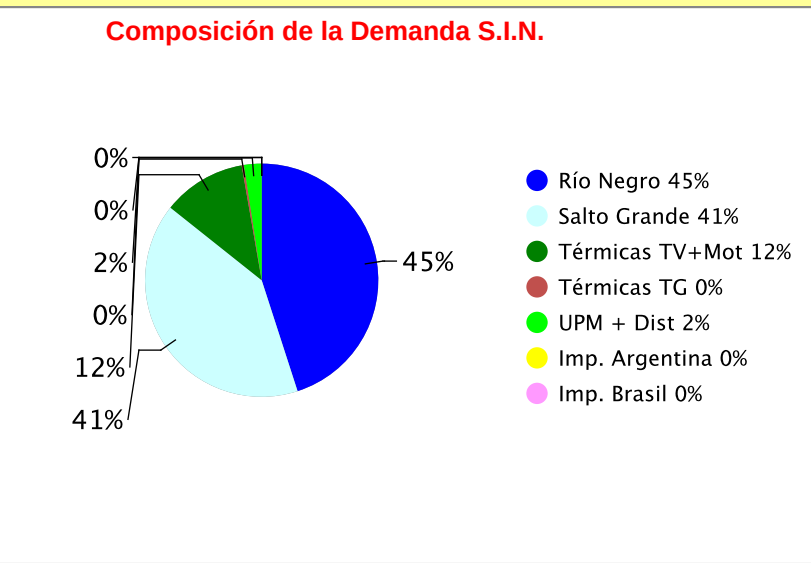



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

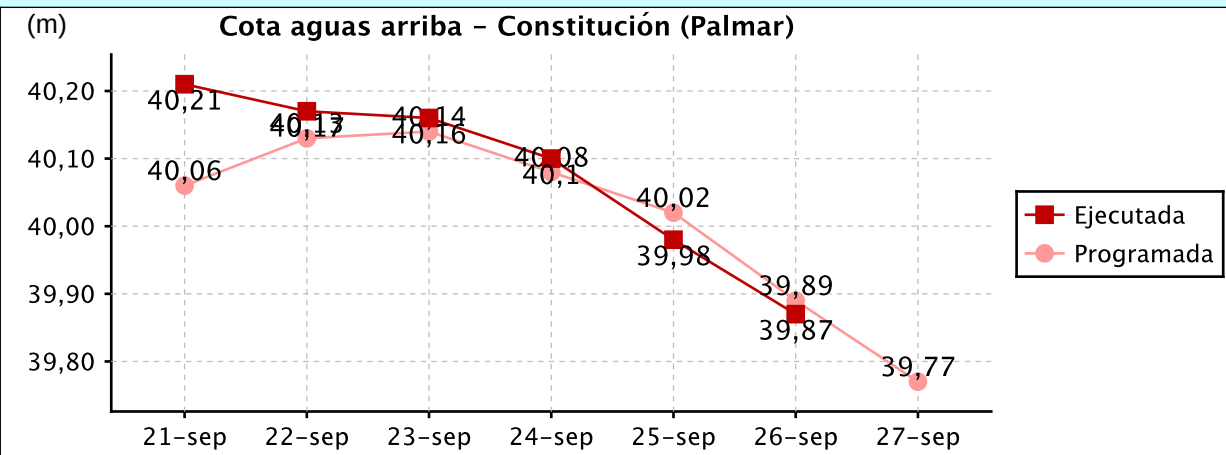
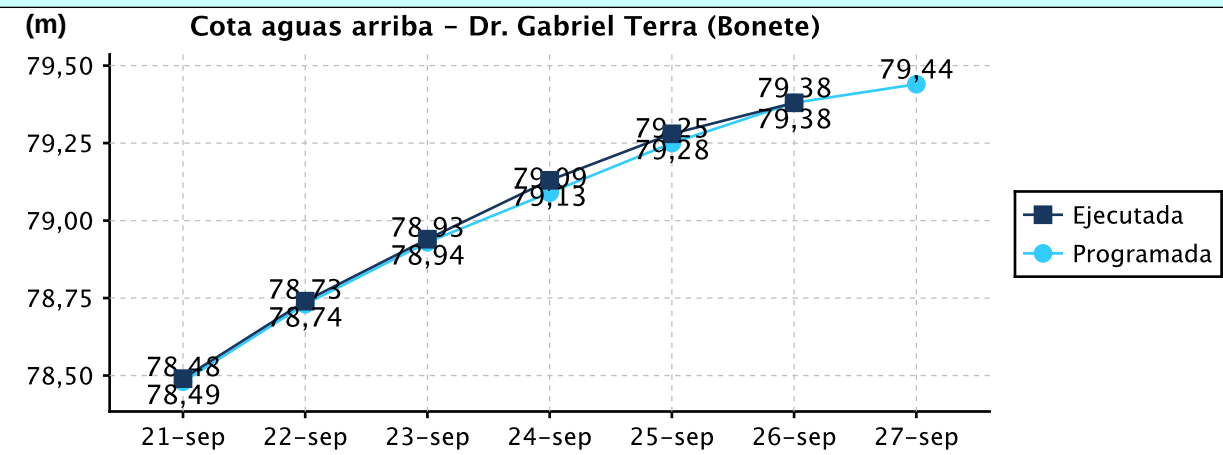


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,38	79,38
Baygorria	54,05	54,11
Palmar	39,89	39,87
SGU	30,91	31,07

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

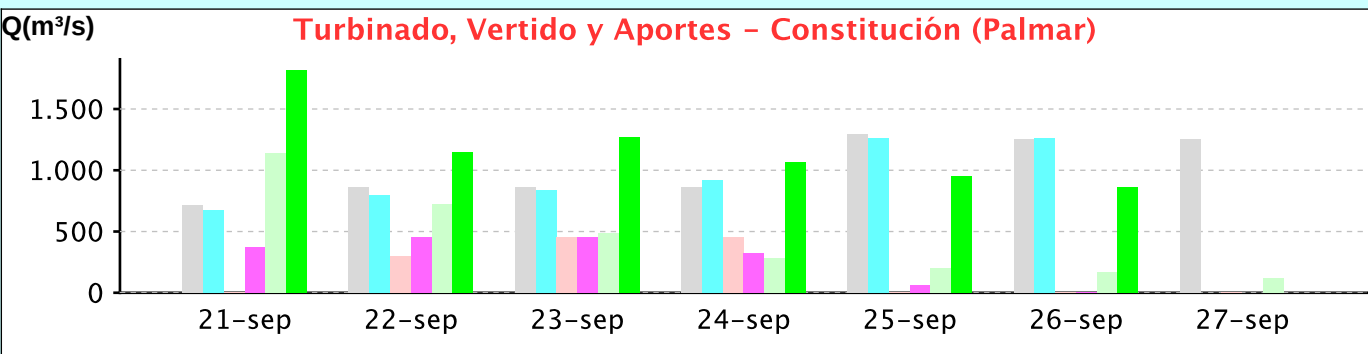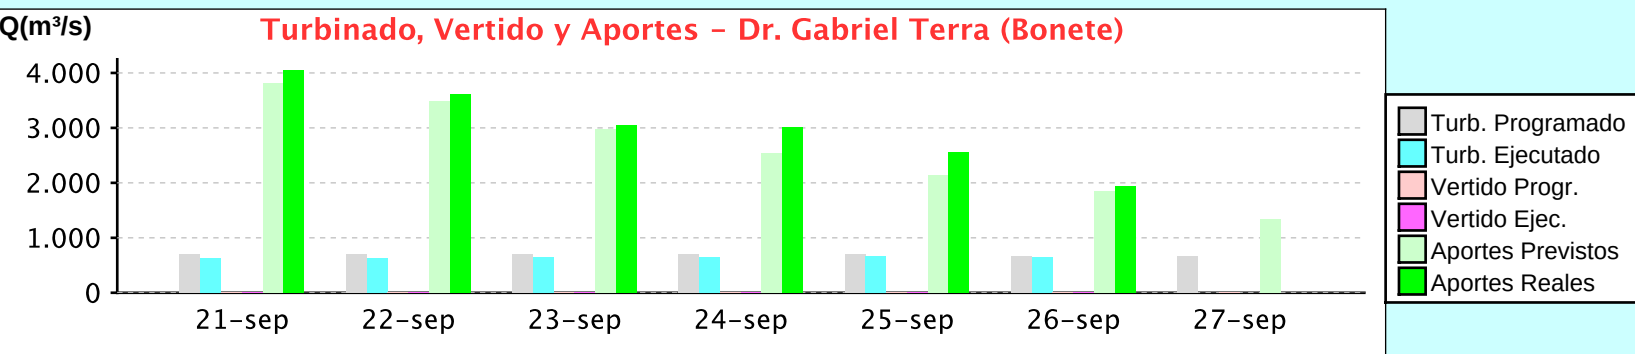

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

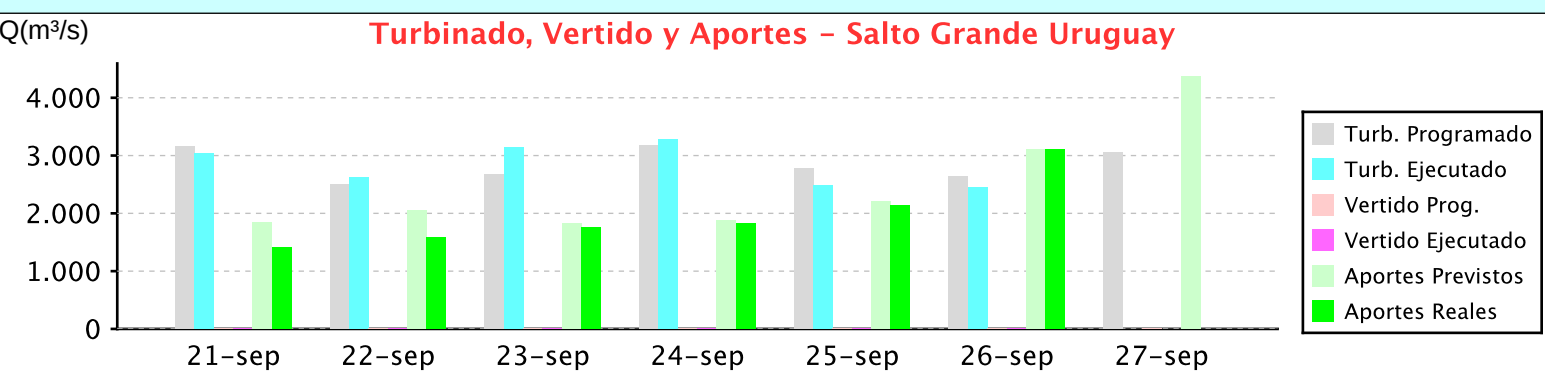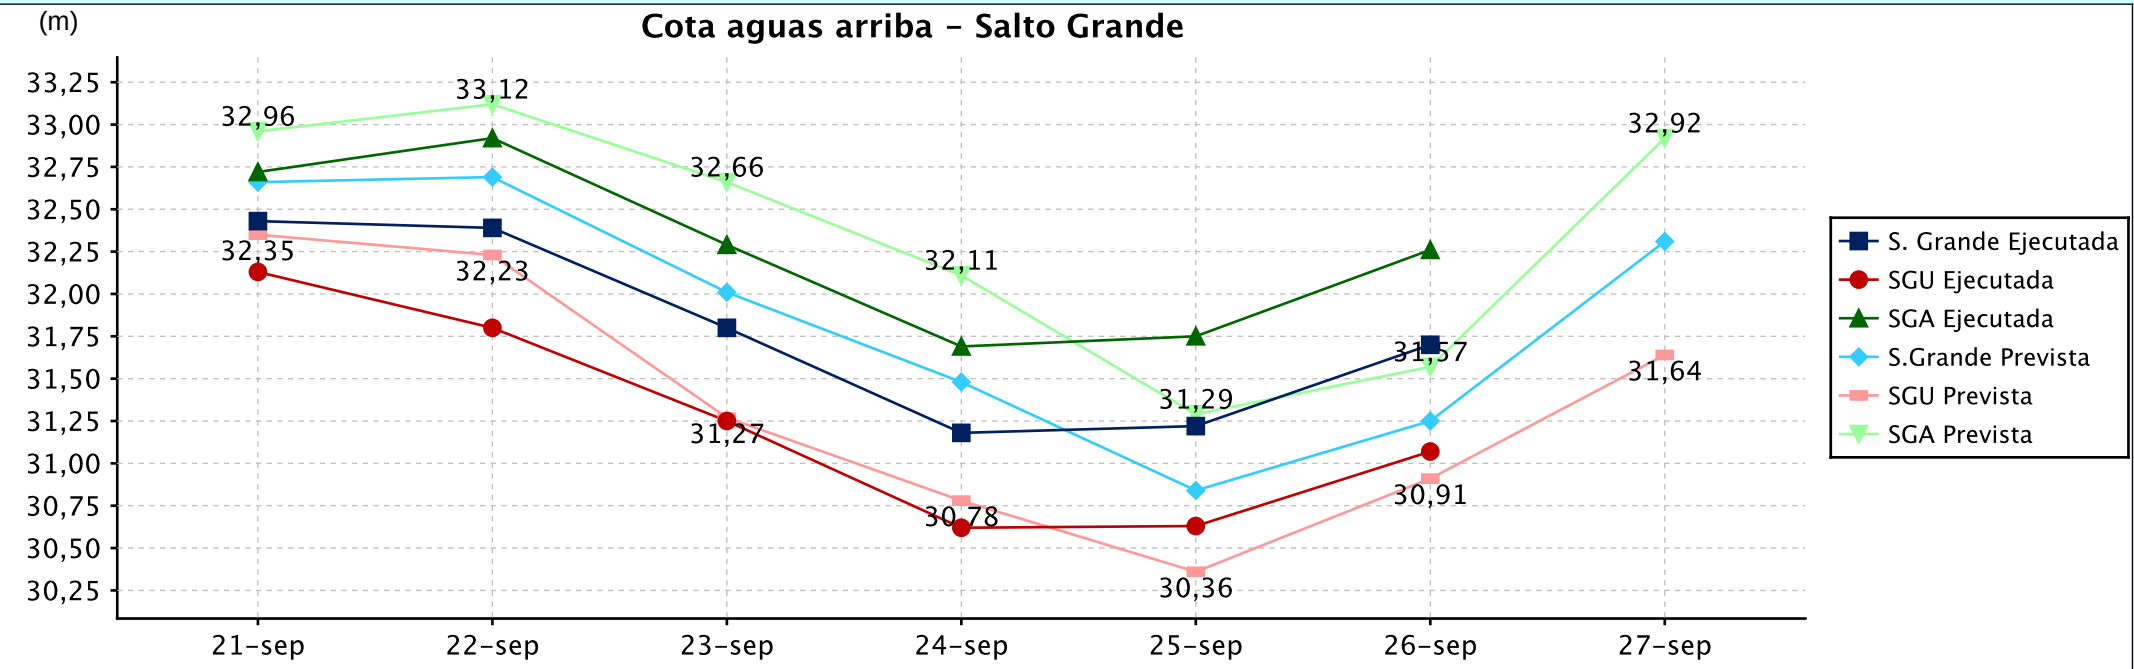

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	31,07
Cota Vista Arg	32,26
Cota real	31,70

Dif. Energ. (U-A)	Acumulado MWh
	-17.106

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	667	651
Baygorria	723	699
Palmar	1.252	1.258
SGU	2.634	2.457

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.843	1.931
Baygorria	0	684
Palmar	165	861
SGU	3.100	3.106

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
