



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



viernes 27 de septiembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	1.007
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	963
Motores	48
Central La Tablada	-85
Central P. del Tigre	58
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-1
Aggreko	51
Aggreko MVA	26
Aggreko MVB	25
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.226
C. Baygorria	1.973
C. Palmar	7.874
C. Salto Grande	13.416
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.035
TOTAL Generación	28.550

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.550
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.040
Diferencia (MWh)	-1.490
Ejecutada - Programada	-4,96 %

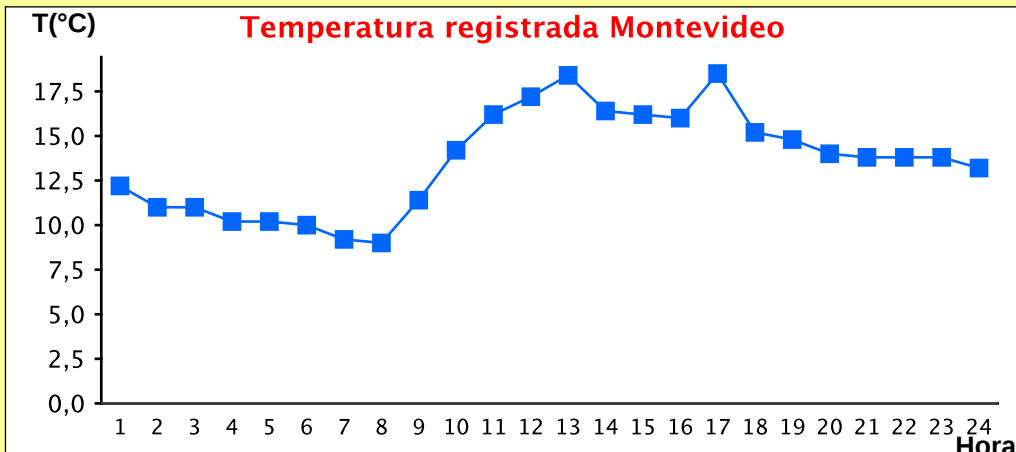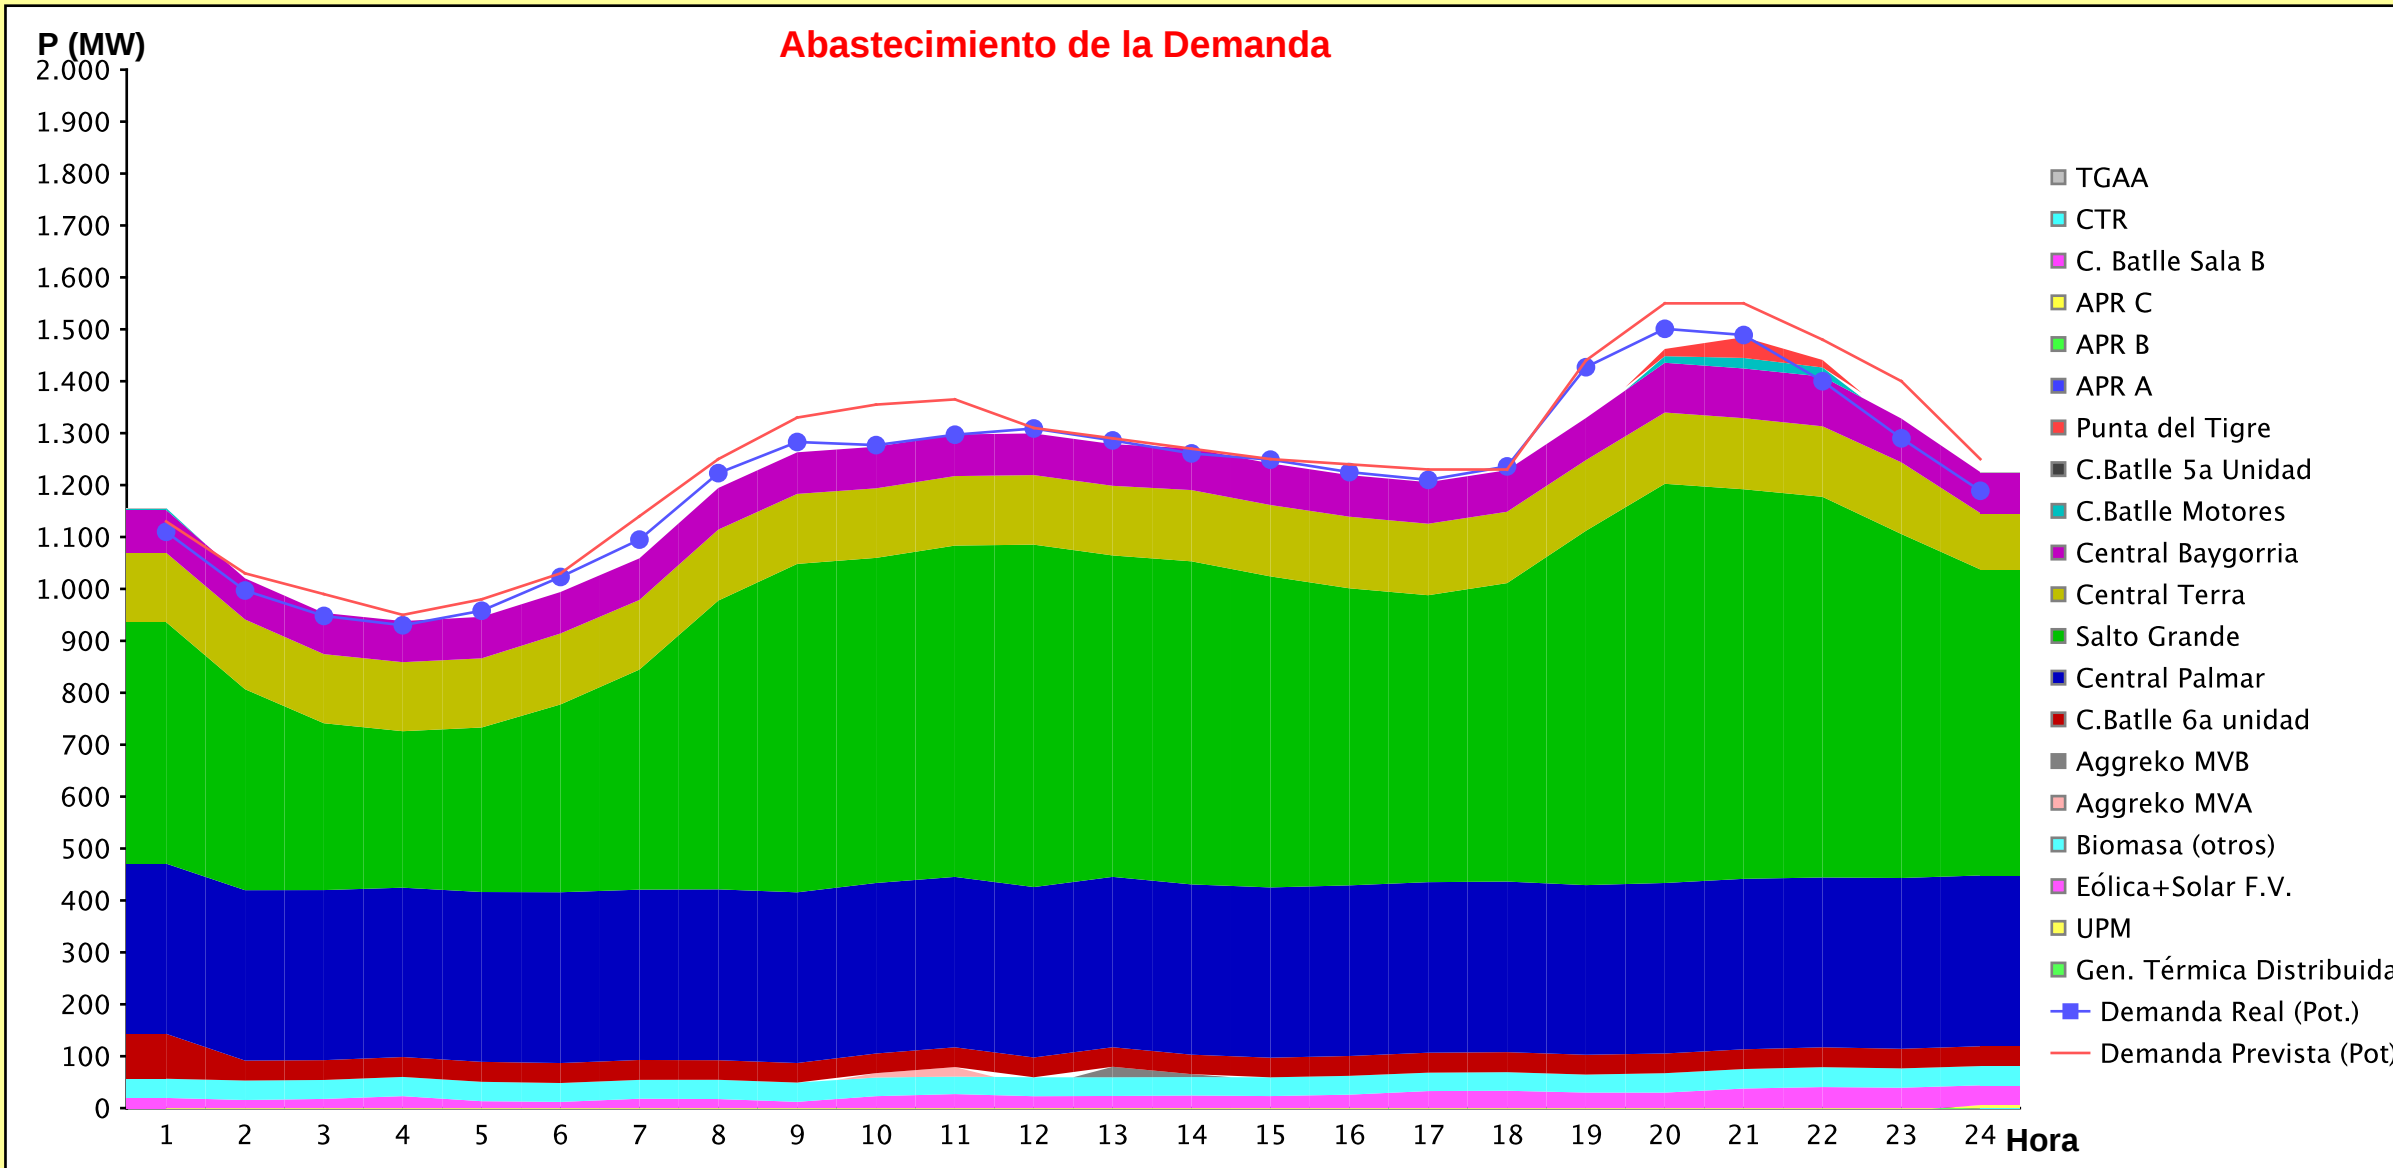



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1350,4 Hora 11:19
Potencia mínima:	925,52 Hora 03:58
Pico noche:	1512,83 Hora 20:05

Generación Media (MW)	
Eólica	25,2
Biomasa	39,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

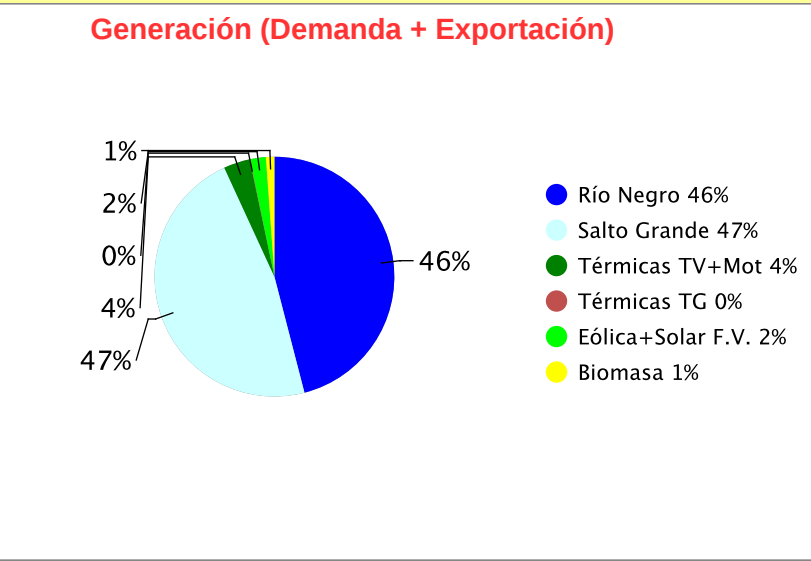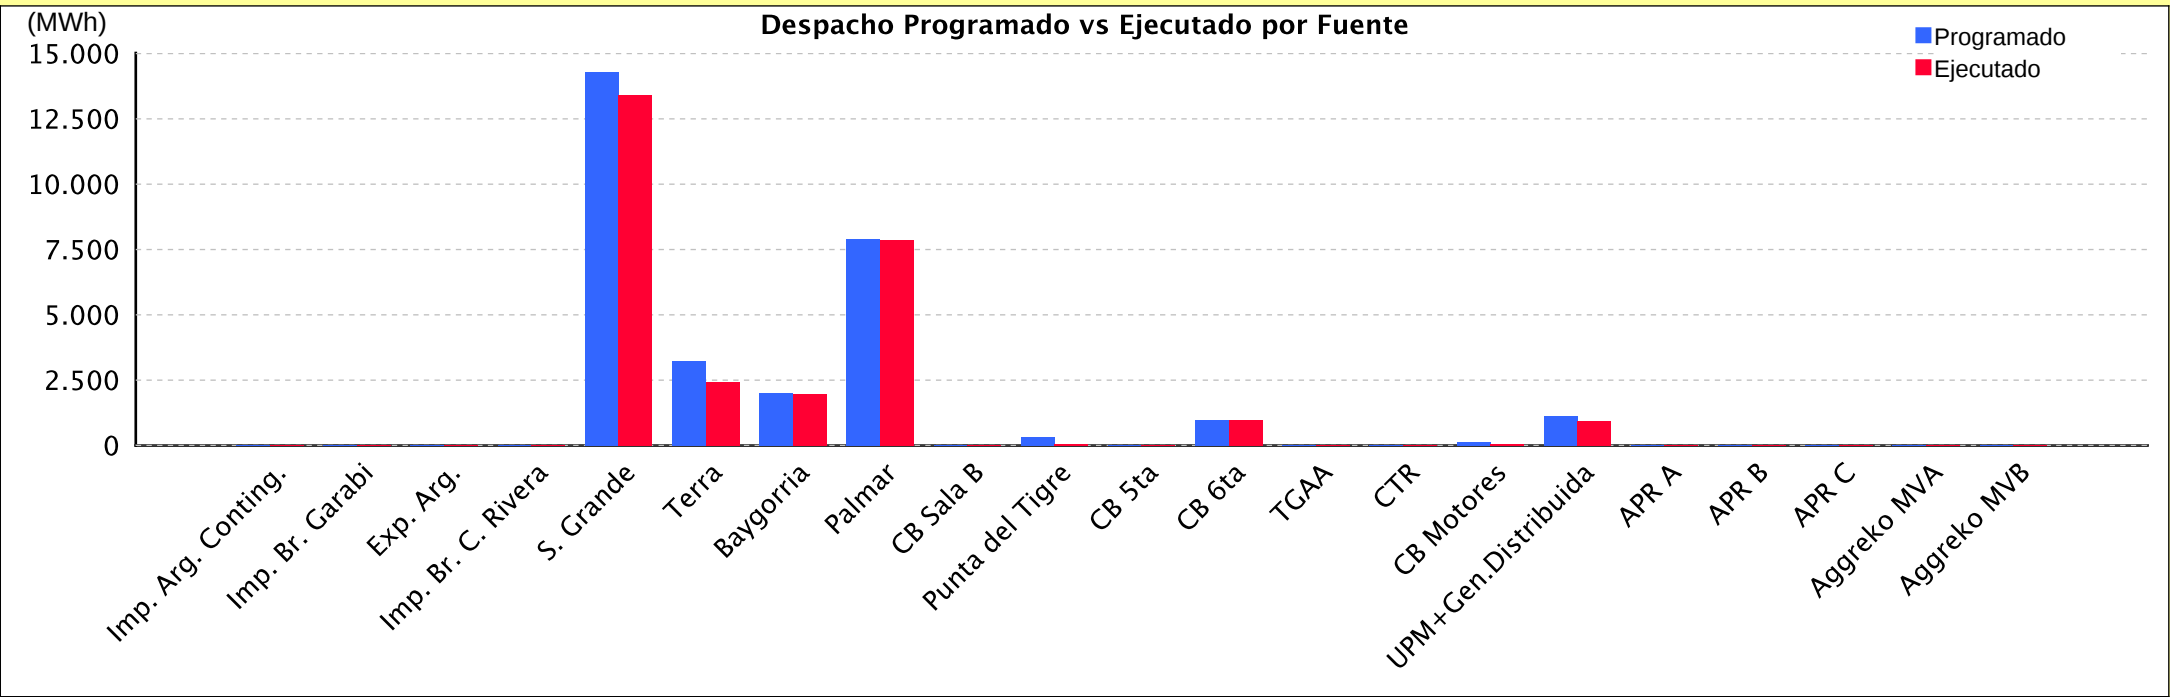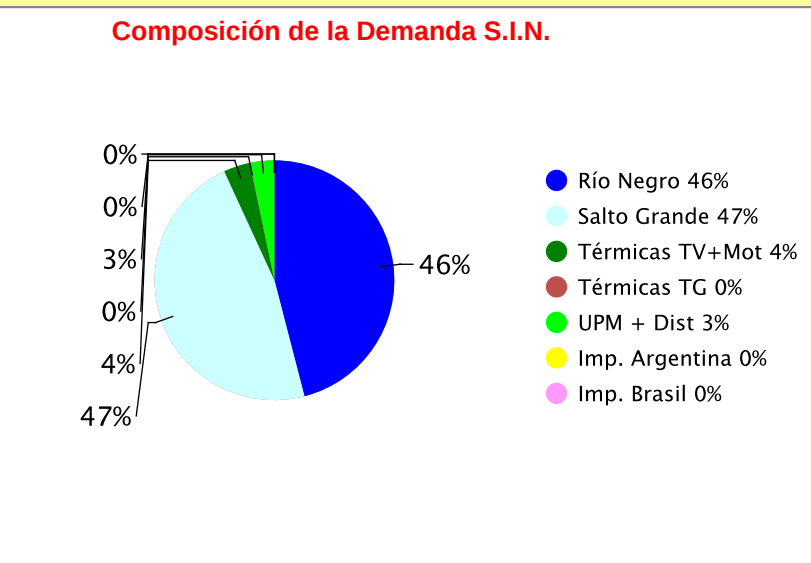



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

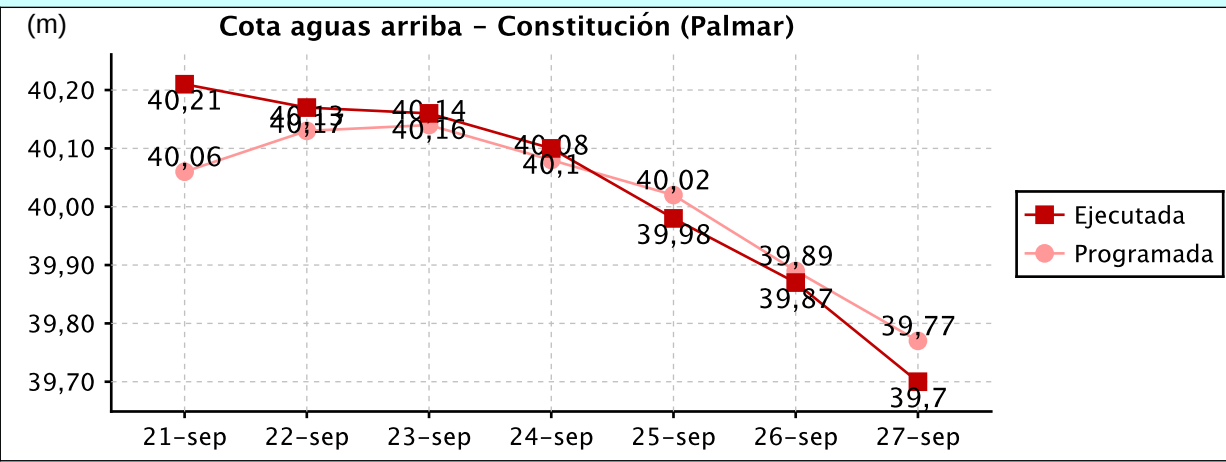
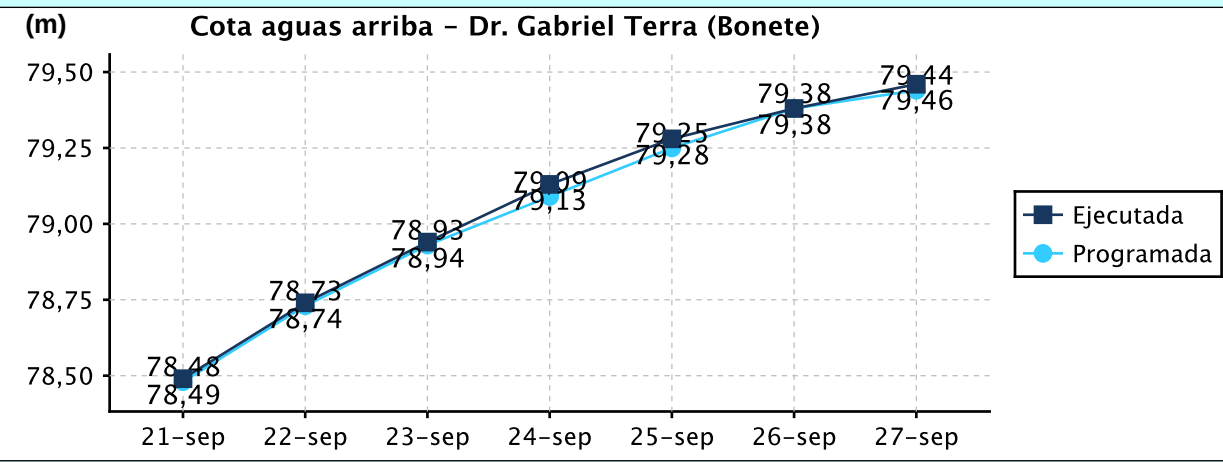


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,44	79,46
Baygorria	54,03	54,08
Palmar	39,77	39,7
SGU	31,64	31,81

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

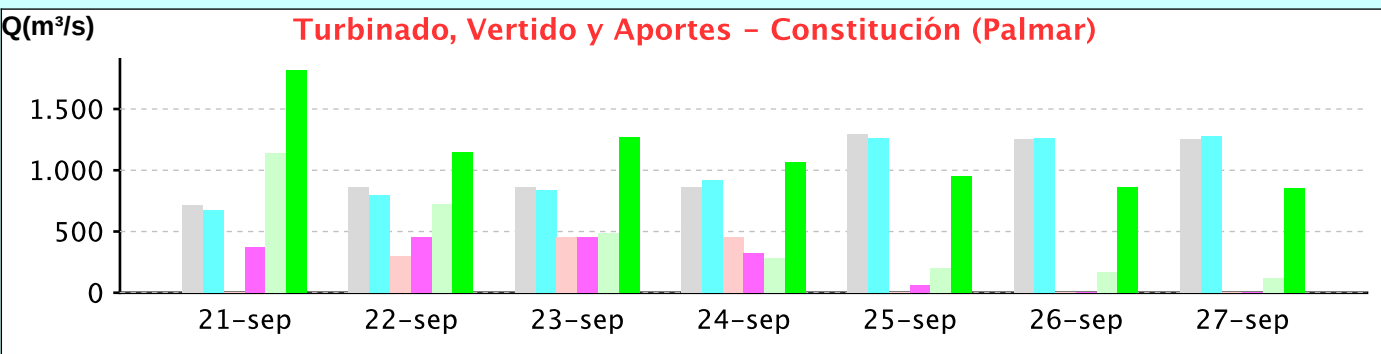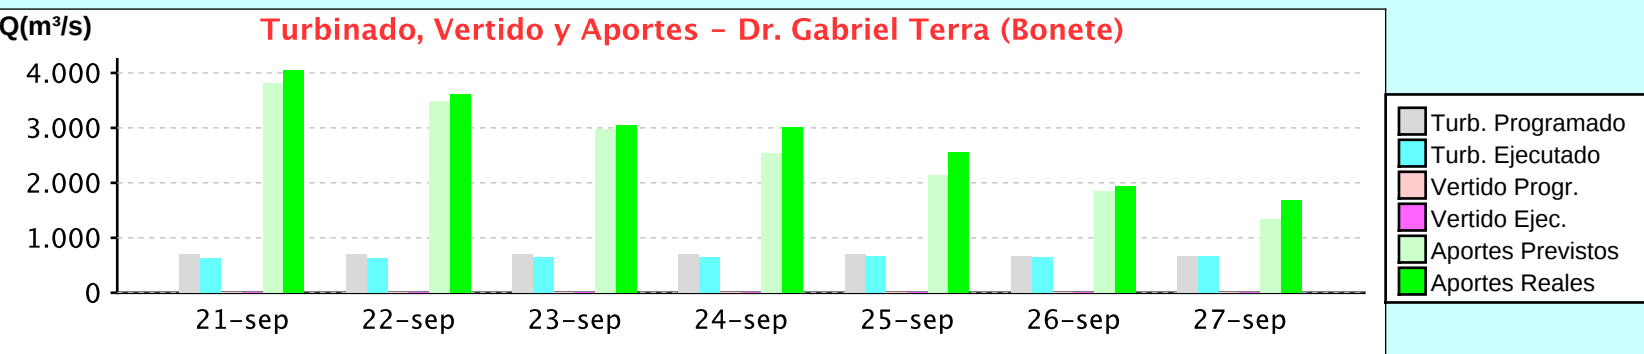

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

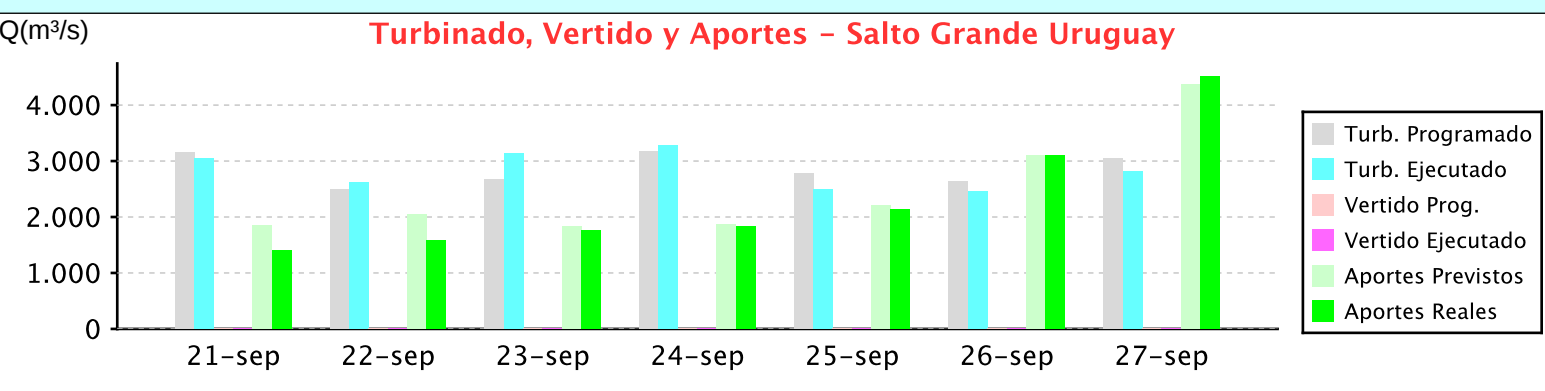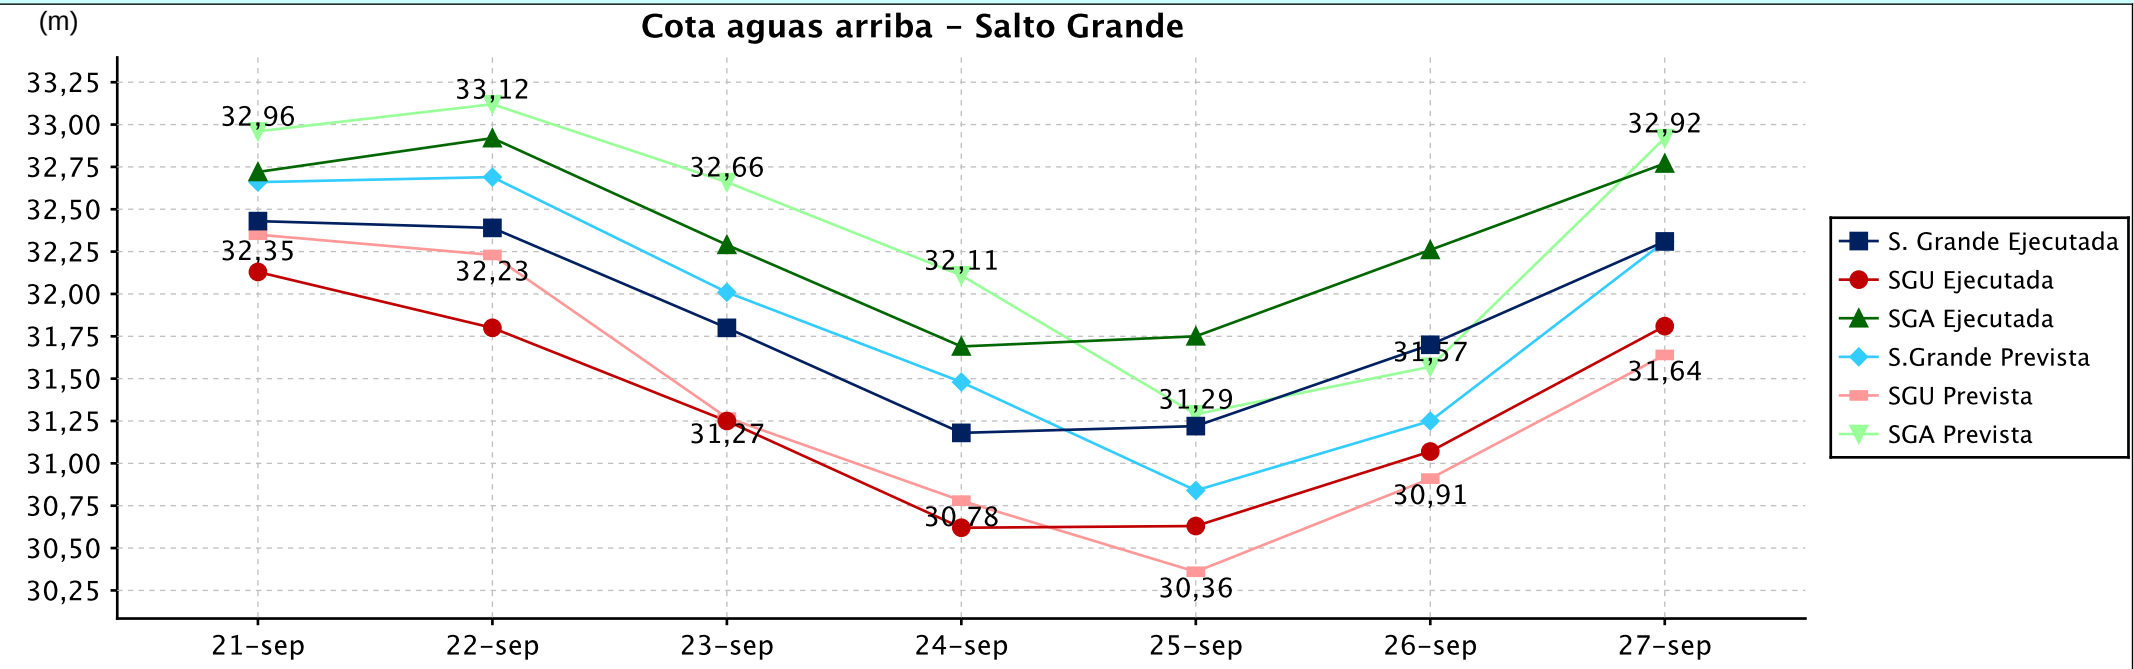

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	31,81
Cota Vista Arg	32,77
Cota real	32,31

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-15.156
------------------------------------	---------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	667	656
Baygorria	723	693
Palmar	1.252	1.274
SGU	3.049	2.822

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.335	1.681
Baygorria	0	666
Palmar	118	854
SGU	4.375	4.518

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
