




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 05 de octubre de 2013


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-97
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	143
APR C	-1
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.379
C. Baygorria	1.953
C. Palmar	7.210
C. Salto Grande	12.498
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.233
TOTAL Generación	26.300

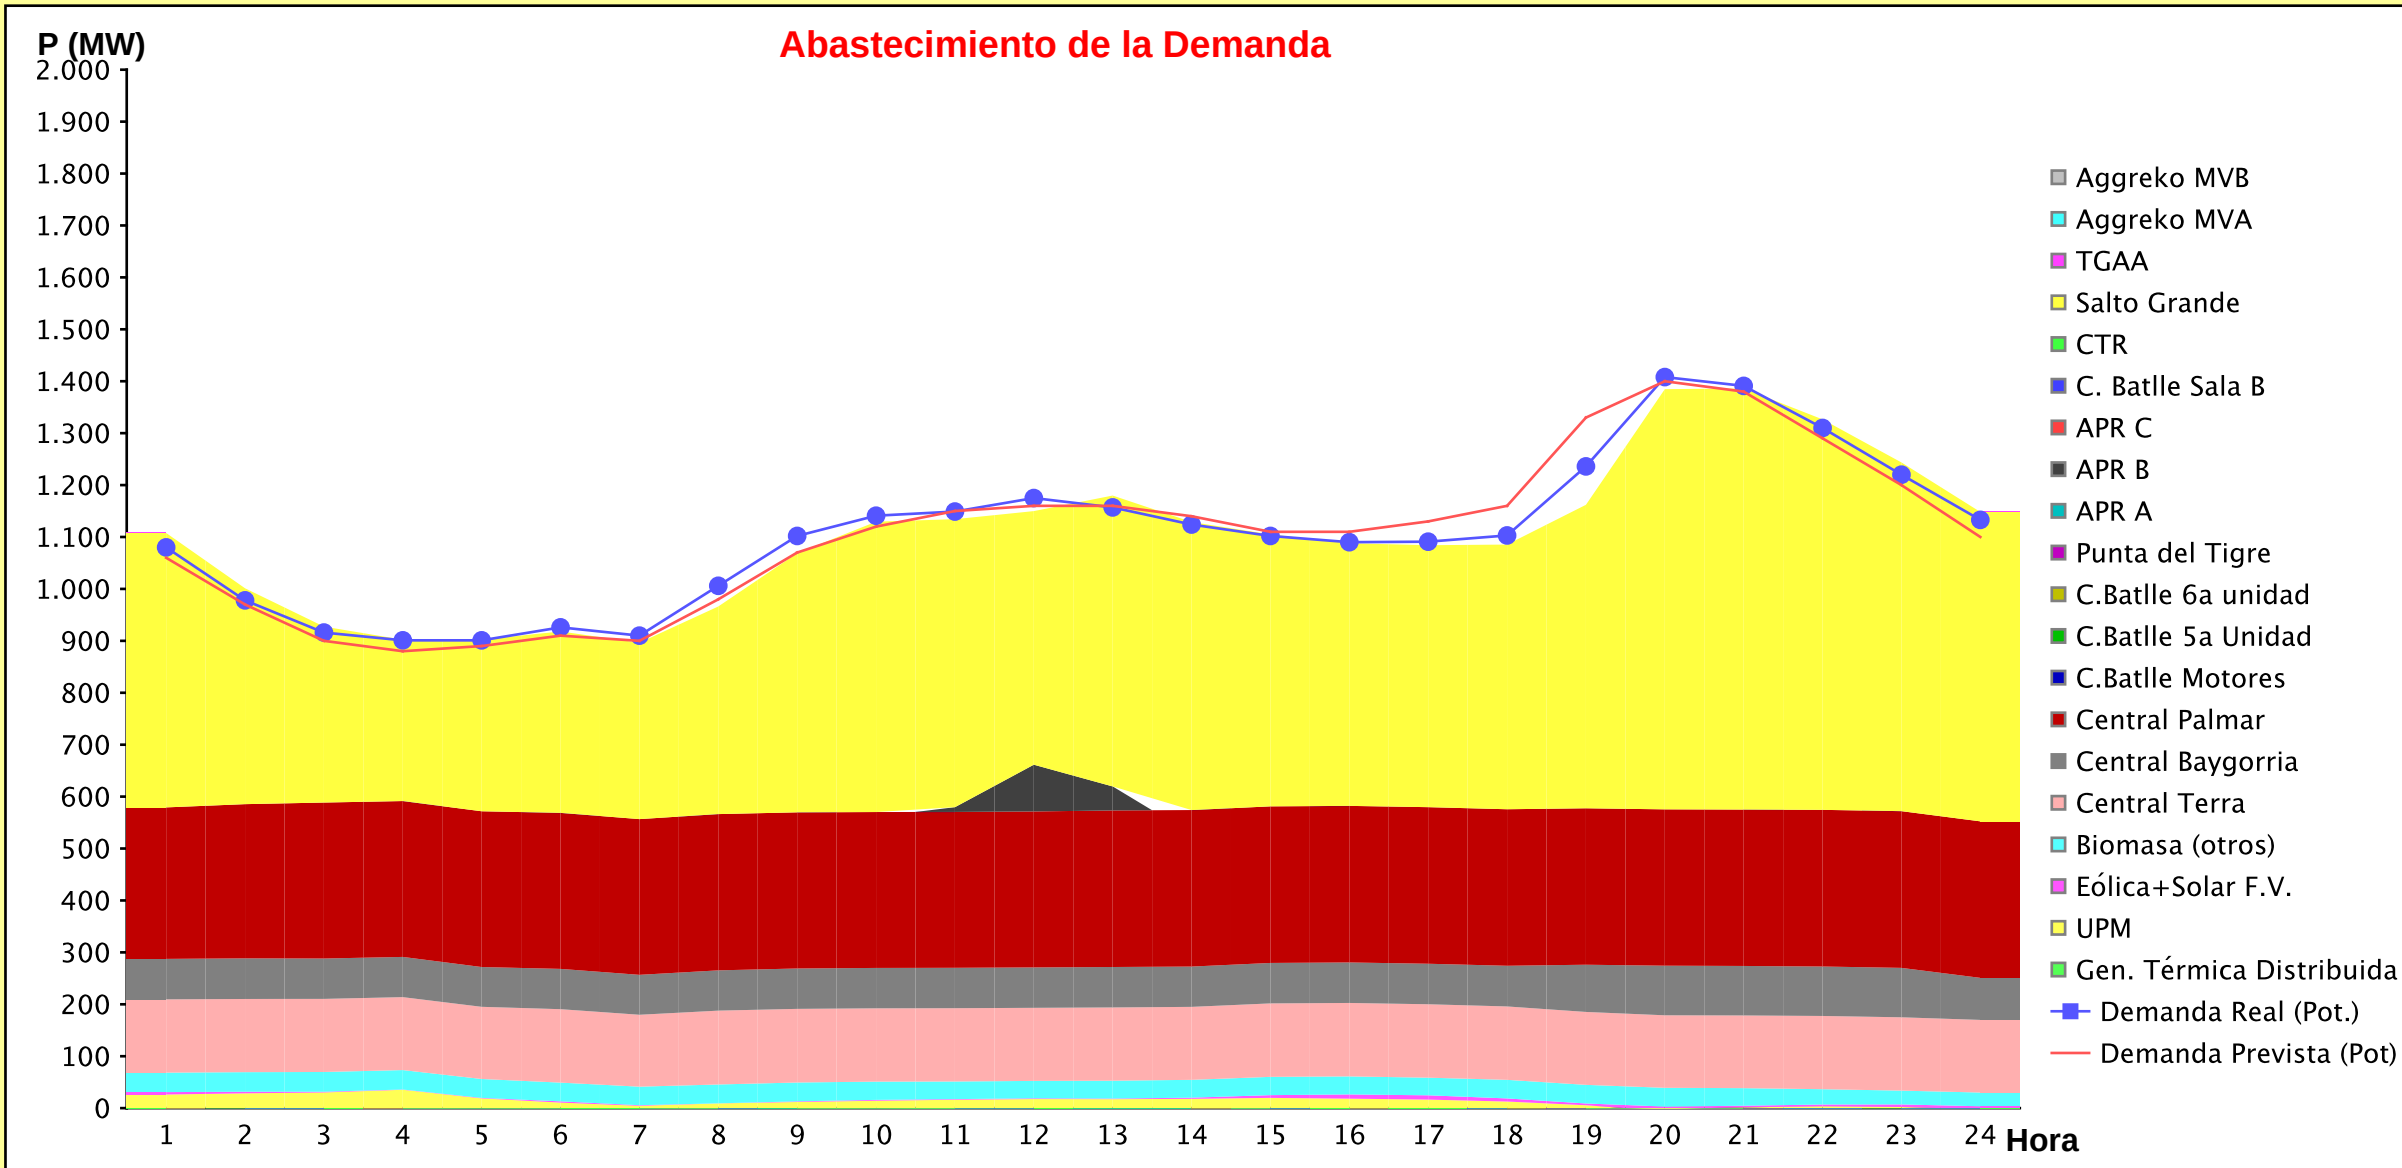

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.300
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	



Demanda Programada (MWh)	26.500
Diferencia (MWh)	-200
Ejecutada - Programada	-0,76 %

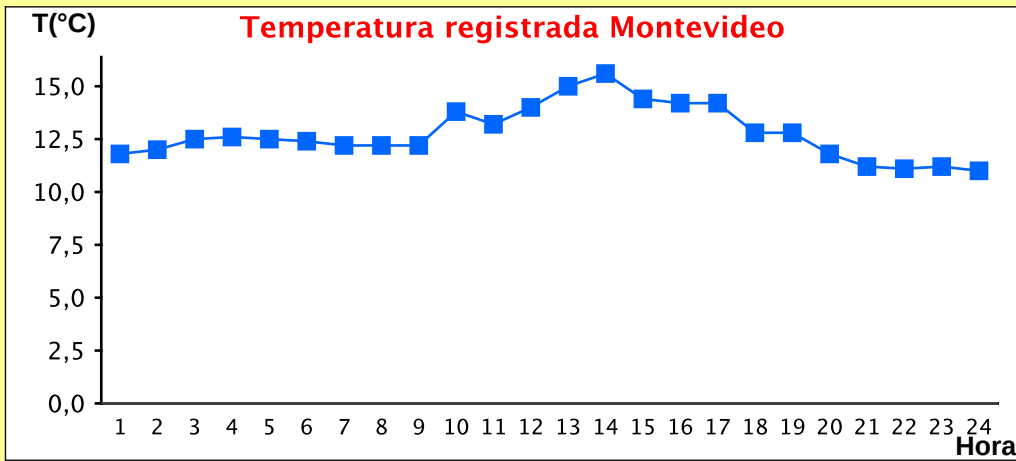


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1181,37 Hora 11:37
Potencia mínima:	887,7 Hora 06:41
Pico noche:	1423,84 Hora 19:48

Generación Media (MW)	
Eólica	3,4
Biomasa	52,1
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

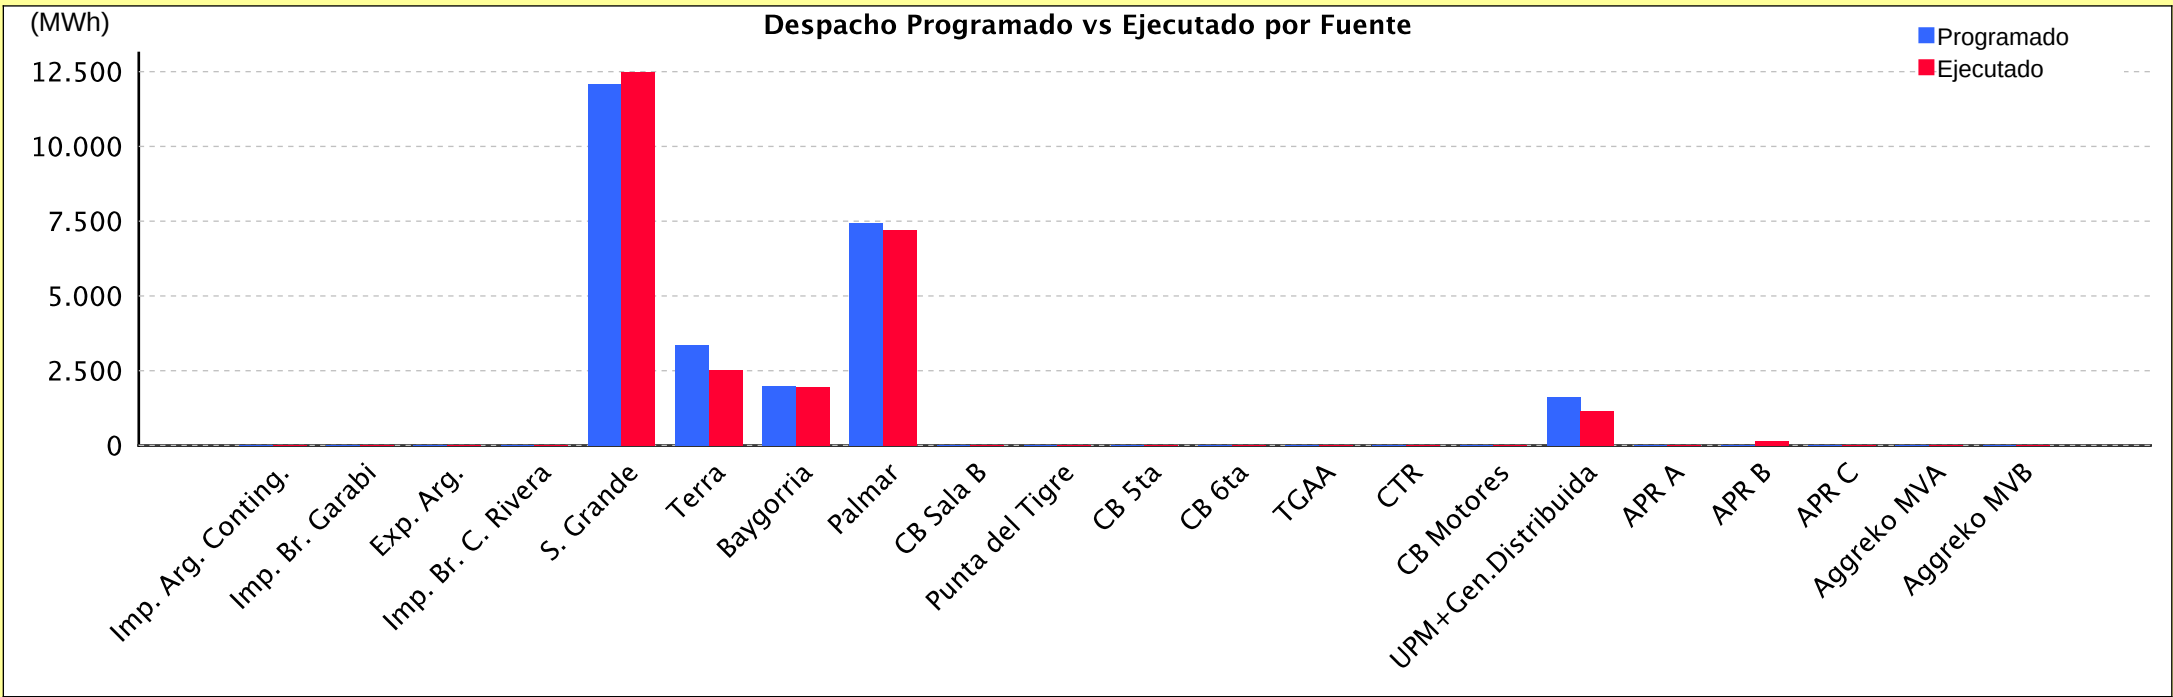
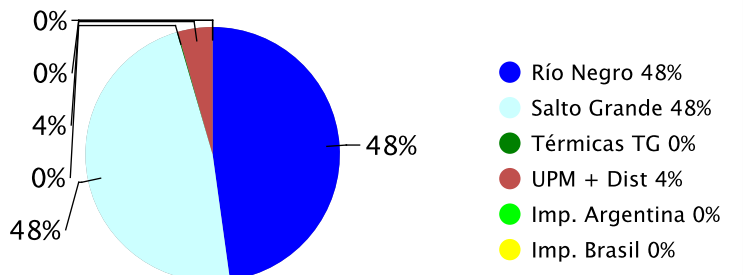


Generación (Demanda + Exportación)

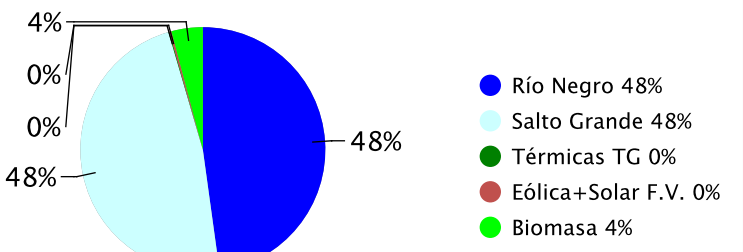



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

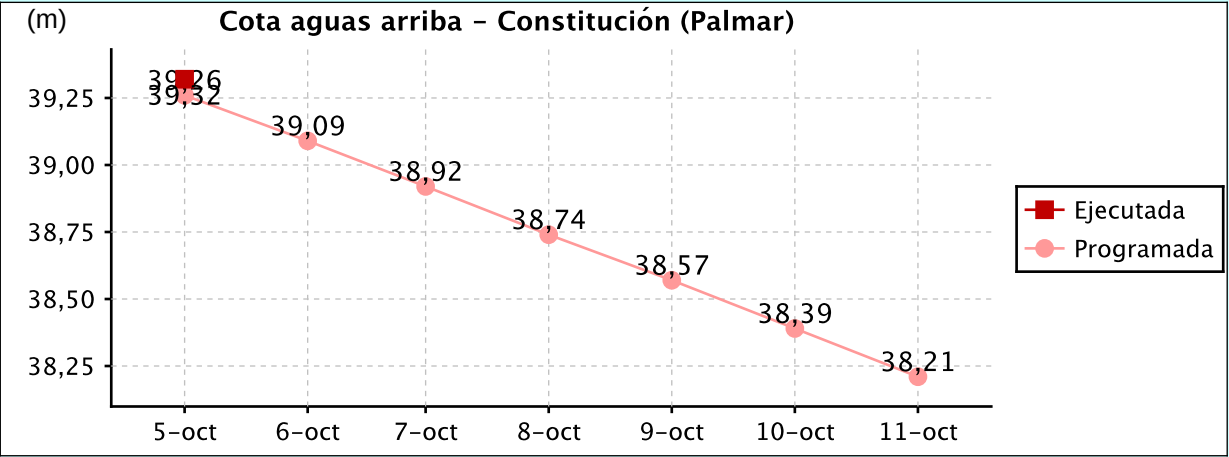
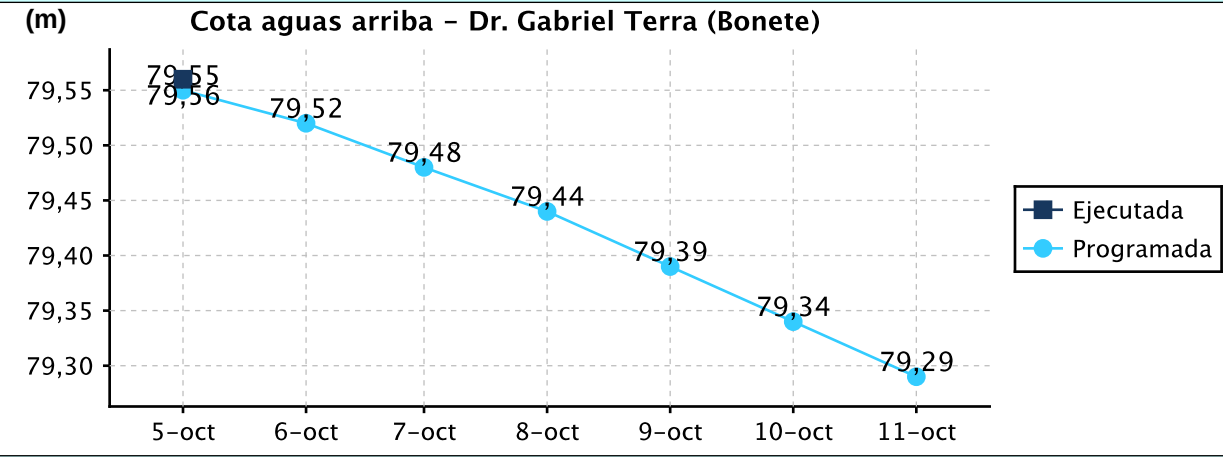


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,55	79,56
Baygorria	53,71	53,75
Palmar	39,26	39,32
SGU	33,71	33,83

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

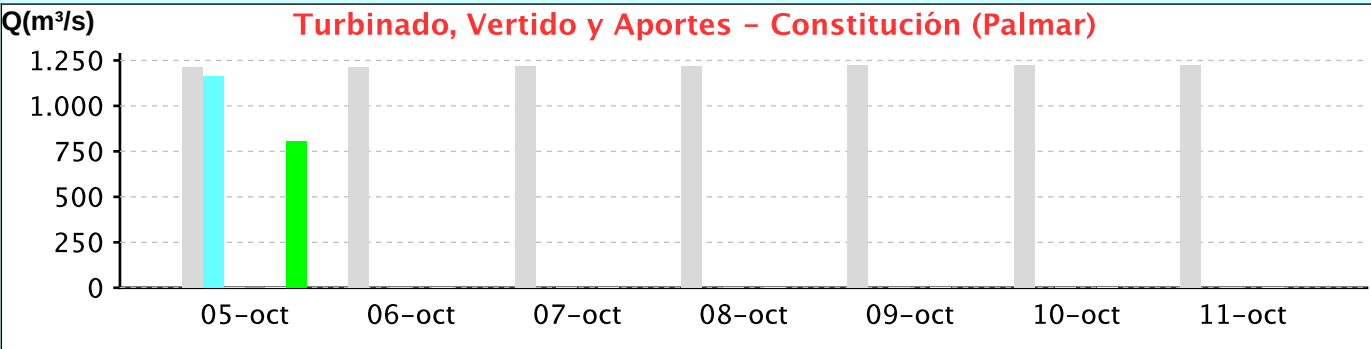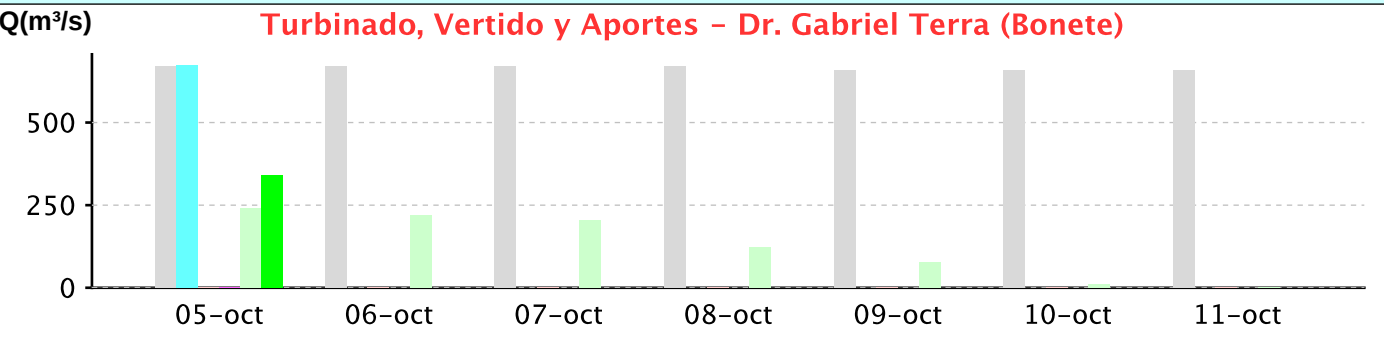

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

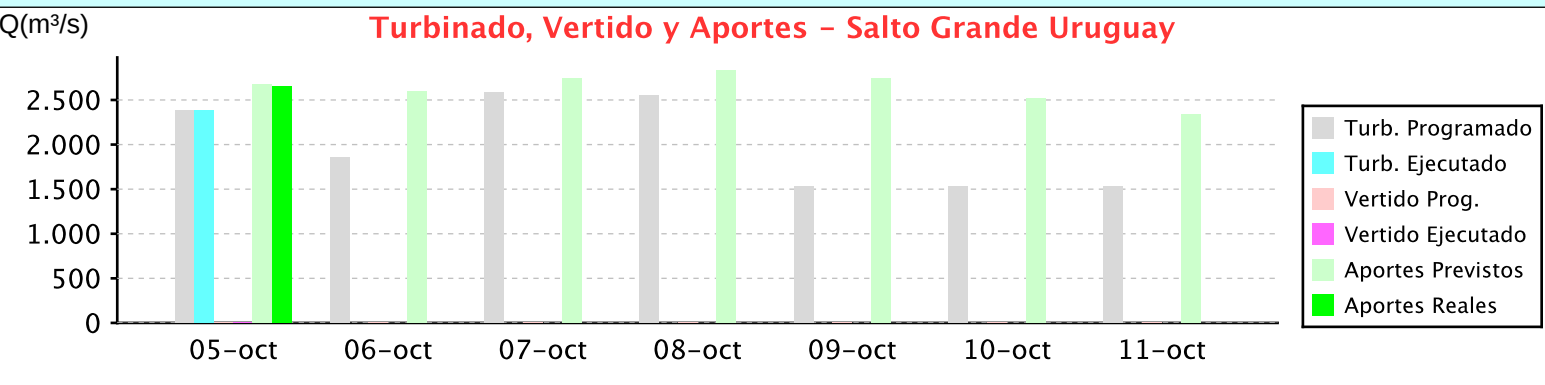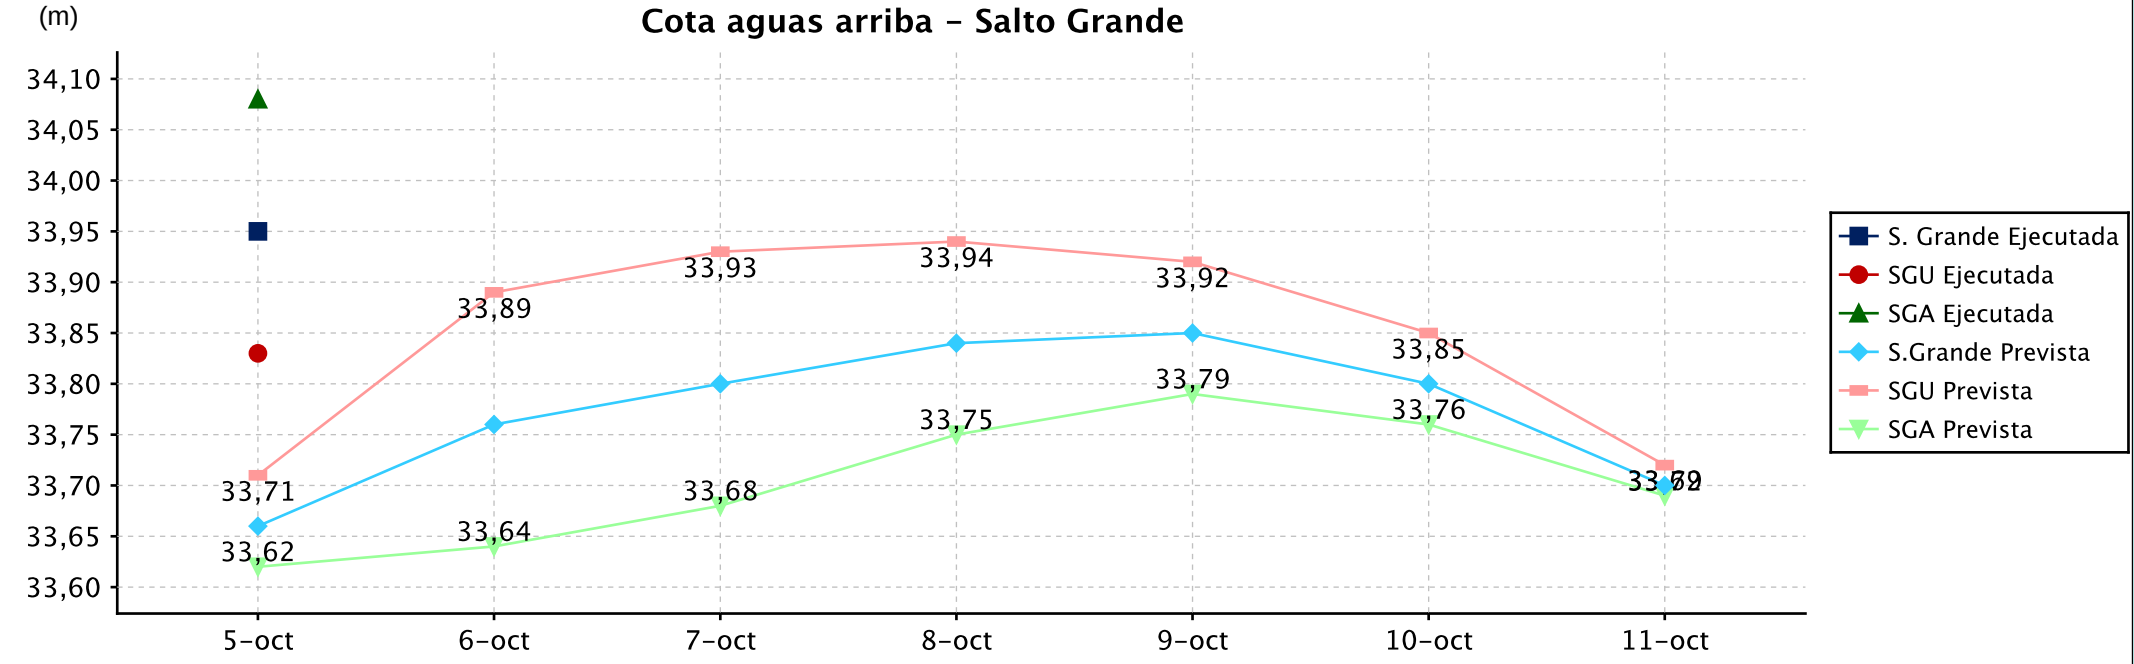

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,83
Cota Vista Arg	34,08
Cota real	33,95
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-5.235

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	670	673
Baygorria	661	0
Palmar	1.213	1.163
SGU	2.386	2.384

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	240	339
Baygorria	0	0
Palmar	0	805
SGU	2.673	2.656

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
