



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



lunes 07 de octubre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-87
Central P. del Tigre	-10
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-1
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.374
C. Baygorria	1.931
C. Palmar	7.359
C. Salto Grande	12.120
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.607
TOTAL Generación	26.283

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.283
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.590
Diferencia (MWh)	-1.307
Ejecutada - Programada	-4,74 %

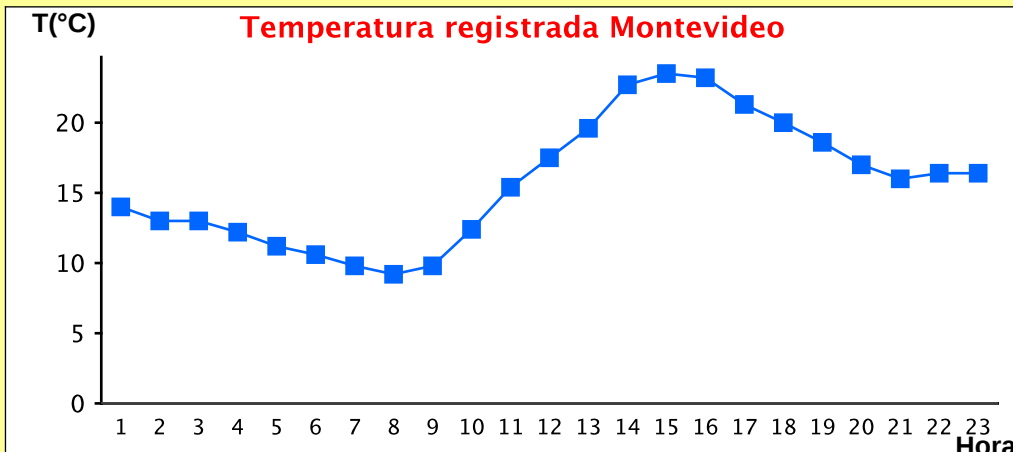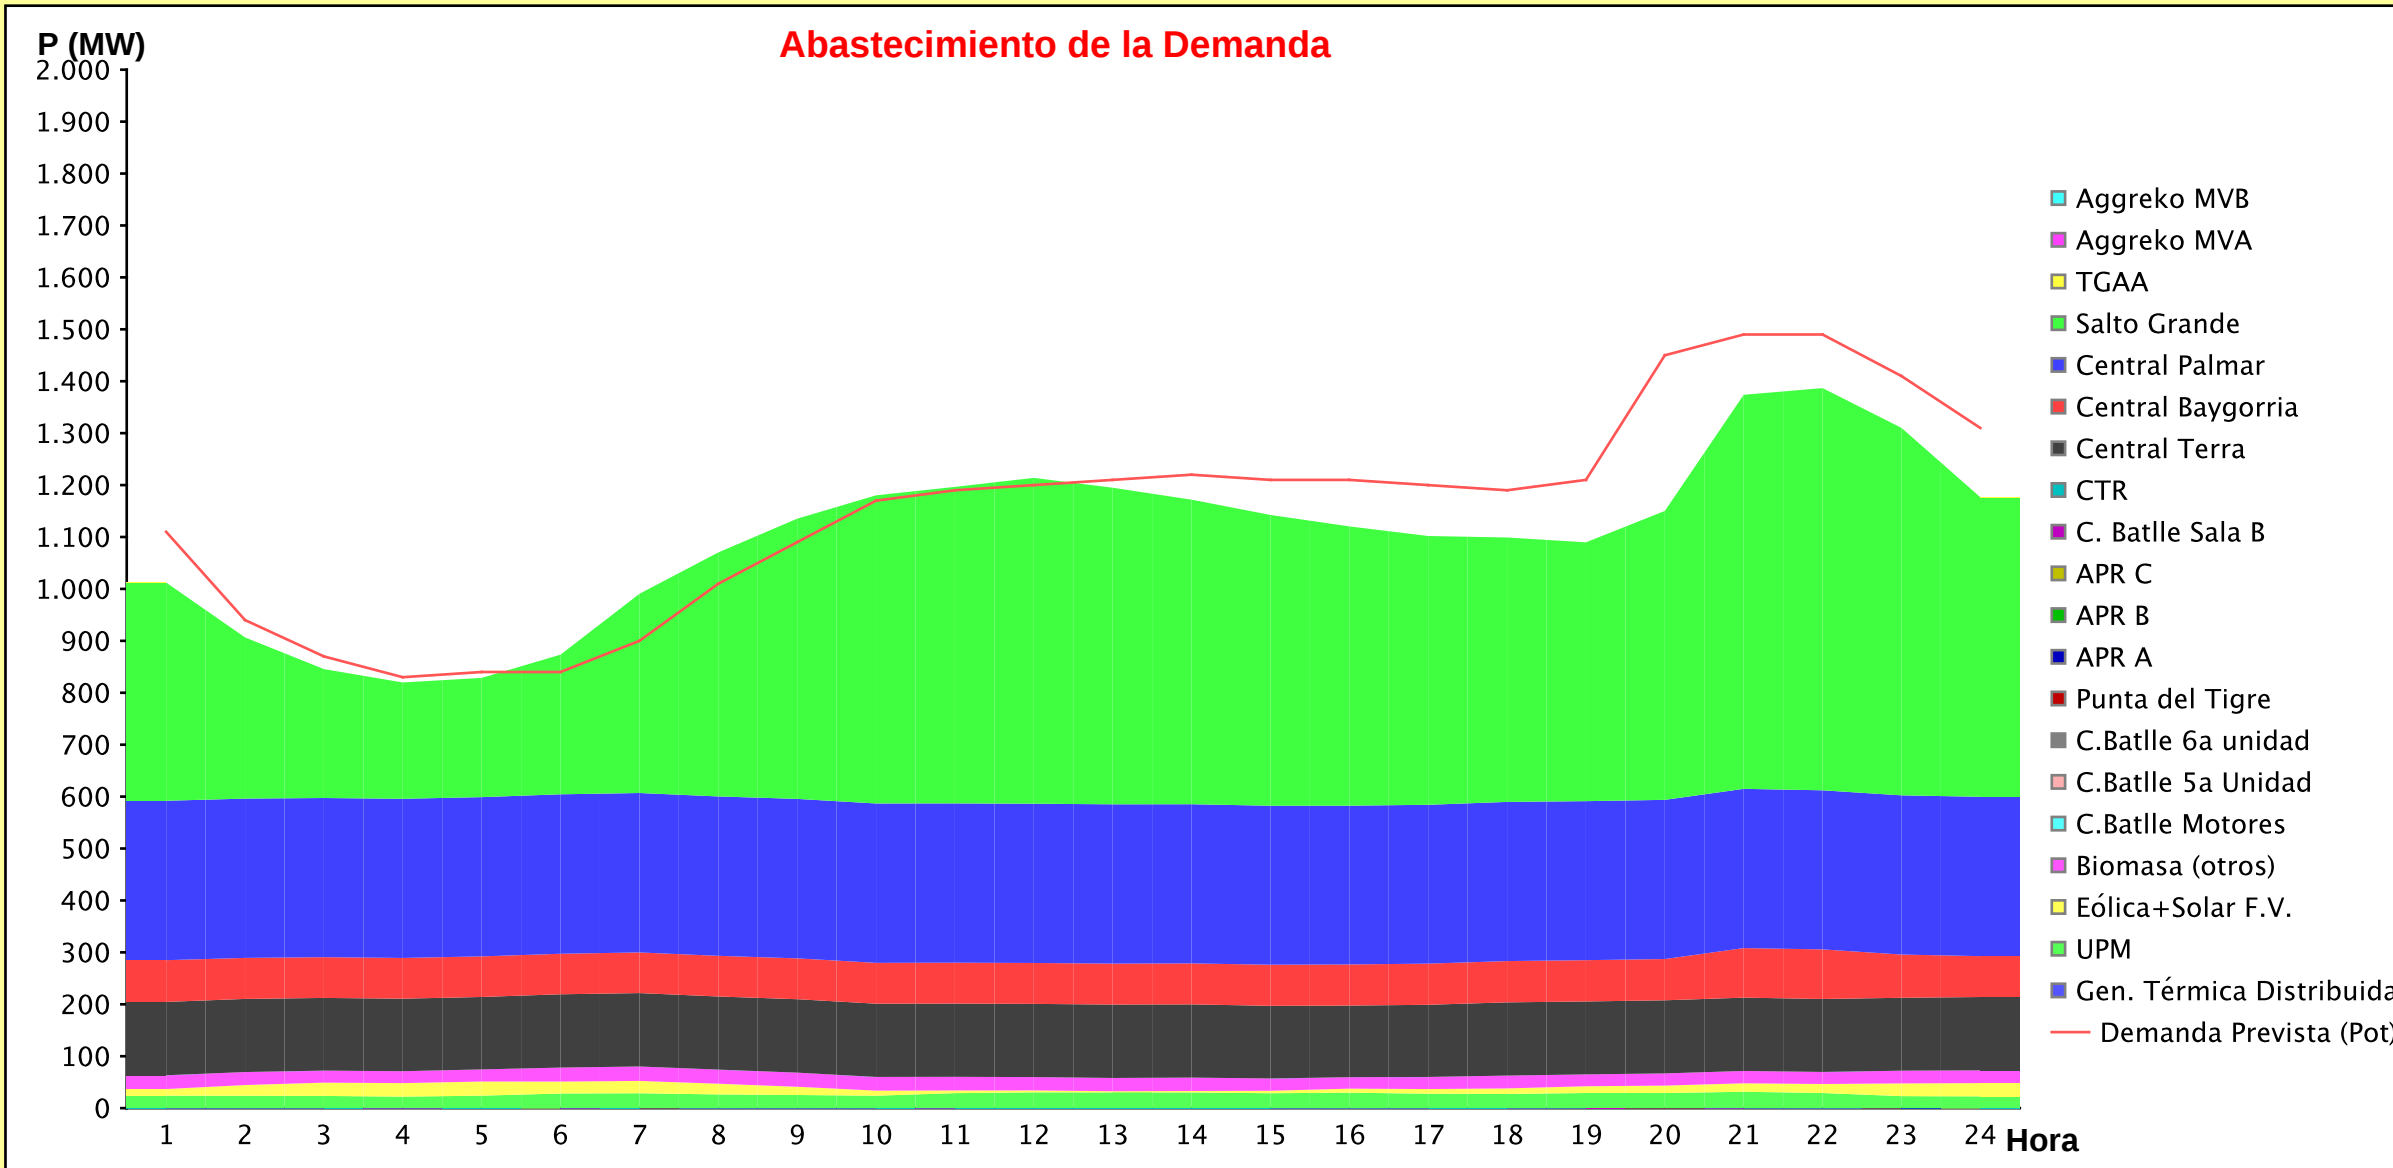



Picos de Potencia (MW)	
Pico noche:	1422
Hora 21:22	

Generación Media (MW)	
Eólica	15,1
Biomasa	55,4
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

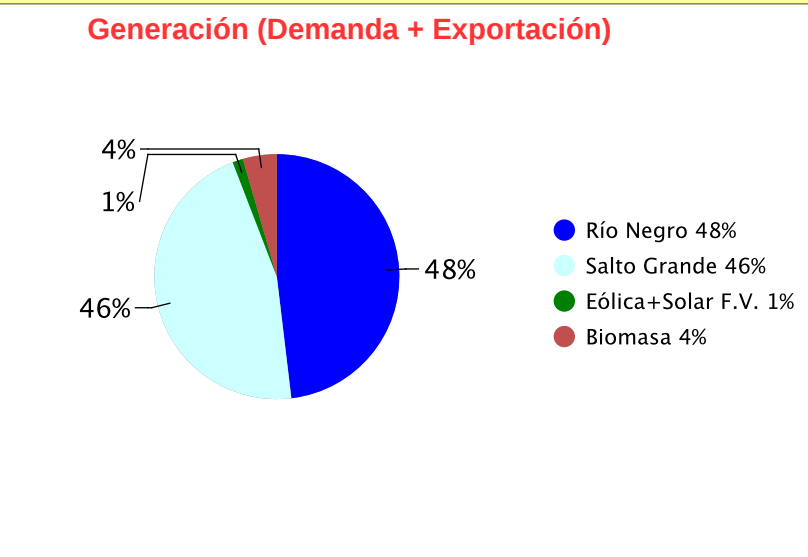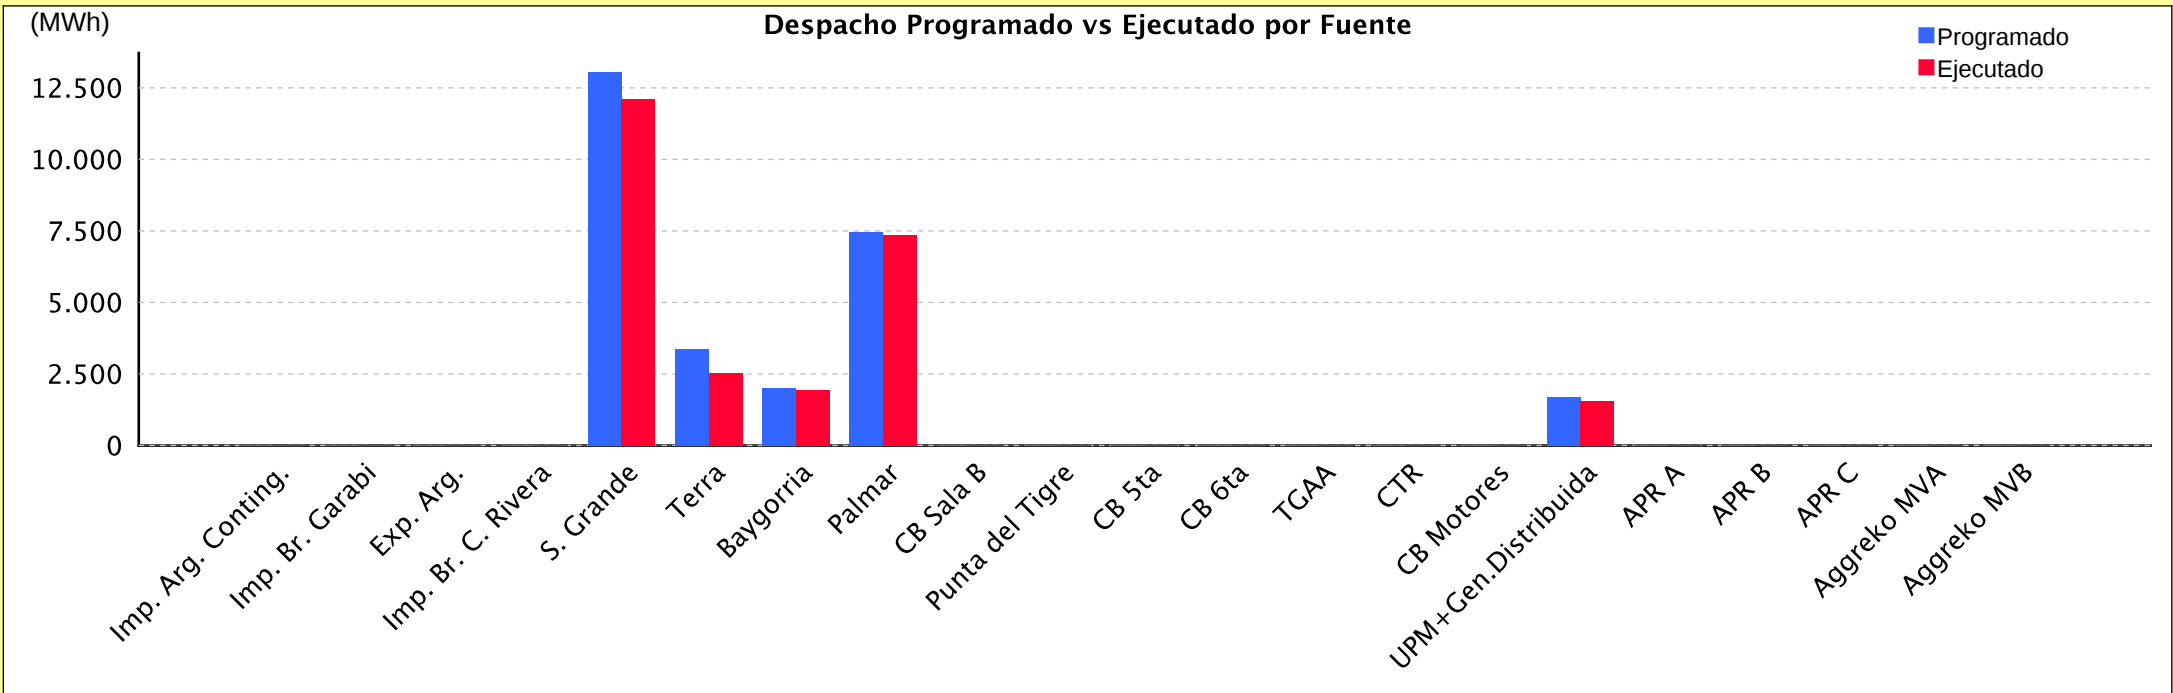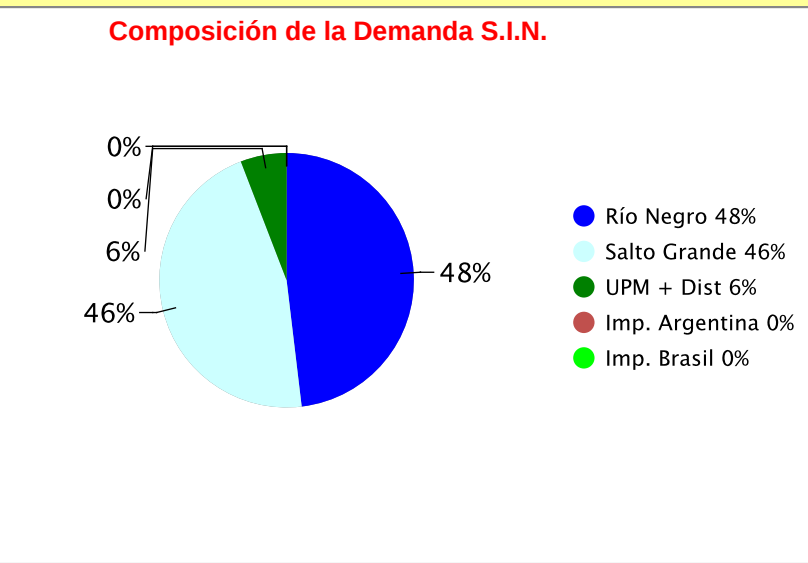



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

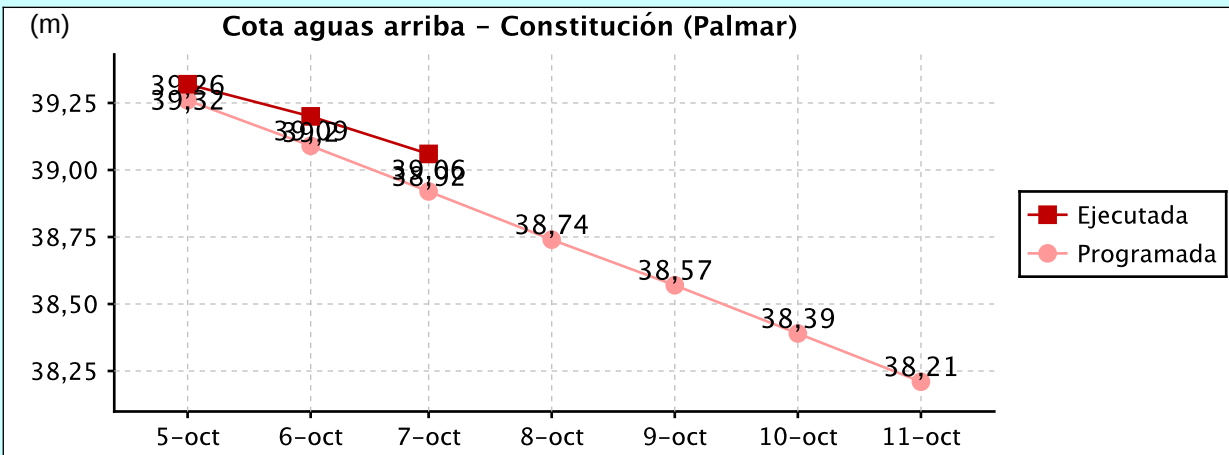
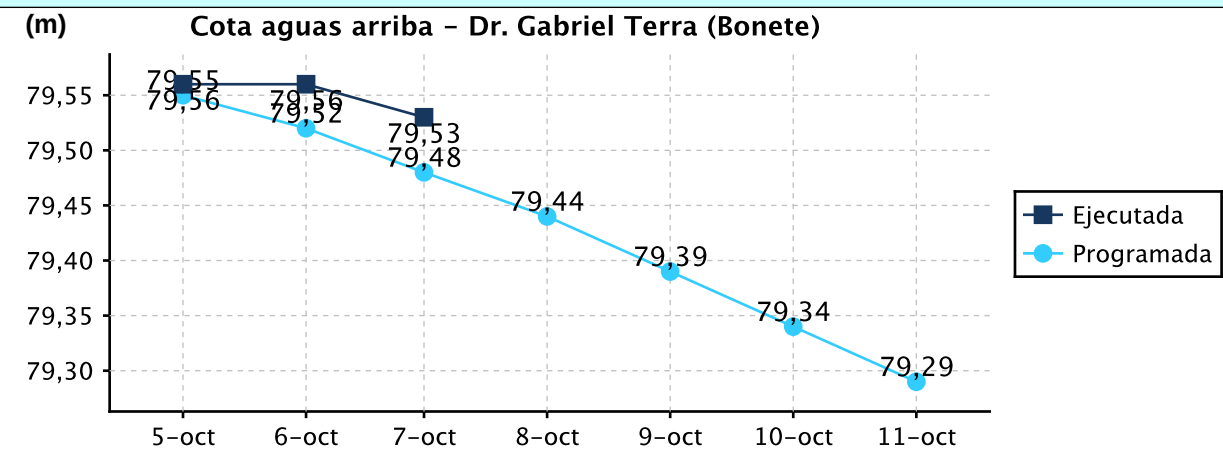


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,48	79,53
Baygorria	53,74	53,77
Palmar	38,92	39,06
SGU	33,93	34,14

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

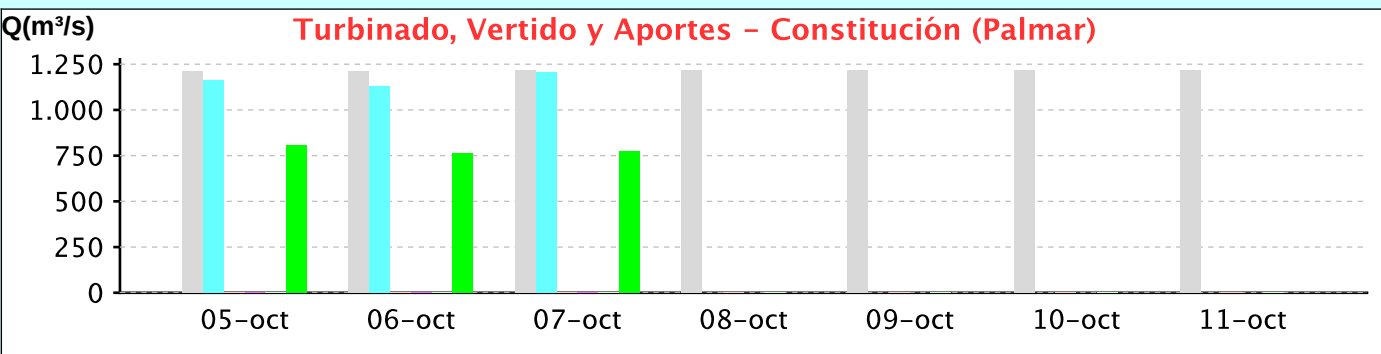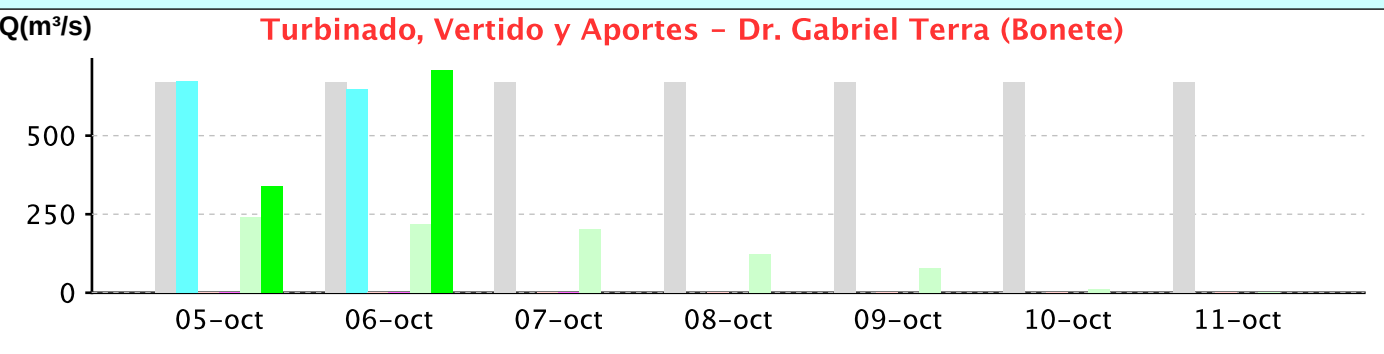

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

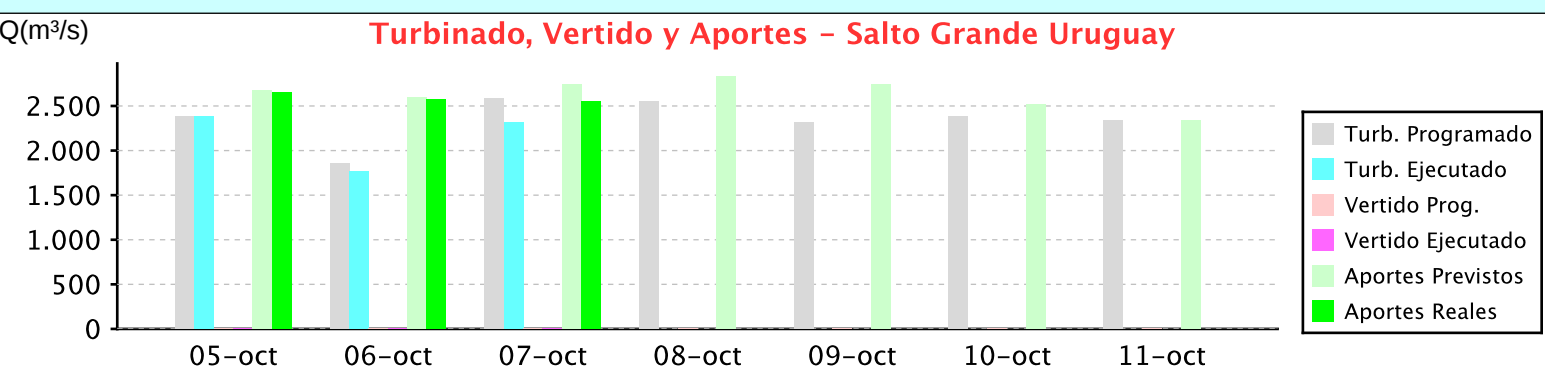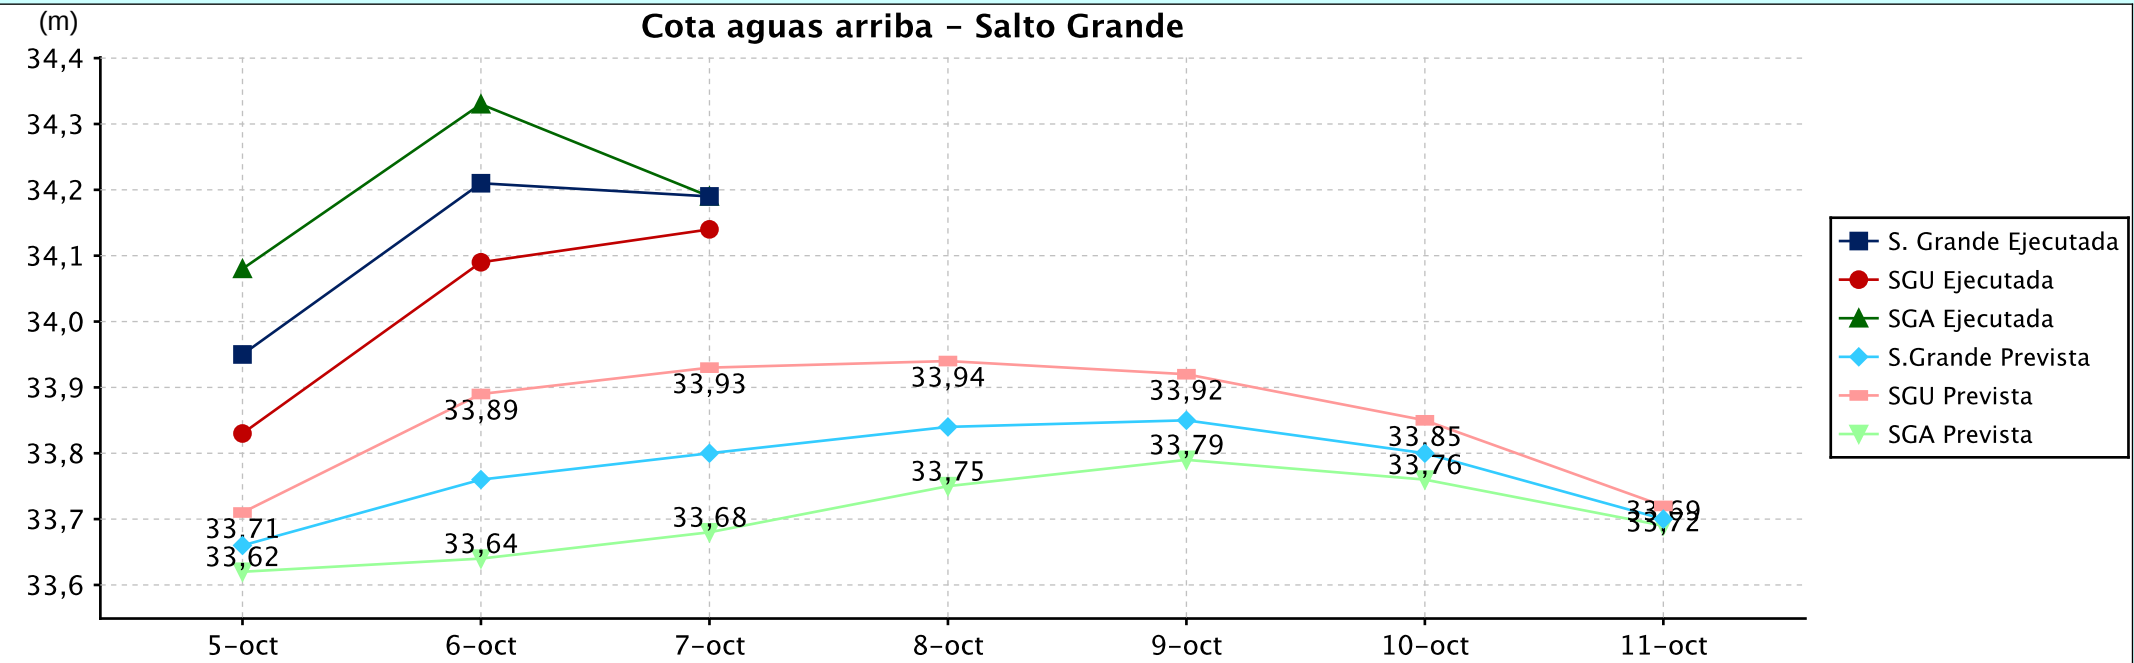

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,14
Cota Vista Arg	34,19
Cota real	34,19
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-1.060

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	670	
Baygorria	661	
Palmar	1.216	1.205
SGU	2.580	2.310

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	203	
Baygorria	0	
Palmar	0	776
SGU	2.742	2.556

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Debido a las medidas gremiales adoptadas en UTE, no se cuenta con la información de: picos de potencia (mínimo y medidía), turbinado ejecutado en Terra y Baygorria, aportes en Terra y Baygorria.
