



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO  
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



miércoles 09 de octubre de 2013

| Generación Térmica    |        |
|-----------------------|--------|
| Central Battle        | -6     |
| Sala B                | -4     |
| 5ta.                  | 0      |
| 6ta.                  | 0      |
| Motores               | -2     |
| Central La Tablada    | -87    |
| Central P. del Tigre  | -10    |
| APR A                 | -2     |
| APR B                 | -3     |
| APR C                 | -1     |
| Aggreko               | -1     |
| Aggreko MVA           | -1     |
| Aggreko MVB           | -0     |
| Central Maldonado     | 0      |
| Generación Hidráulica |        |
| C.G.Terra             | 3.297  |
| C. Baygorria          | 2.024  |
| C. Palmar             | 7.321  |
| C. Salto Grande       | 12.071 |
| Importación (MWh)     |        |
| Argentina             | 0      |
| Contingente           | 0      |
| Brasil                | 0      |
| Rivera                | 0      |
| SADI                  | 0      |
| Otros Generadores     |        |
| UPM+Gen. Distribuida  | 1.817  |
| TOTAL Generación      | 26.420 |

| Exportación (MWh)       |   |
|-------------------------|---|
| Exportación a Arg.      | 0 |
| Hidráulica              | 0 |
| Térmica                 | 0 |
| Exportación a Brasil    | 0 |
| TOTAL Exportación (MWh) | 0 |




|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)                              | 26.420 |
| (en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) |        |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Demanda Programada (MWh) | 26.770  |
| Diferencia (MWh)         | -350    |
| Ejecutada - Programada   | -1,31 % |

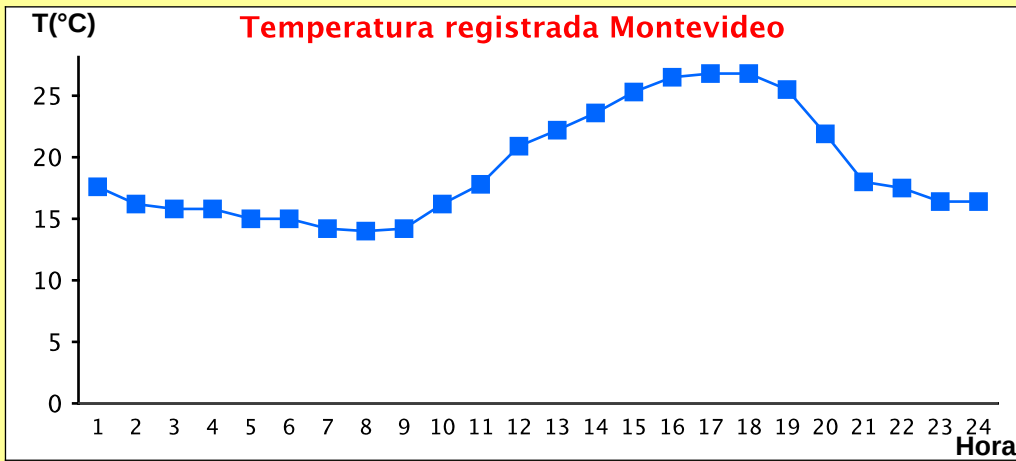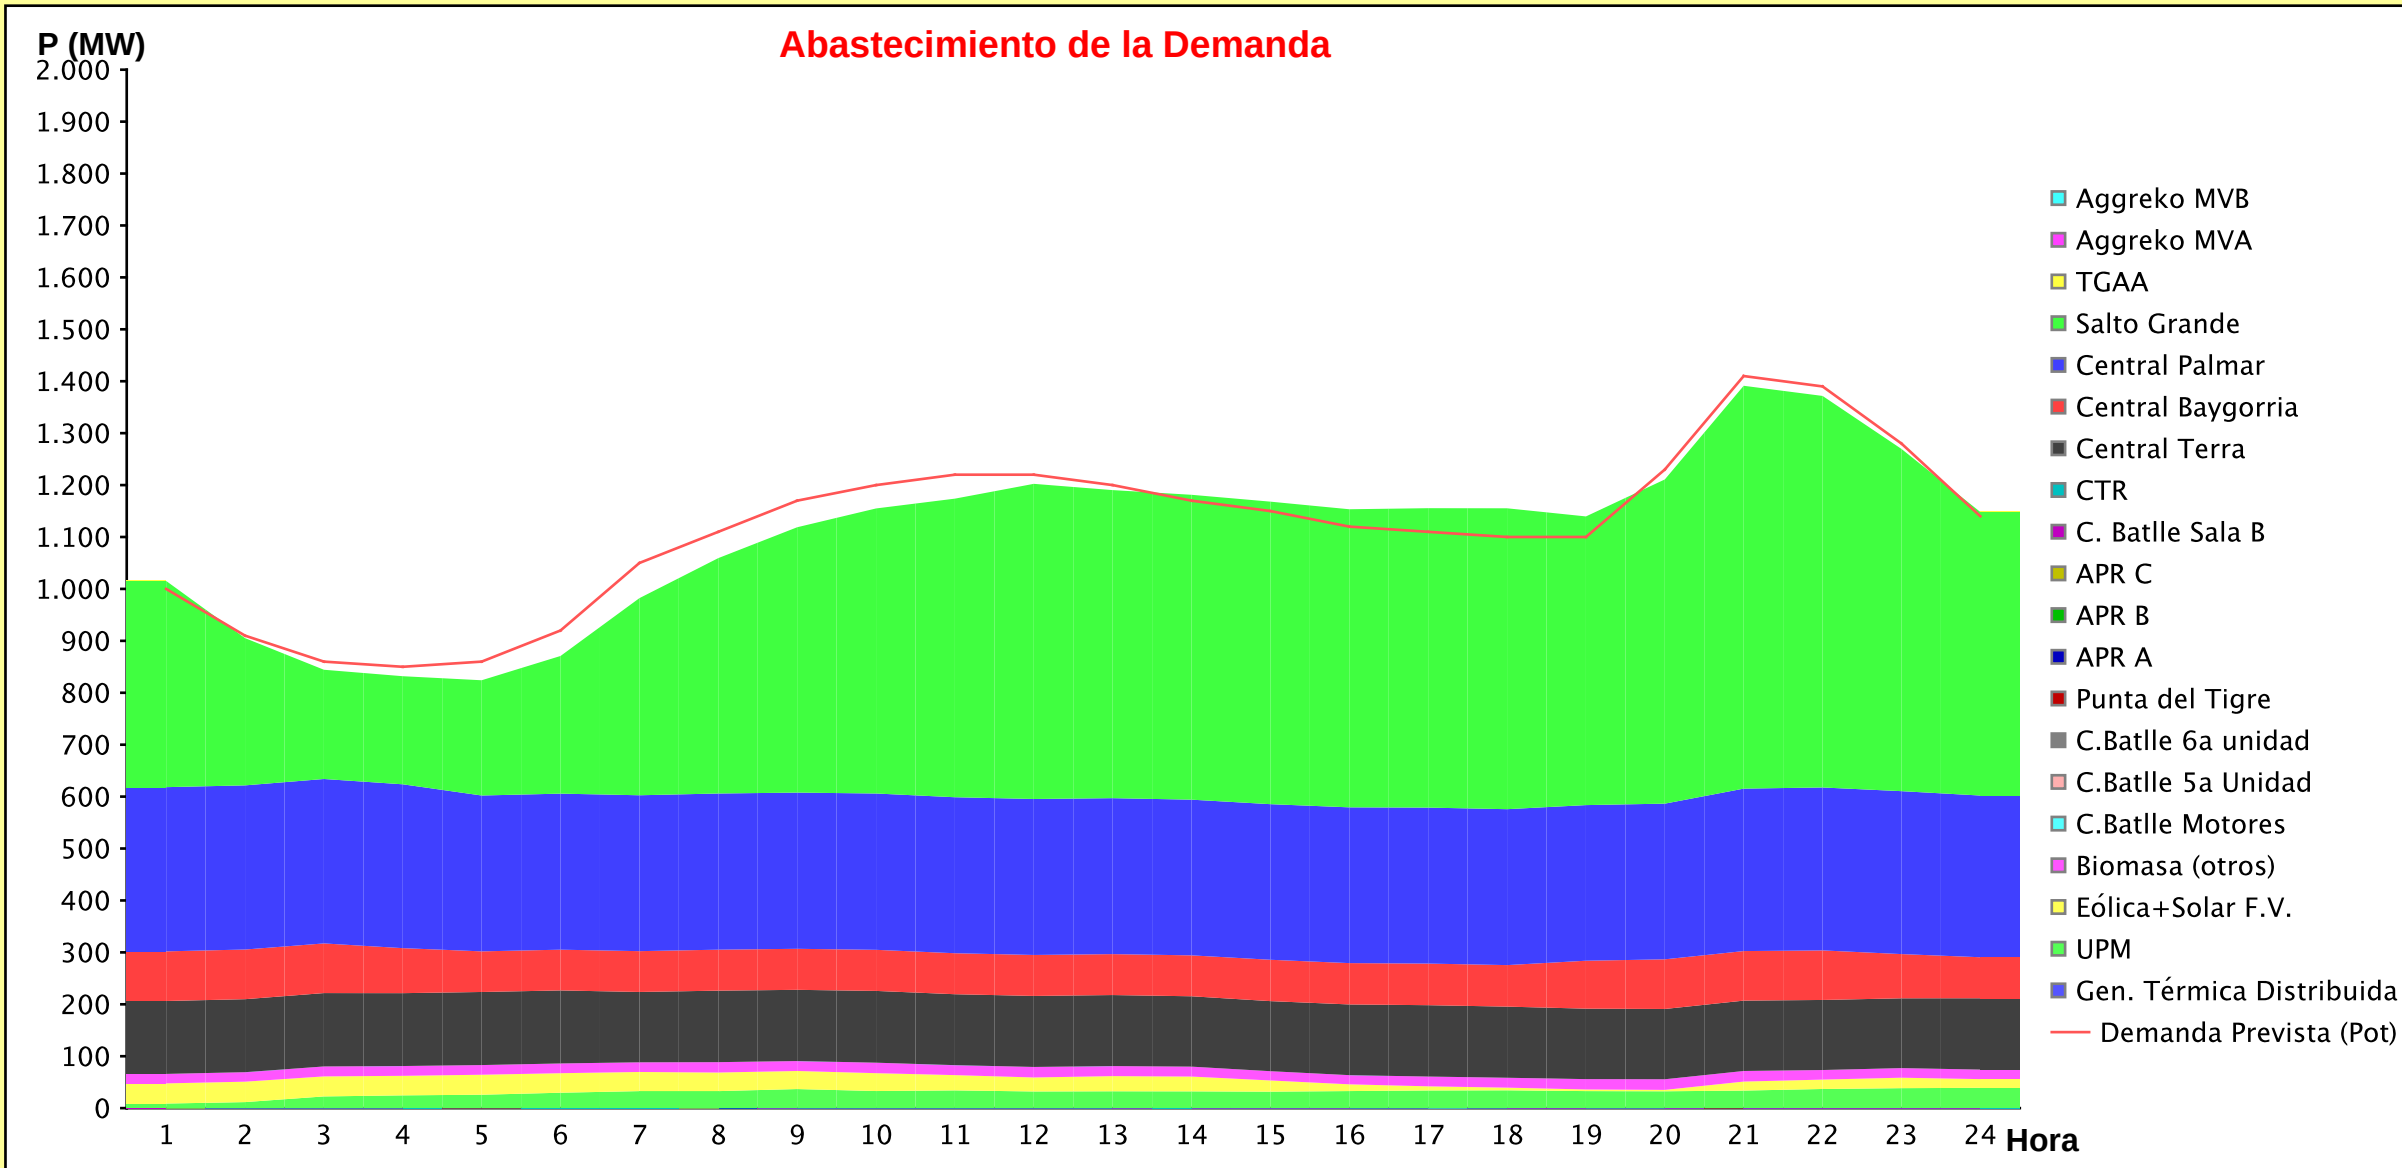



| Picos de Potencia (MW) |      |
|------------------------|------|
| Pico noche:            | 1431 |
| Hora 20:43             |      |

| Generación Media (MW)  |      |
|------------------------|------|
| Eólica                 | 25,5 |
| Biomasa                | 56,1 |
| Solar fotovoltaica     | 0,1  |
| Térmica distribuida    | 0,0  |
| Imp. Brasil Conversora | 0,0  |
| Imp. Argentina         | 0,0  |

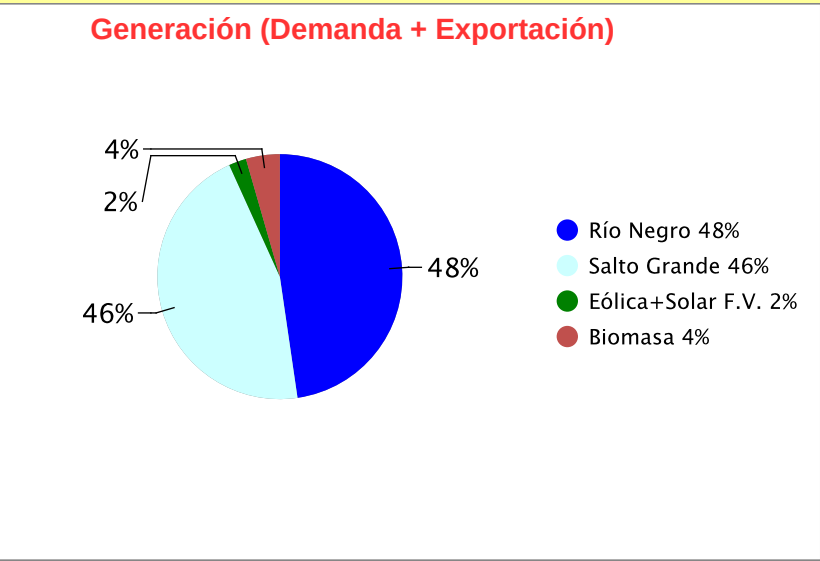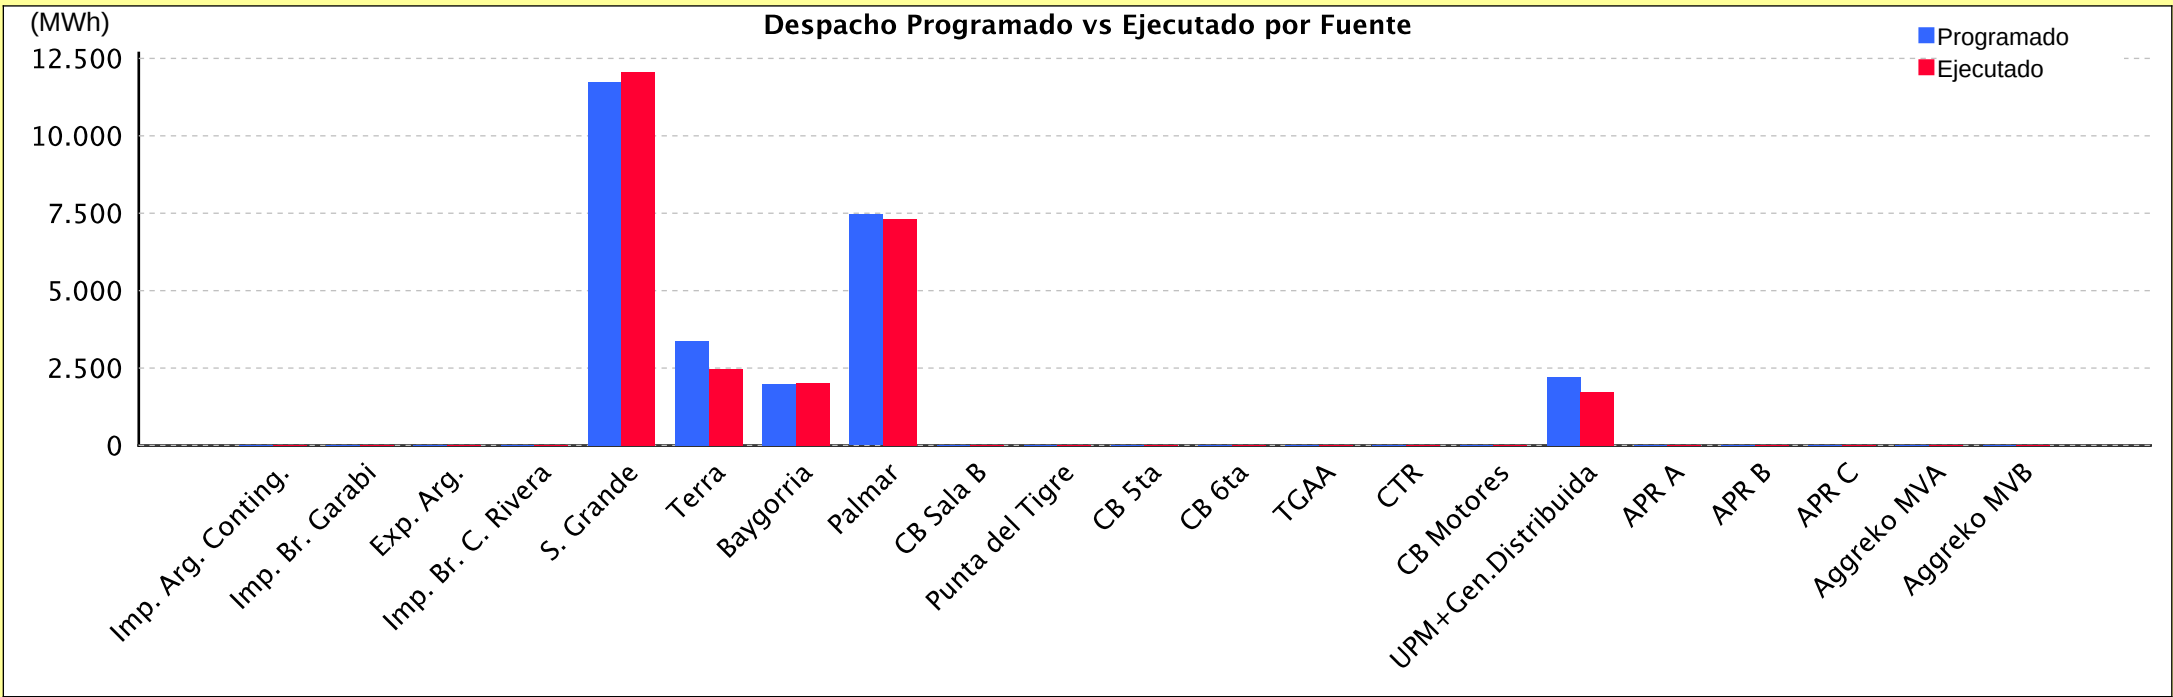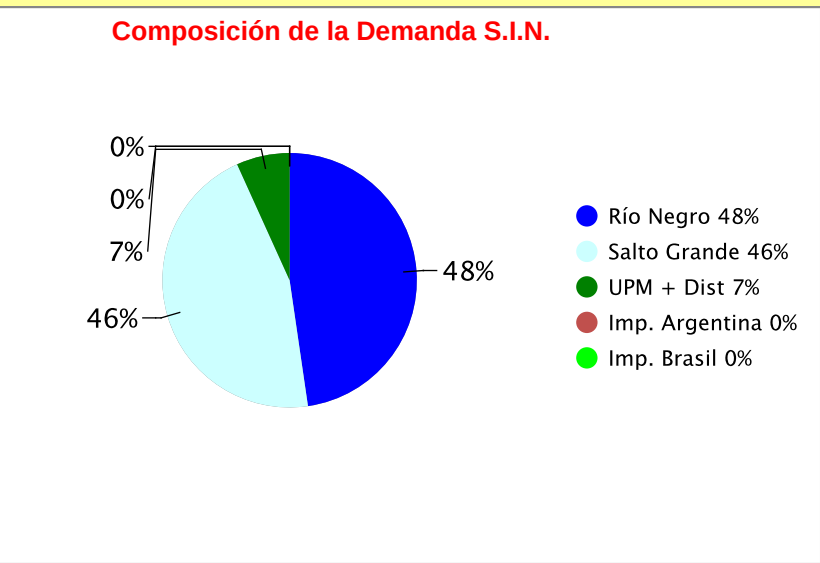



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

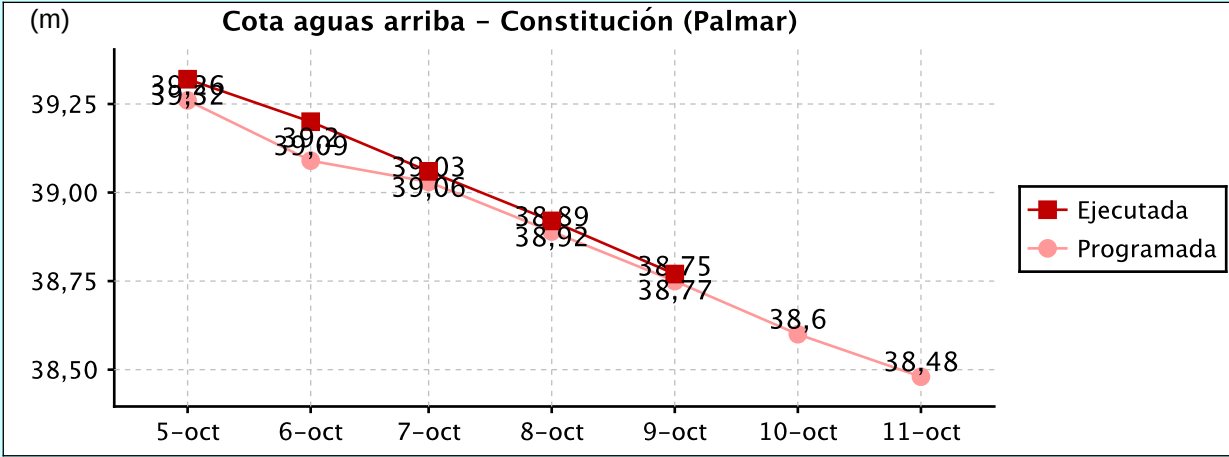
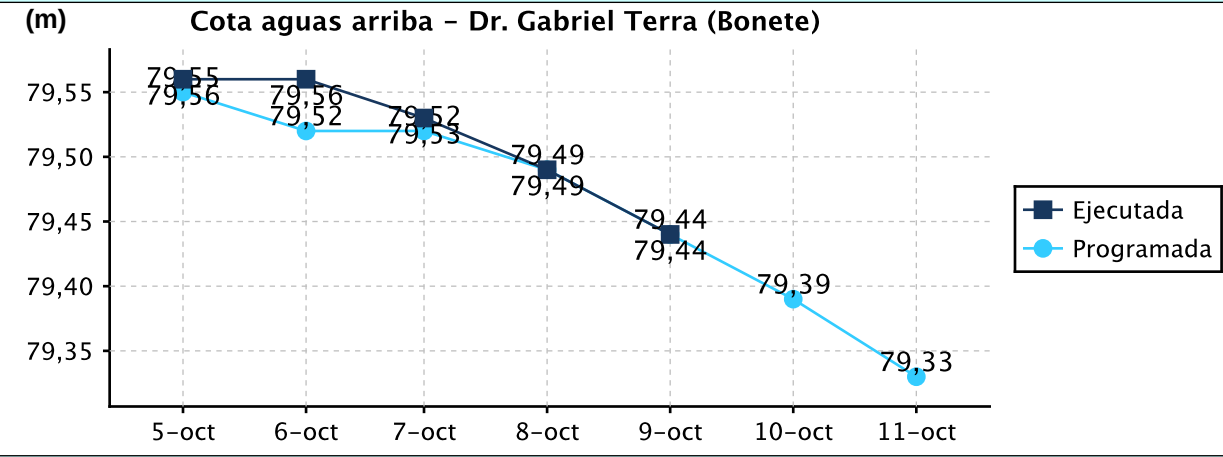


| COTA FINAL | Prevista | Ejecutada |
|------------|----------|-----------|
| Represa    | (m)      | (m)       |
| Terra      | 79,44    | 79,44     |
| Baygorria  | 53,83    | 53,78     |
| Palmar     | 38,75    | 38,77     |
| SGU        | 34,15    | 34,15     |

| Valores de Referencia (operación normal) |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| Represa                                  | Cota Min m | Cota Max m |
| Terra                                    | 70         | 80,7       |
| Baygorria                                | 53         | 54,5       |
| Palmar                                   | 36         | 40         |
| Salto Grande                             | 30         | 35         |

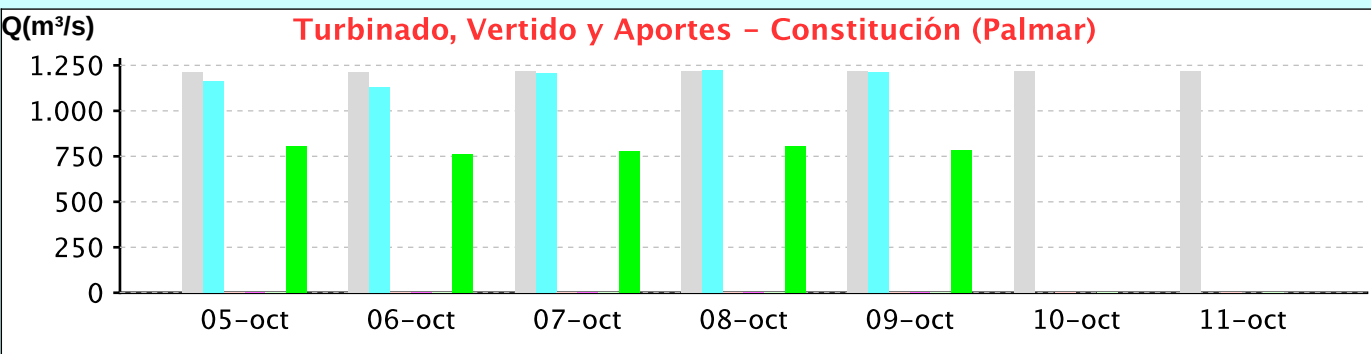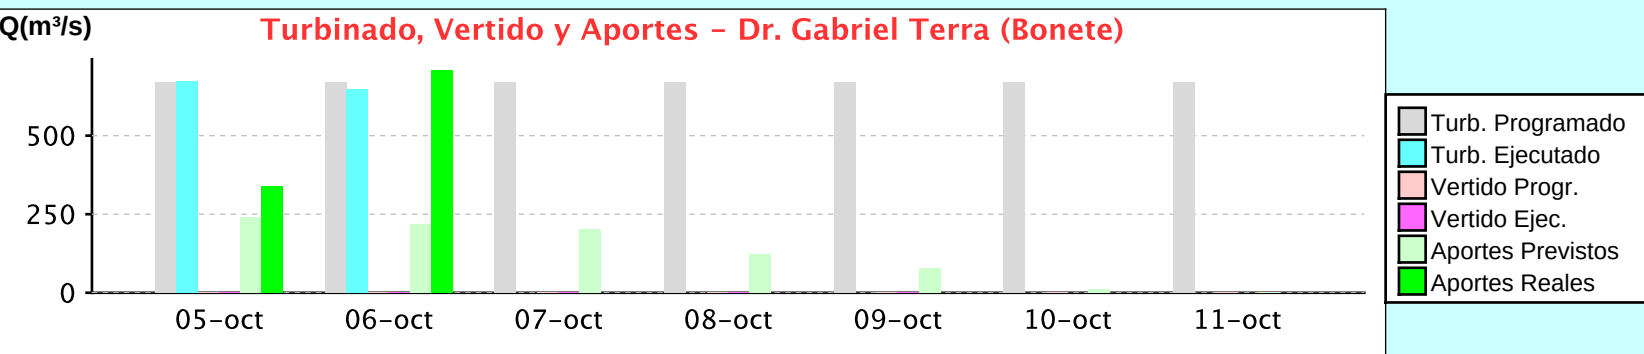

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

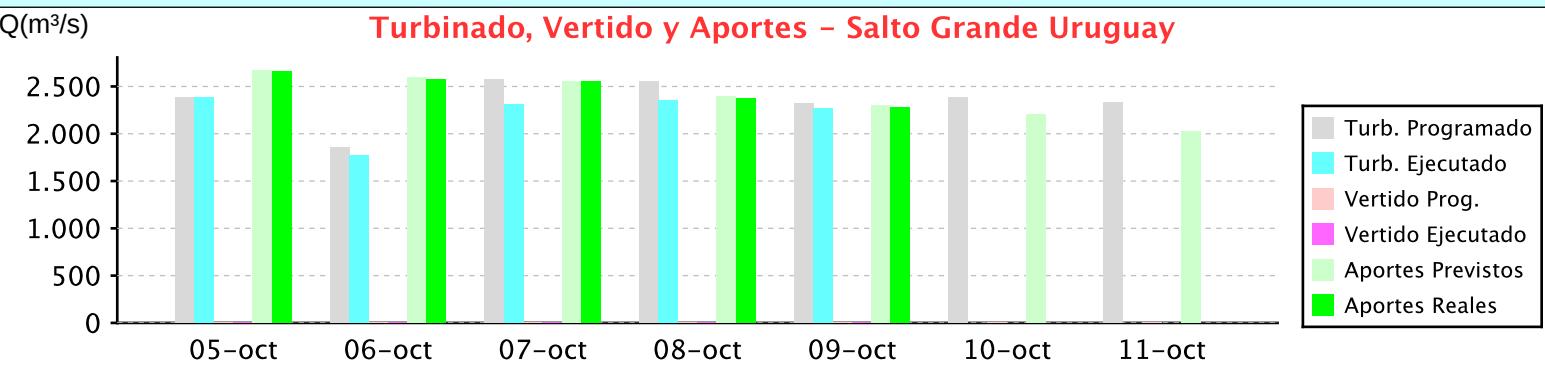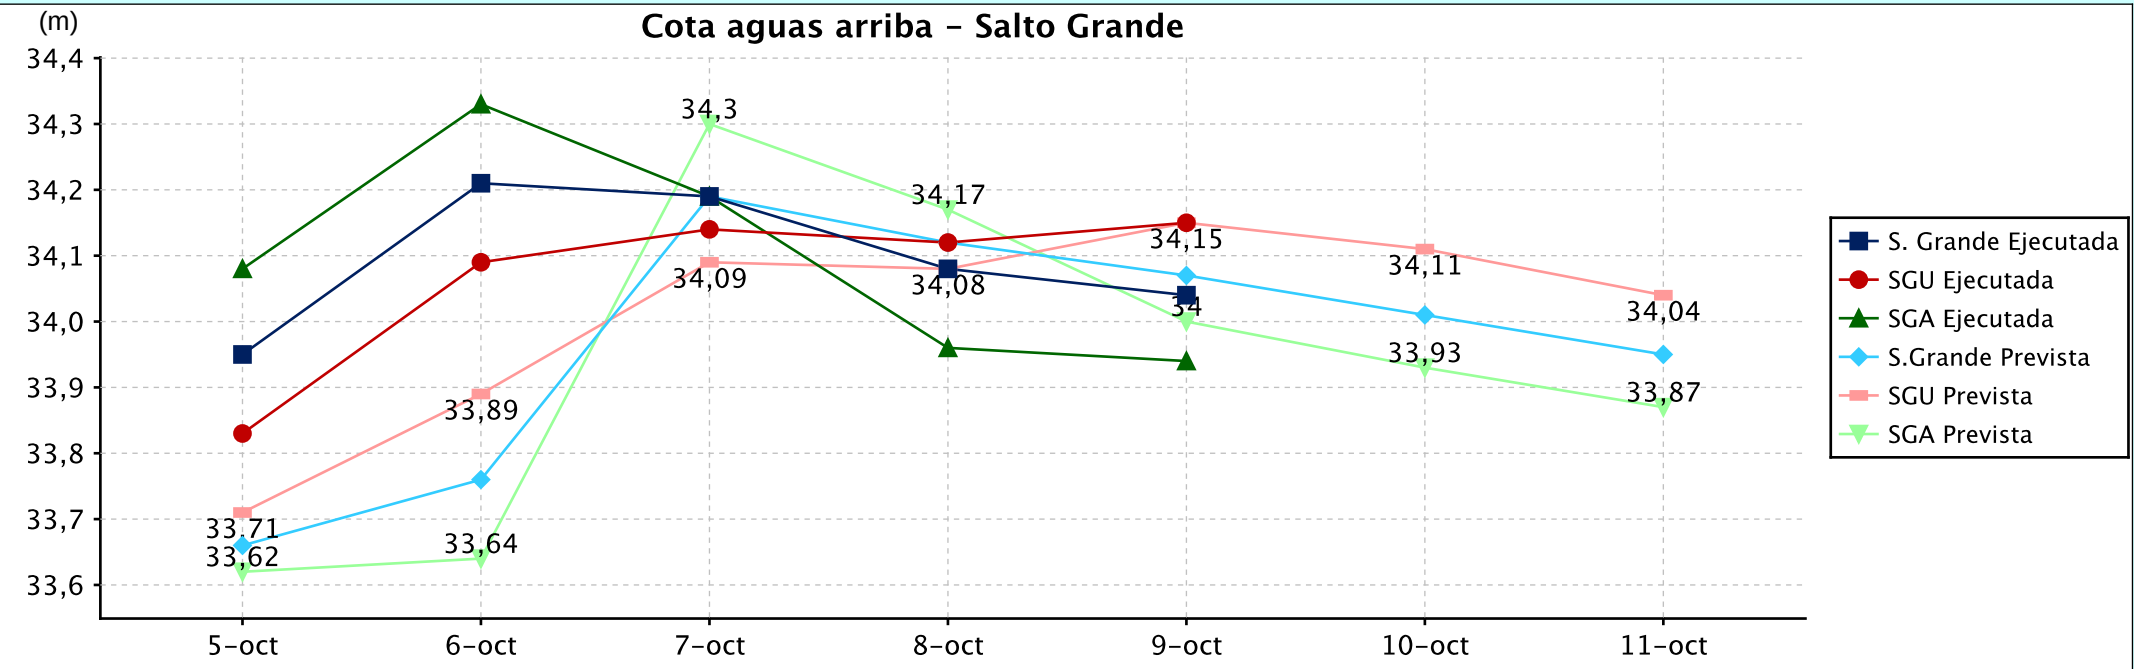

| VALORES CTM                        |       |
|------------------------------------|-------|
| Cotas                              | (m)   |
| Cota Vista Uru                     | 34,15 |
| Cota Vista Arg                     | 33,94 |
| Cota real                          | 34,04 |
| Dif. Energ. (U-A)<br>Acumulado MWh | 4.371 |

| TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
|-----------|----------|-----------|
| Represa   | (m³/s)   | (m³/s)    |
| Terra     | 670      |           |
| Baygorria | 661      |           |
| Palmar    | 1.216    | 1.211     |
| SGU       | 2.320    | 2.269     |

| APORTES   | Previstos | Reales |
|-----------|-----------|--------|
| Represa   | (m³/s)    | (m³/s) |
| Terra     | 77        |        |
| Baygorria | 0         |        |
| Palmar    | 0         | 781    |
| SGU       | 2.300     | 2.274  |

| VERTIDO   | Previsto | Ejecutado |
|-----------|----------|-----------|
| Represa   | (m³/s)   | (m³/s)    |
| Terra     | 0        | 0         |
| Baygorria | 0        | 0         |
| Palmar    | 0        | 0         |
| SGU       | 0        | 0         |

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Debido a las medidas gremiales adoptadas en UTE, no se cuenta con la información de: picos de potencia (mínimo y medidía), turbinado ejecutado en Terra y Baygorria, aportes en Terra y Baygorria 26.770 16
