



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



jueves 10 de octubre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-86
Central P. del Tigre	-10
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-3
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.261
C. Baygorria	2.135
C. Palmar	7.328
C. Salto Grande	12.195
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.748
TOTAL Generación	26.558

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.558
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.700
Diferencia (MWh)	-142
Ejecutada - Programada	-0,53 %

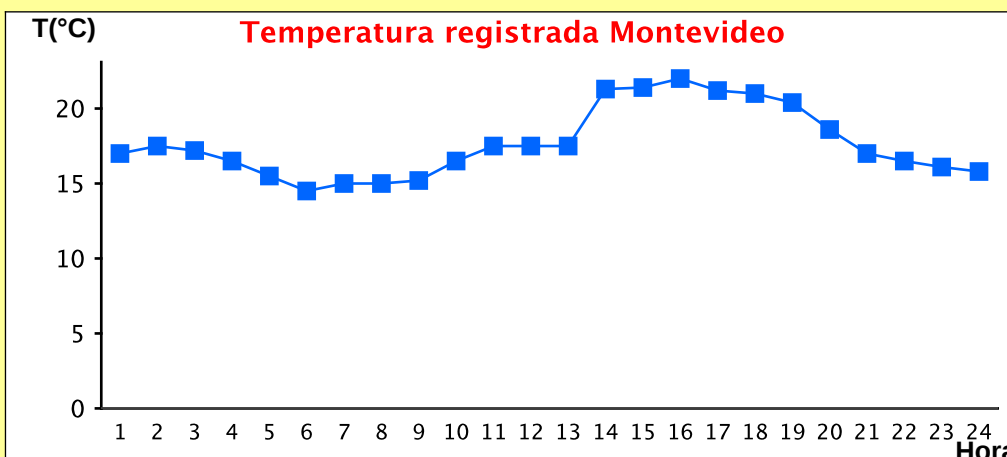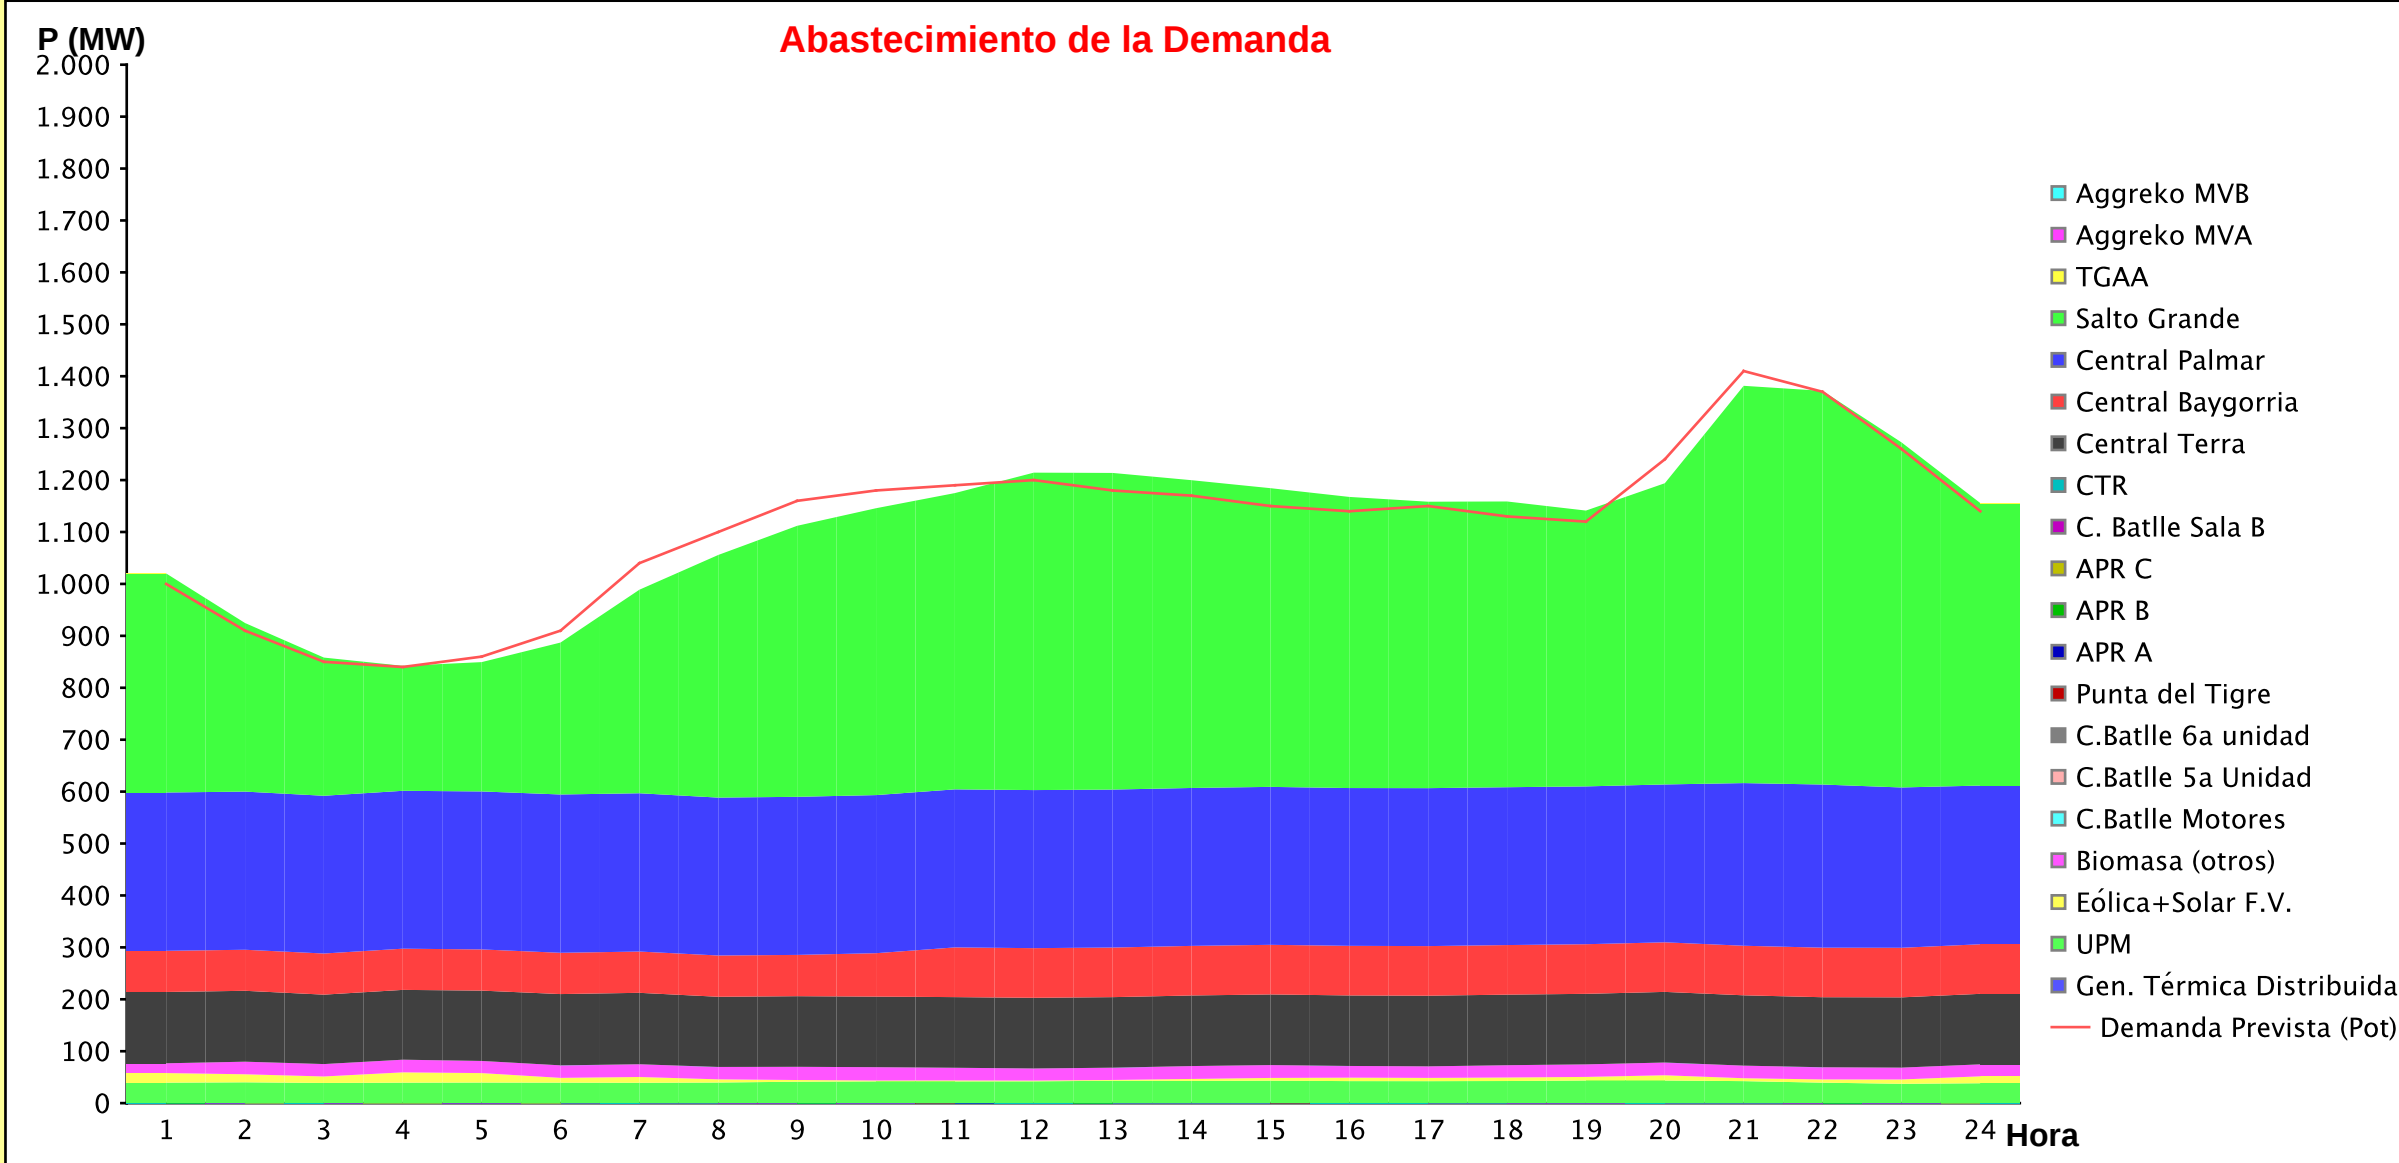



Picos de Potencia (MW)	
Pico noche:	1423 Hora 20:56

Generación Media (MW)	
Eólica	8,4
Biomasa	69,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

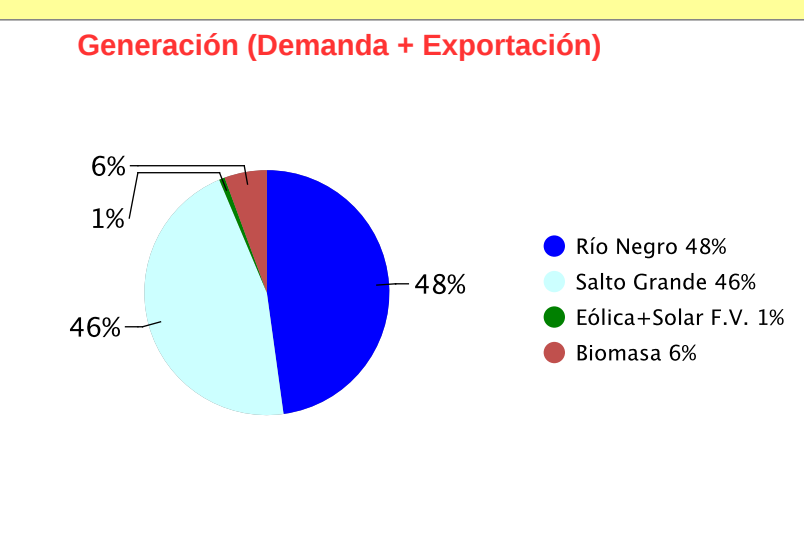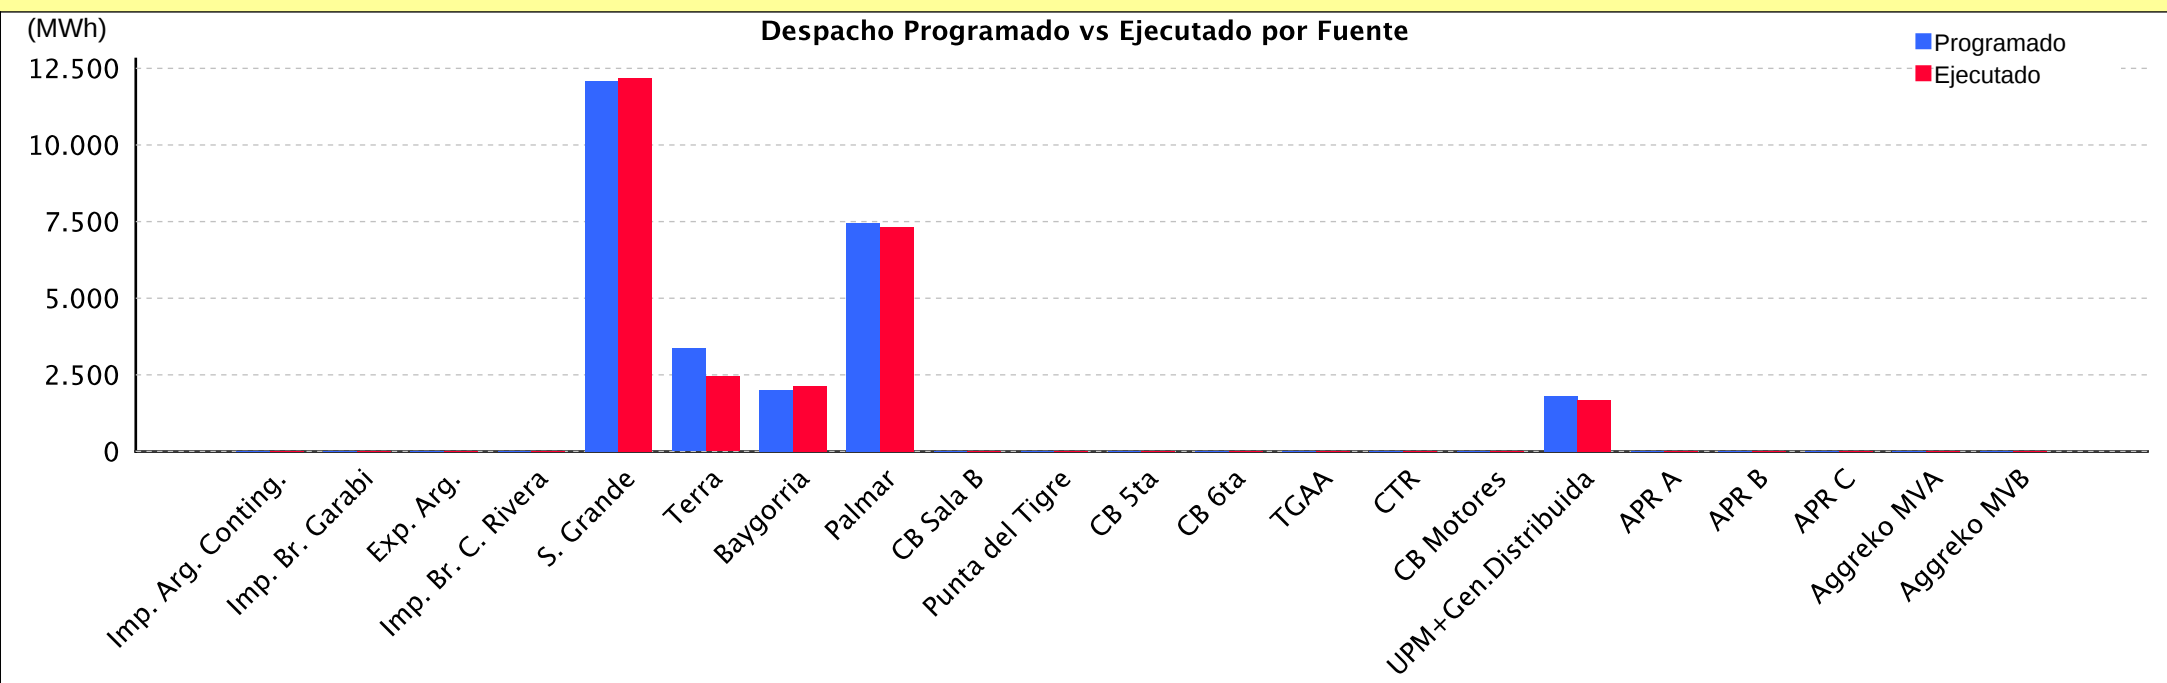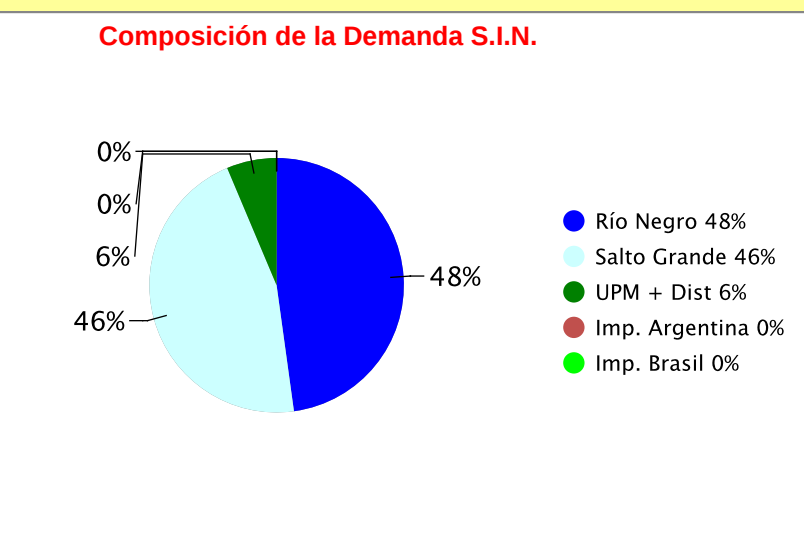



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

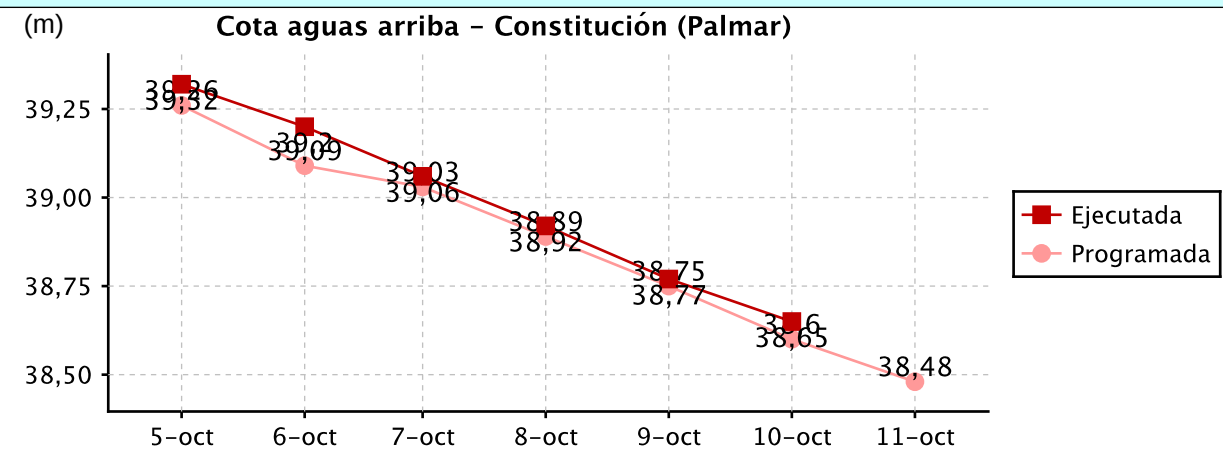
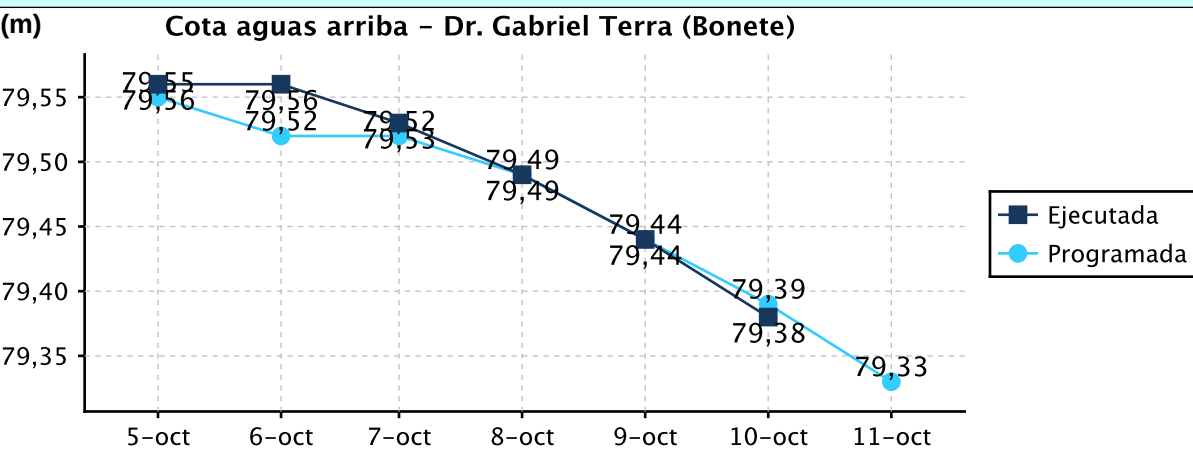


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,39	79,38
Baygorria	53,81	53,73
Palmar	38,60	38,65
SGU	34,11	34,09

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

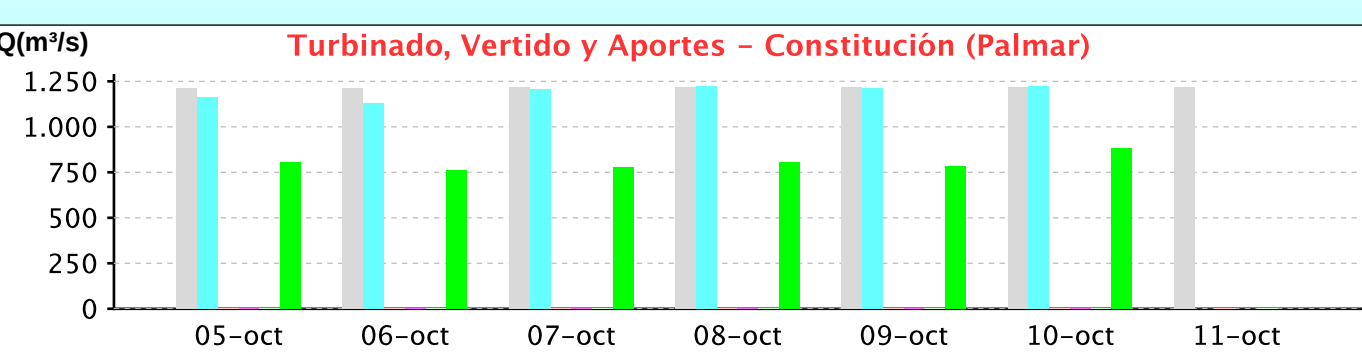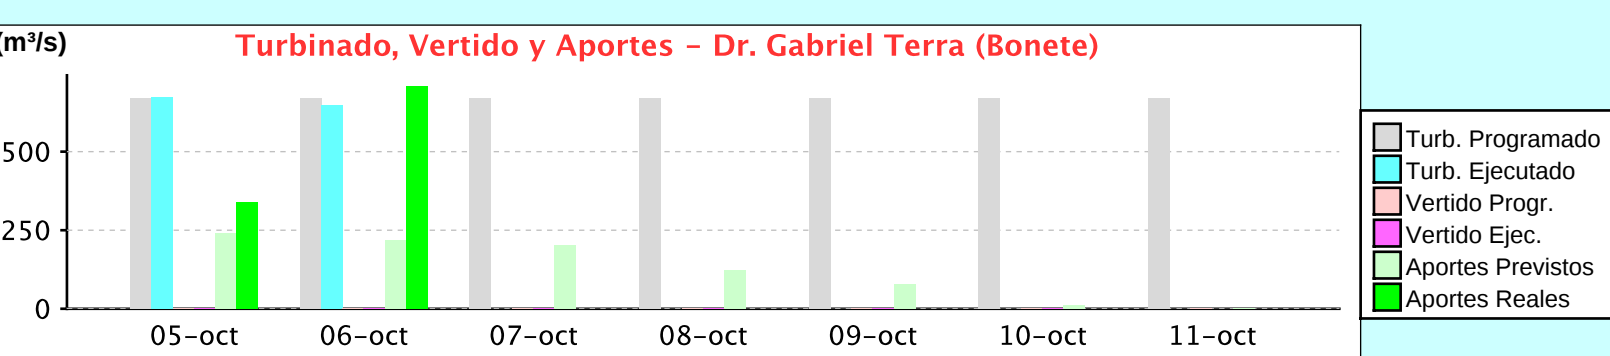

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

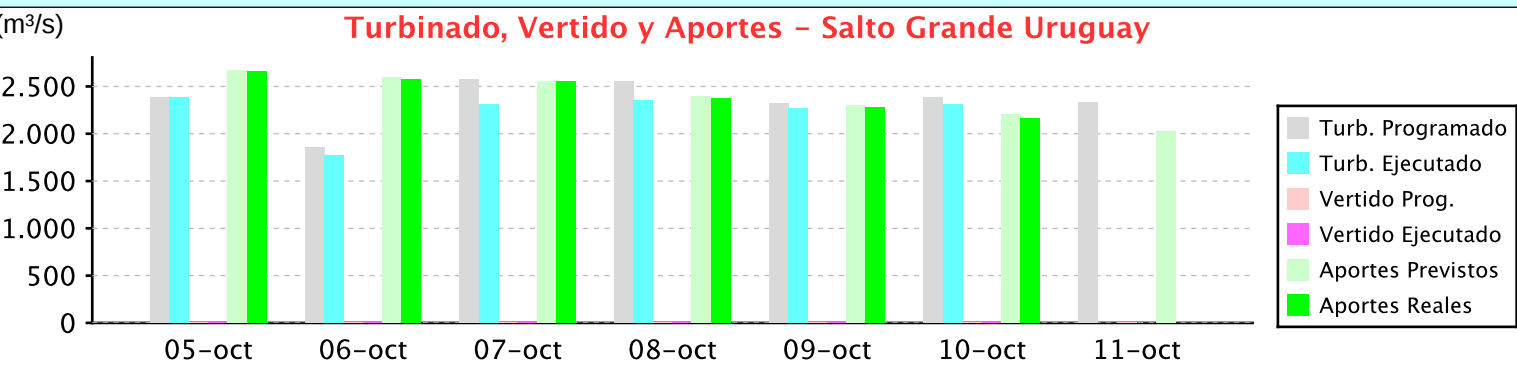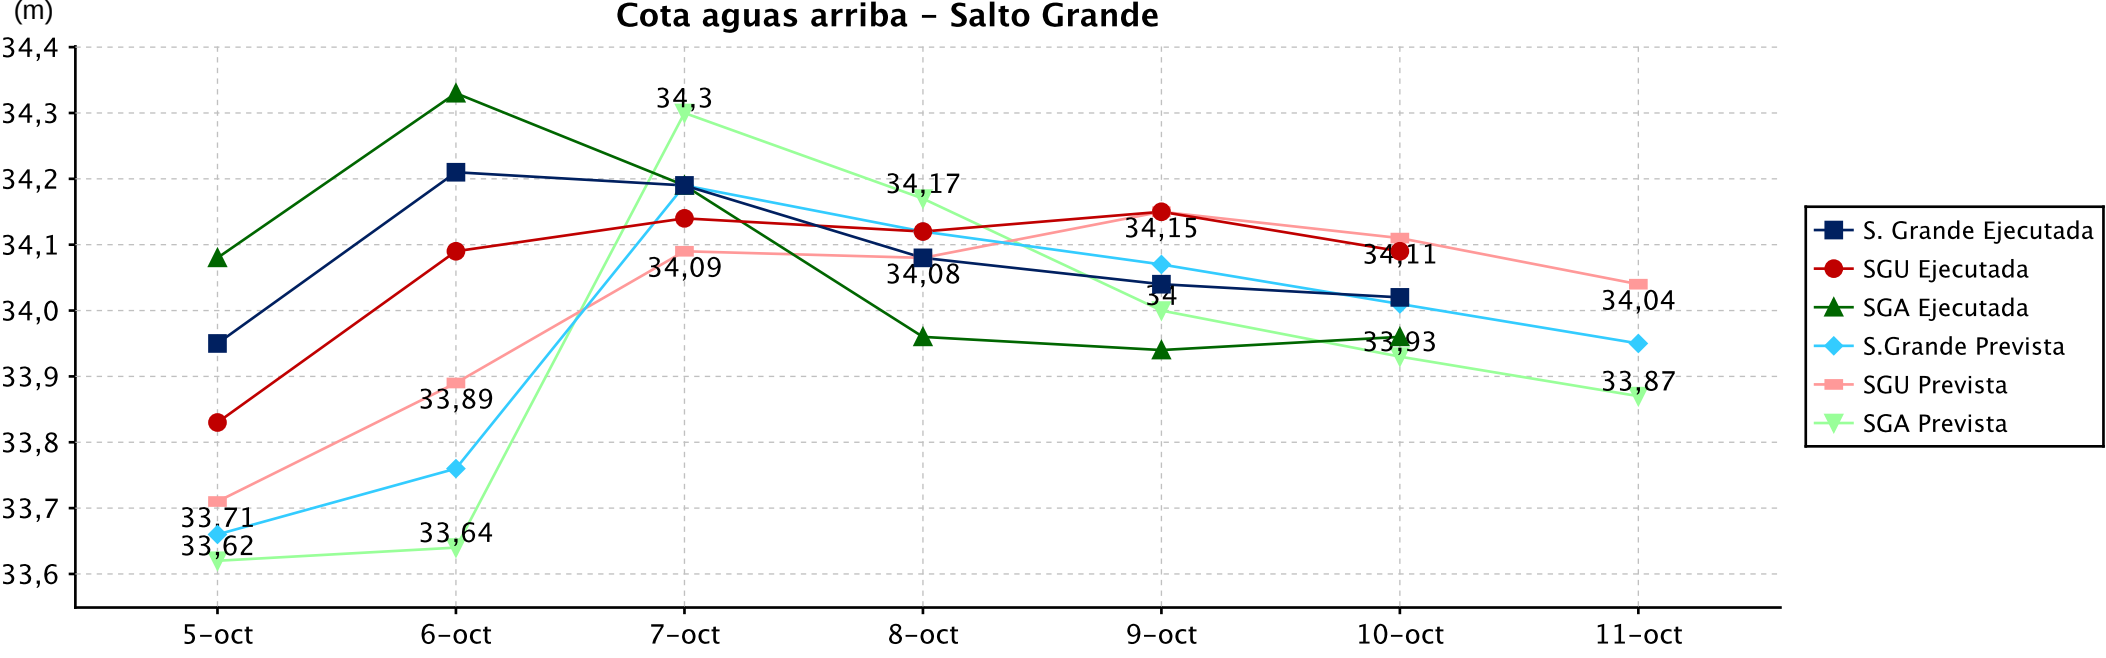

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,09
Cota Vista Arg	33,96
Cota real	34,02

Dif. Energ. (U-A)	2.629
Acumulado MWh	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	670	
Baygorria	661	
Palmar	1.216	1.221
SGU	2.386	2.313

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	12	
Baygorria	0	
Palmar	0	884
SGU	2.200	2.162

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Debido a las medidas gremiales adoptadas en UTE, no se cuenta con la información de: picos de potencia (mínimo y medidía), turbinado ejecutado en Terra y Baygorria, aportes en Terra y Baygorria 26.

770 16
