



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



viernes 11 de octubre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-89
Central P. del Tigre	-13
APR A	-2
APR B	-3
APR C	170
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.247
C. Baygorria	2.293
C. Palmar	7.357
C. Salto Grande	11.951
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.867
TOTAL Generación	26.773

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.773
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.840
Diferencia (MWh)	-67
Ejecutada - Programada	-0,25 %

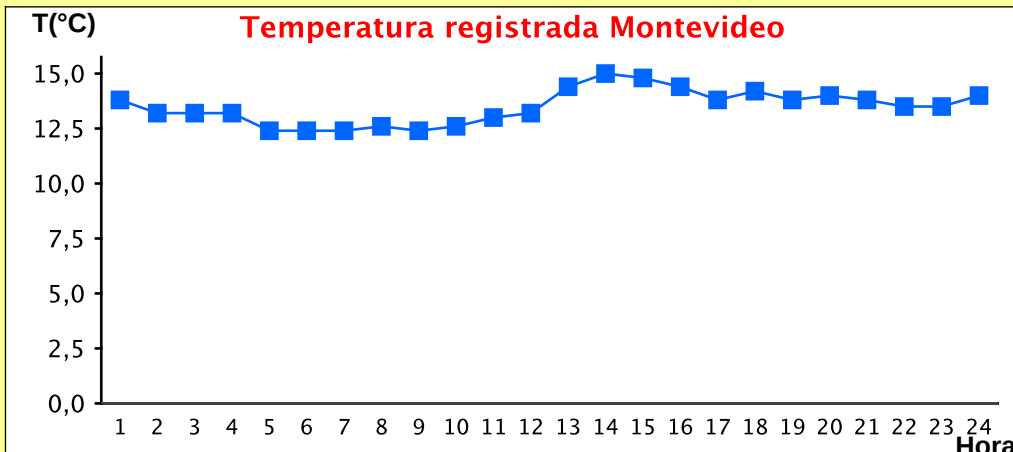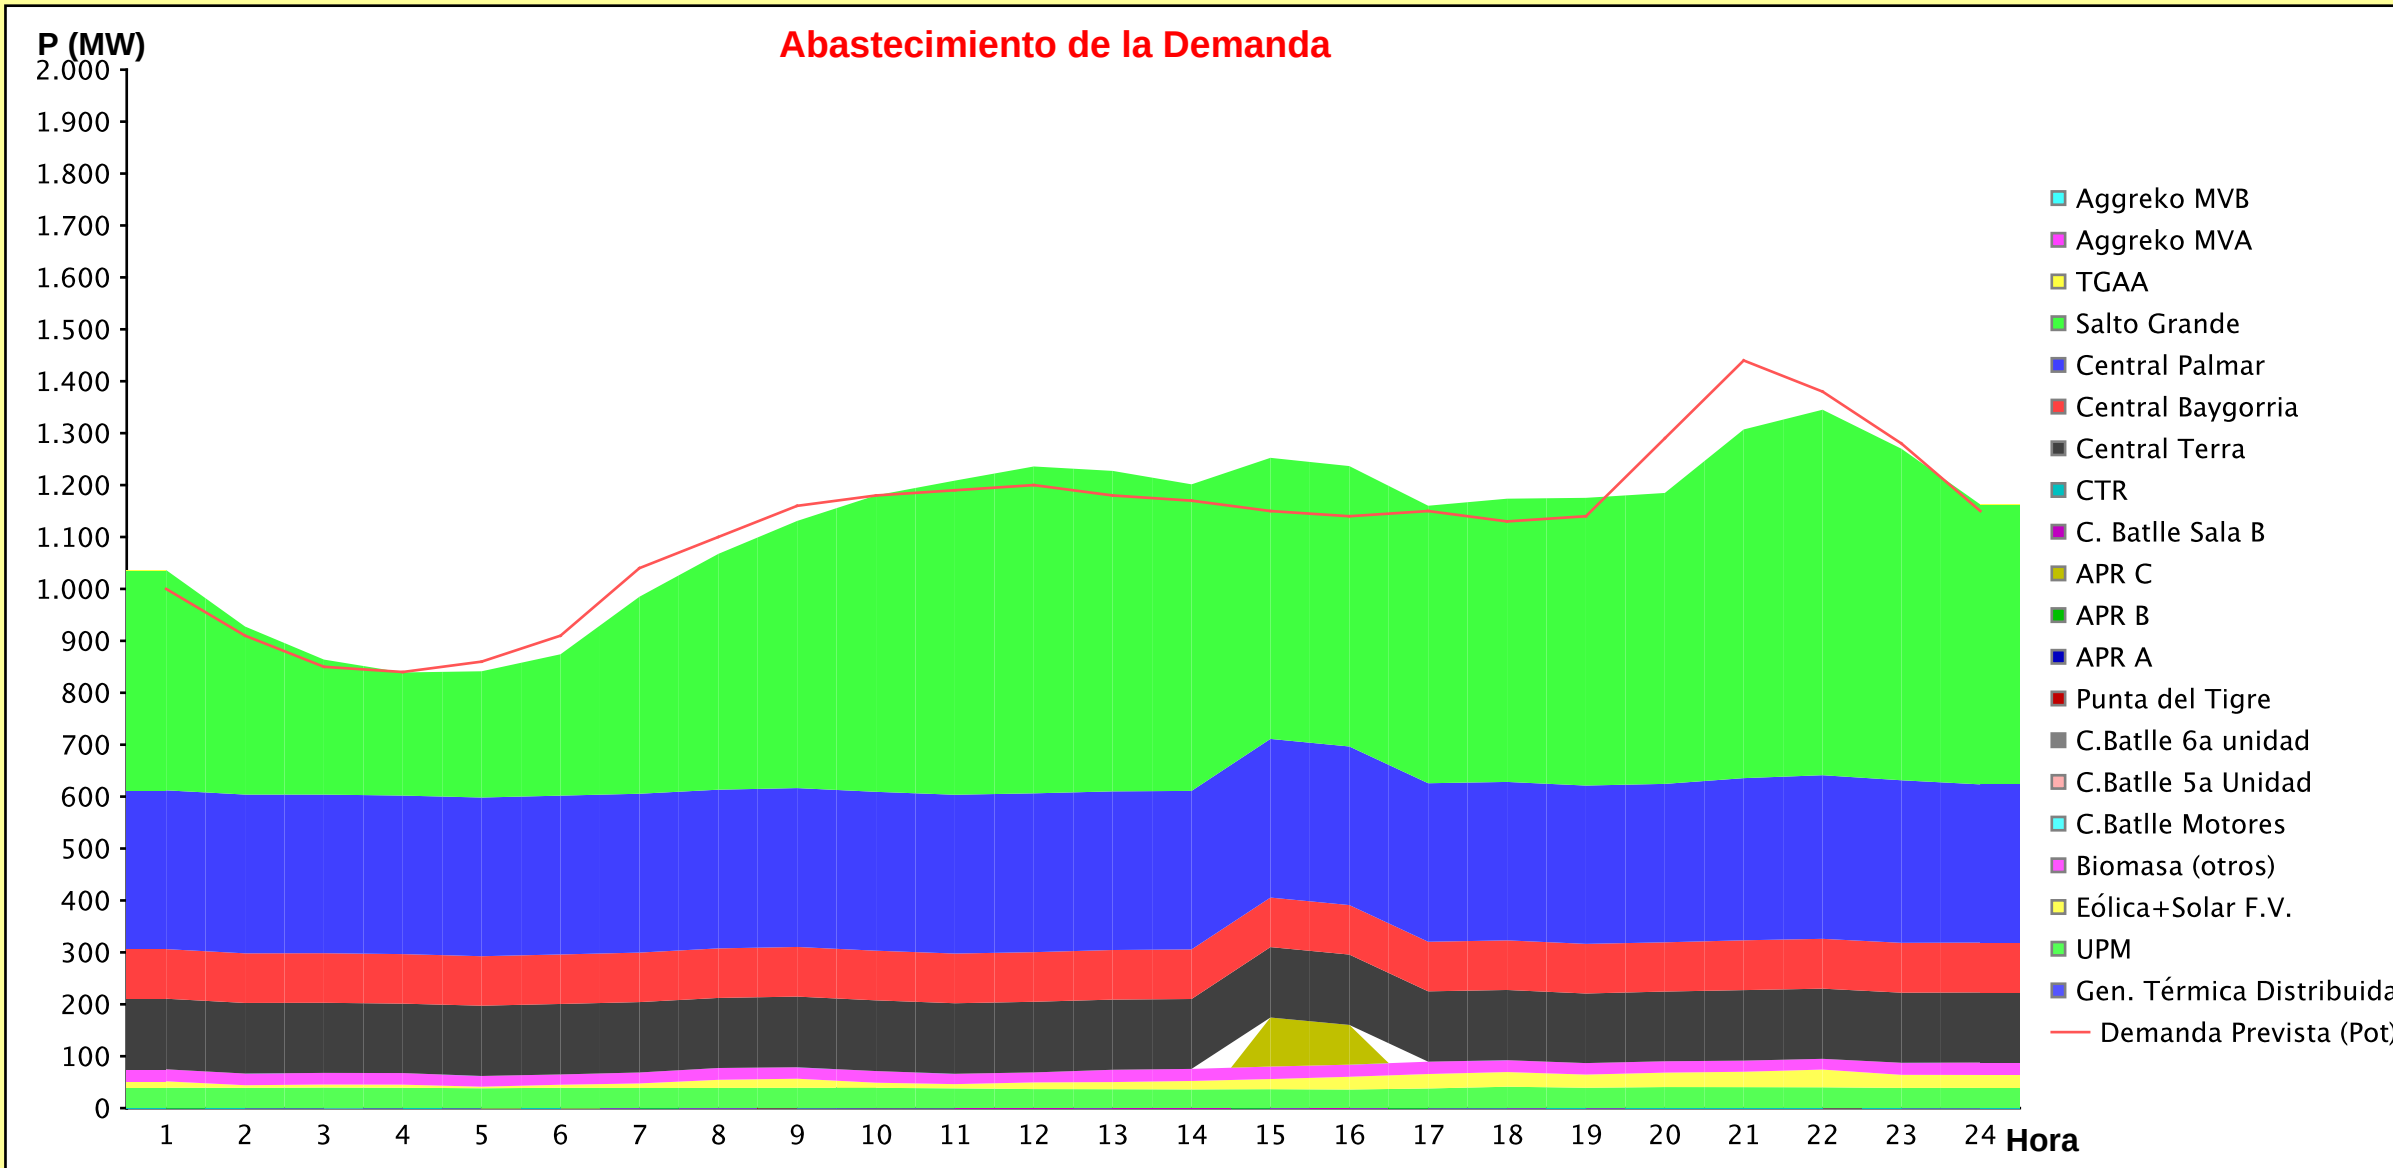



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1266 Hora 11:49
Potencia mínima:	843 Hora 3:58
Pico noche:	1386 Hora 21:27

Generación Media (MW)	
Eólica	17,0
Biomasa	65,4
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

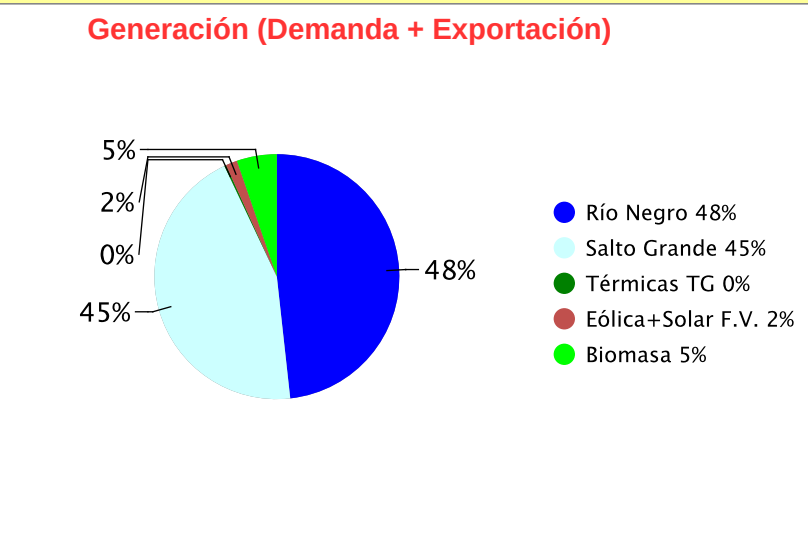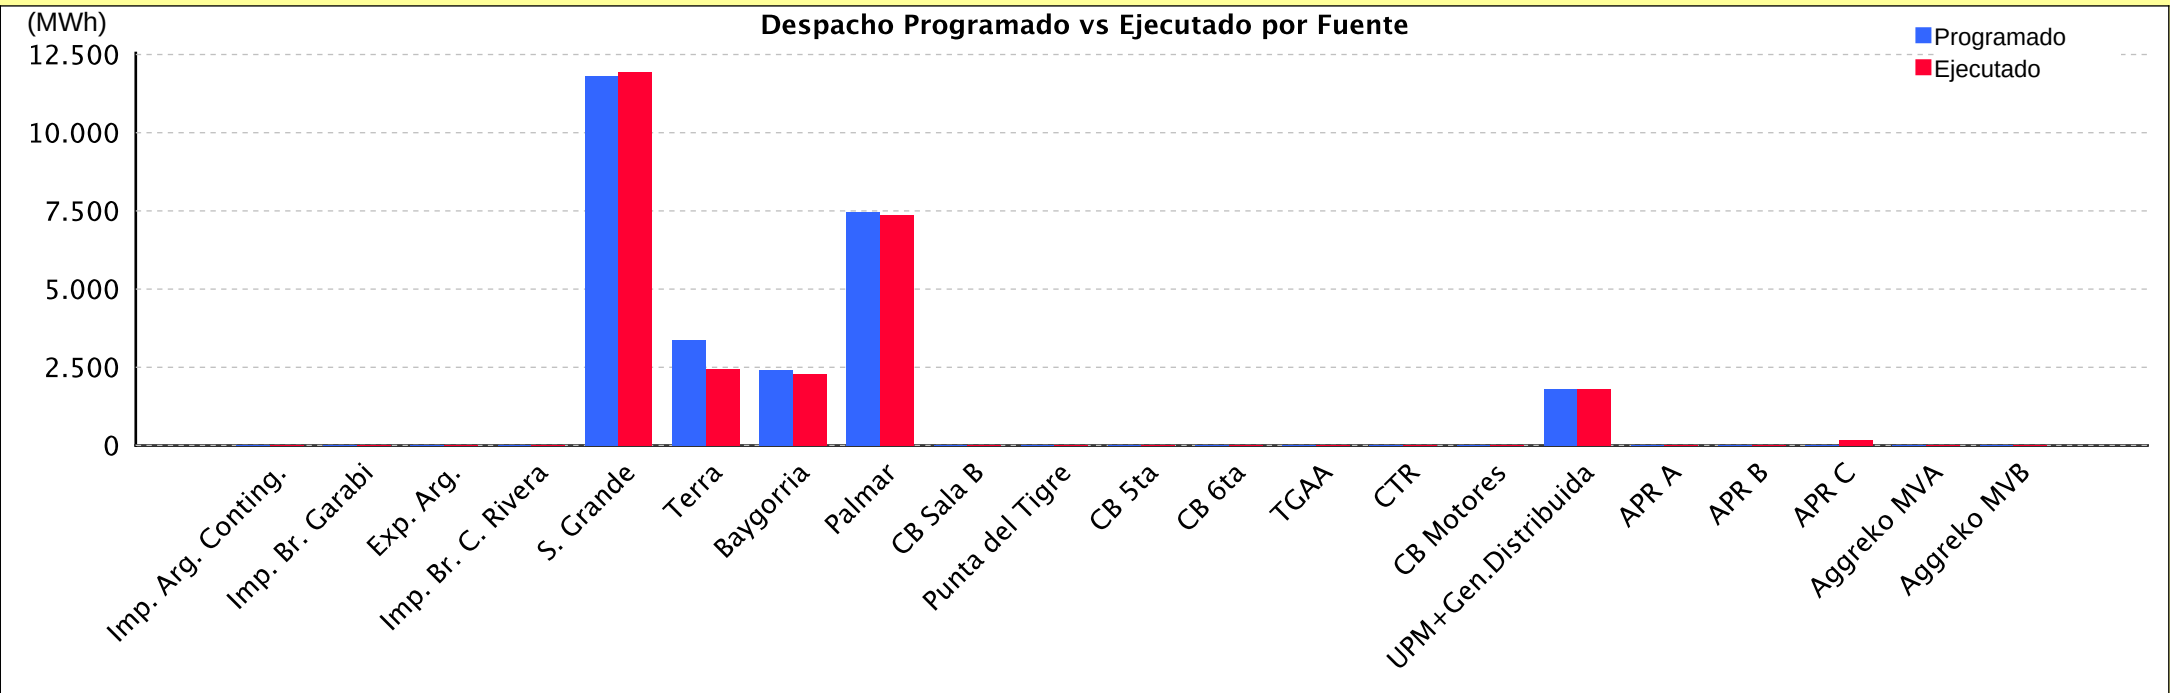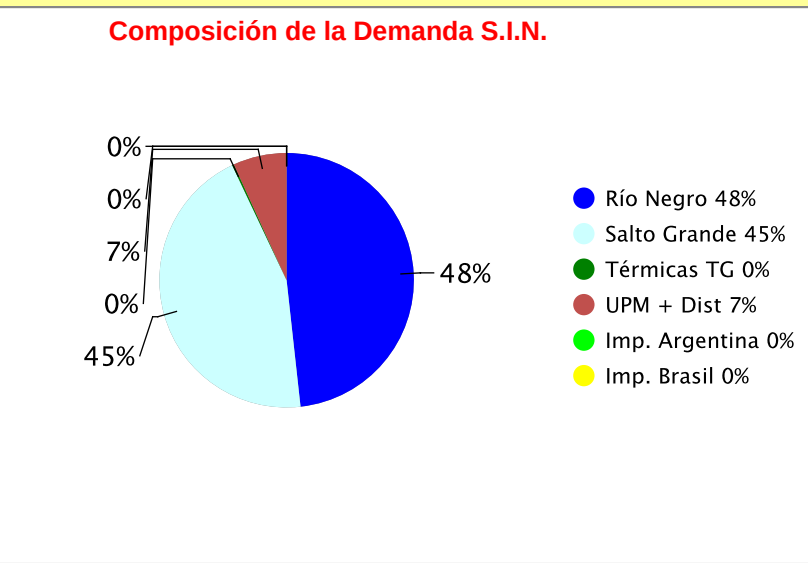



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

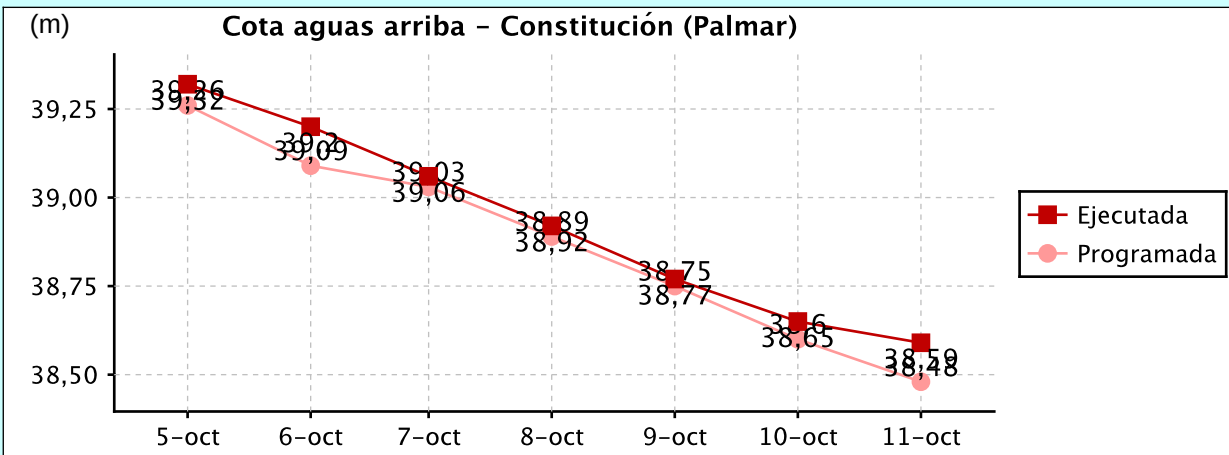
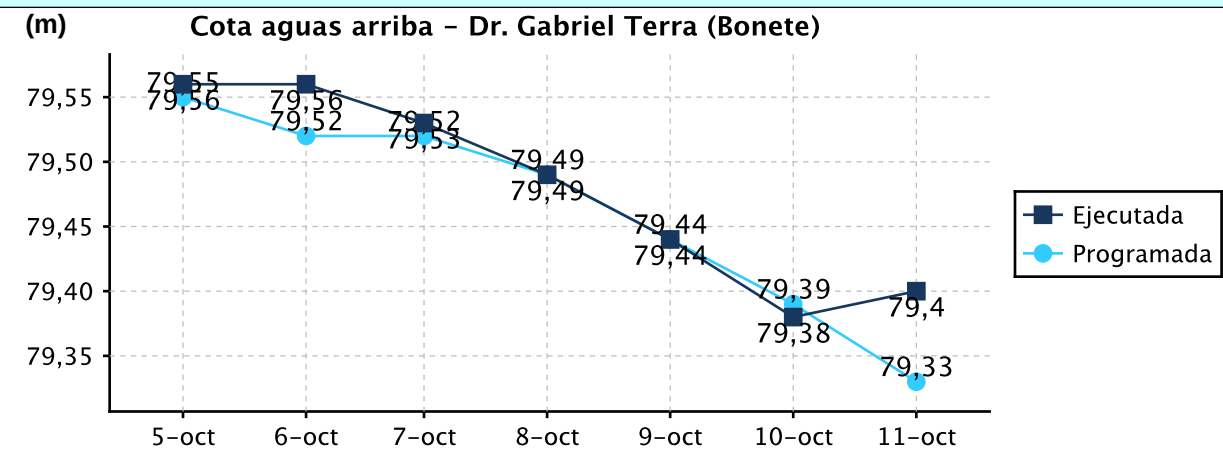


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,33	79,4
Baygorria	53,76	53,73
Palmar	38,48	38,59
SGU	34,04	34,01

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

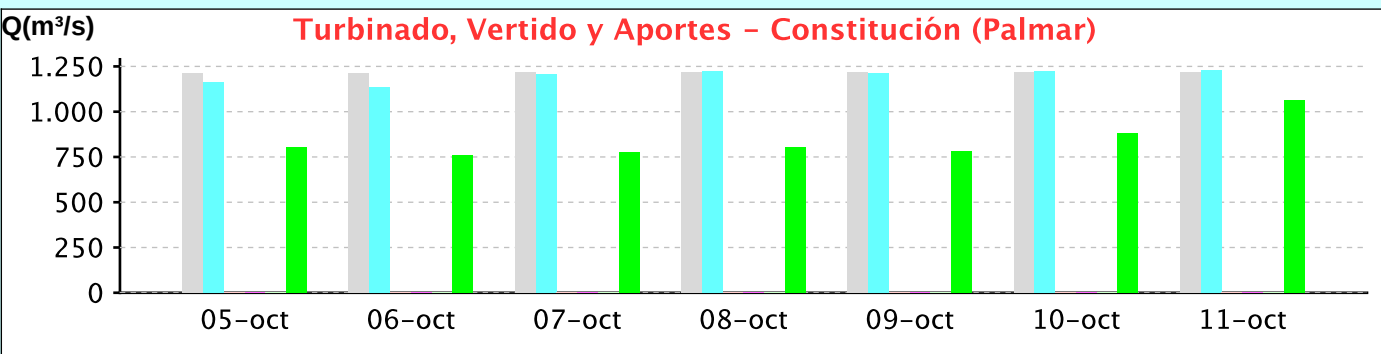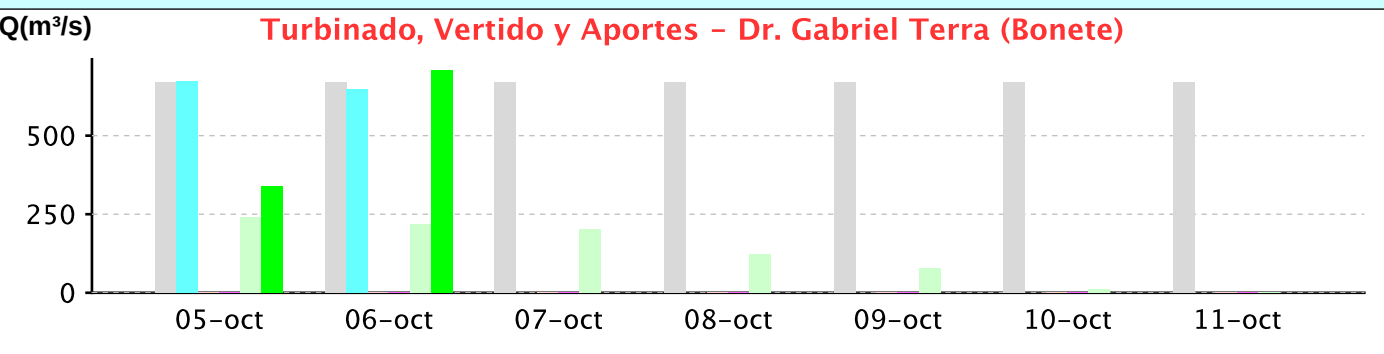

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

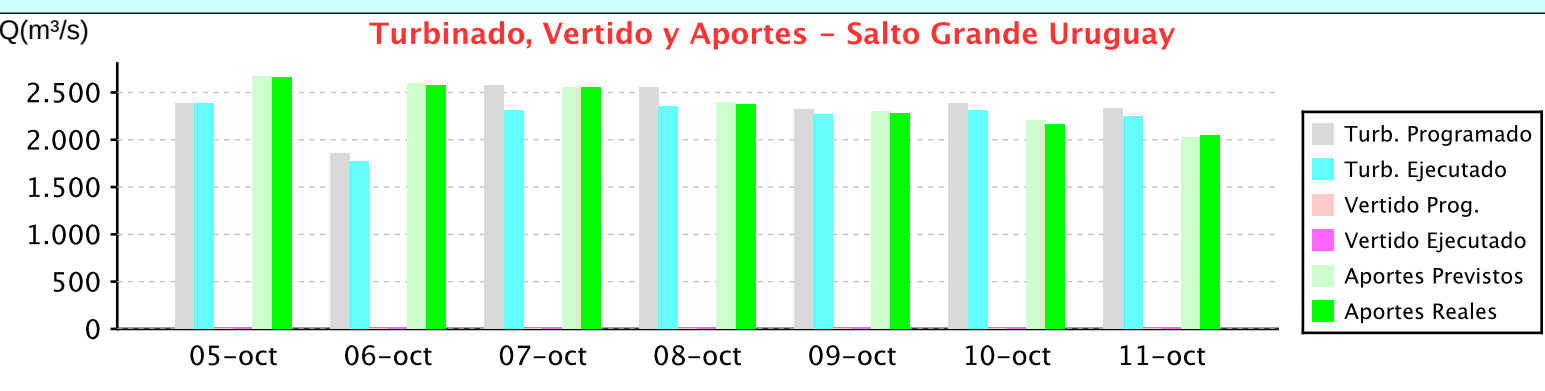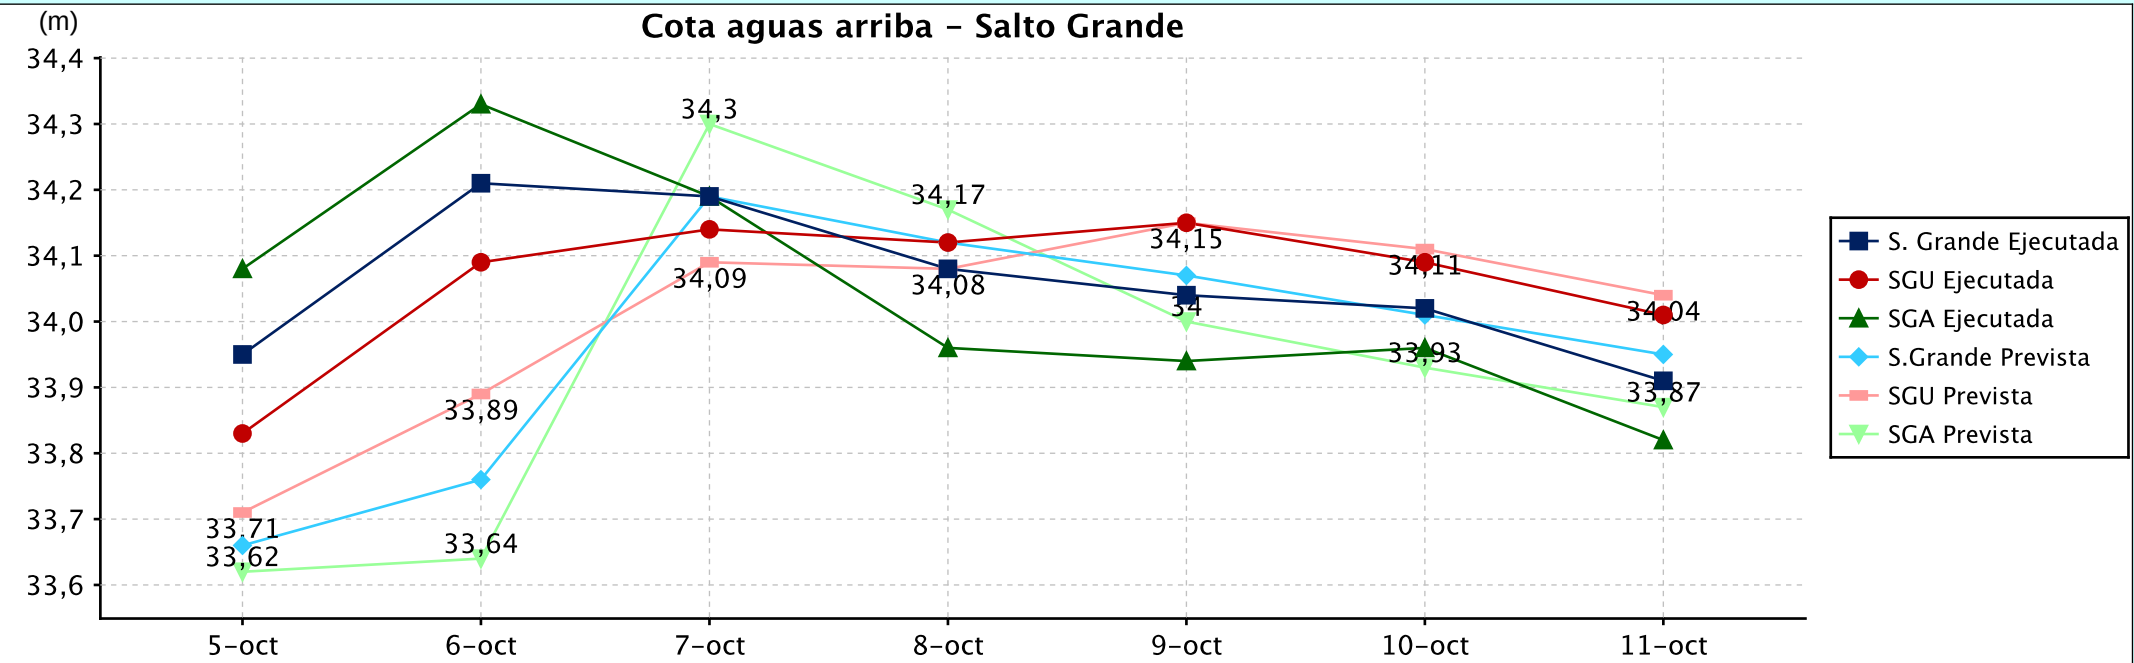

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,01
Cota Vista Arg	33,82
Cota real	33,91

Dif. Energ. (U-A)	3.745
Acumulado MWh	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	670	
Baygorria	794	
Palmar	1.216	1.228
SGU	2.335	2.247

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	
Baygorria	0	
Palmar	0	1.064
SGU	2.025	2.042

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Debido a las medidas gremiales adoptadas en UTE, no se cuenta con la información de: picos de potencia (mínimo y medidía), turbinado ejecutado en Terra y Baygorria, aportes en Terra y Baygorria 26. 770 16

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

16/10/2013 17:37
