




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 12 de octubre de 2013


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-94
Central P. del Tigre	-10
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-1
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.253
C. Baygorria	1.984
C. Palmar	5.918
C. Salto Grande	12.067
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.897
TOTAL Generación	25.003

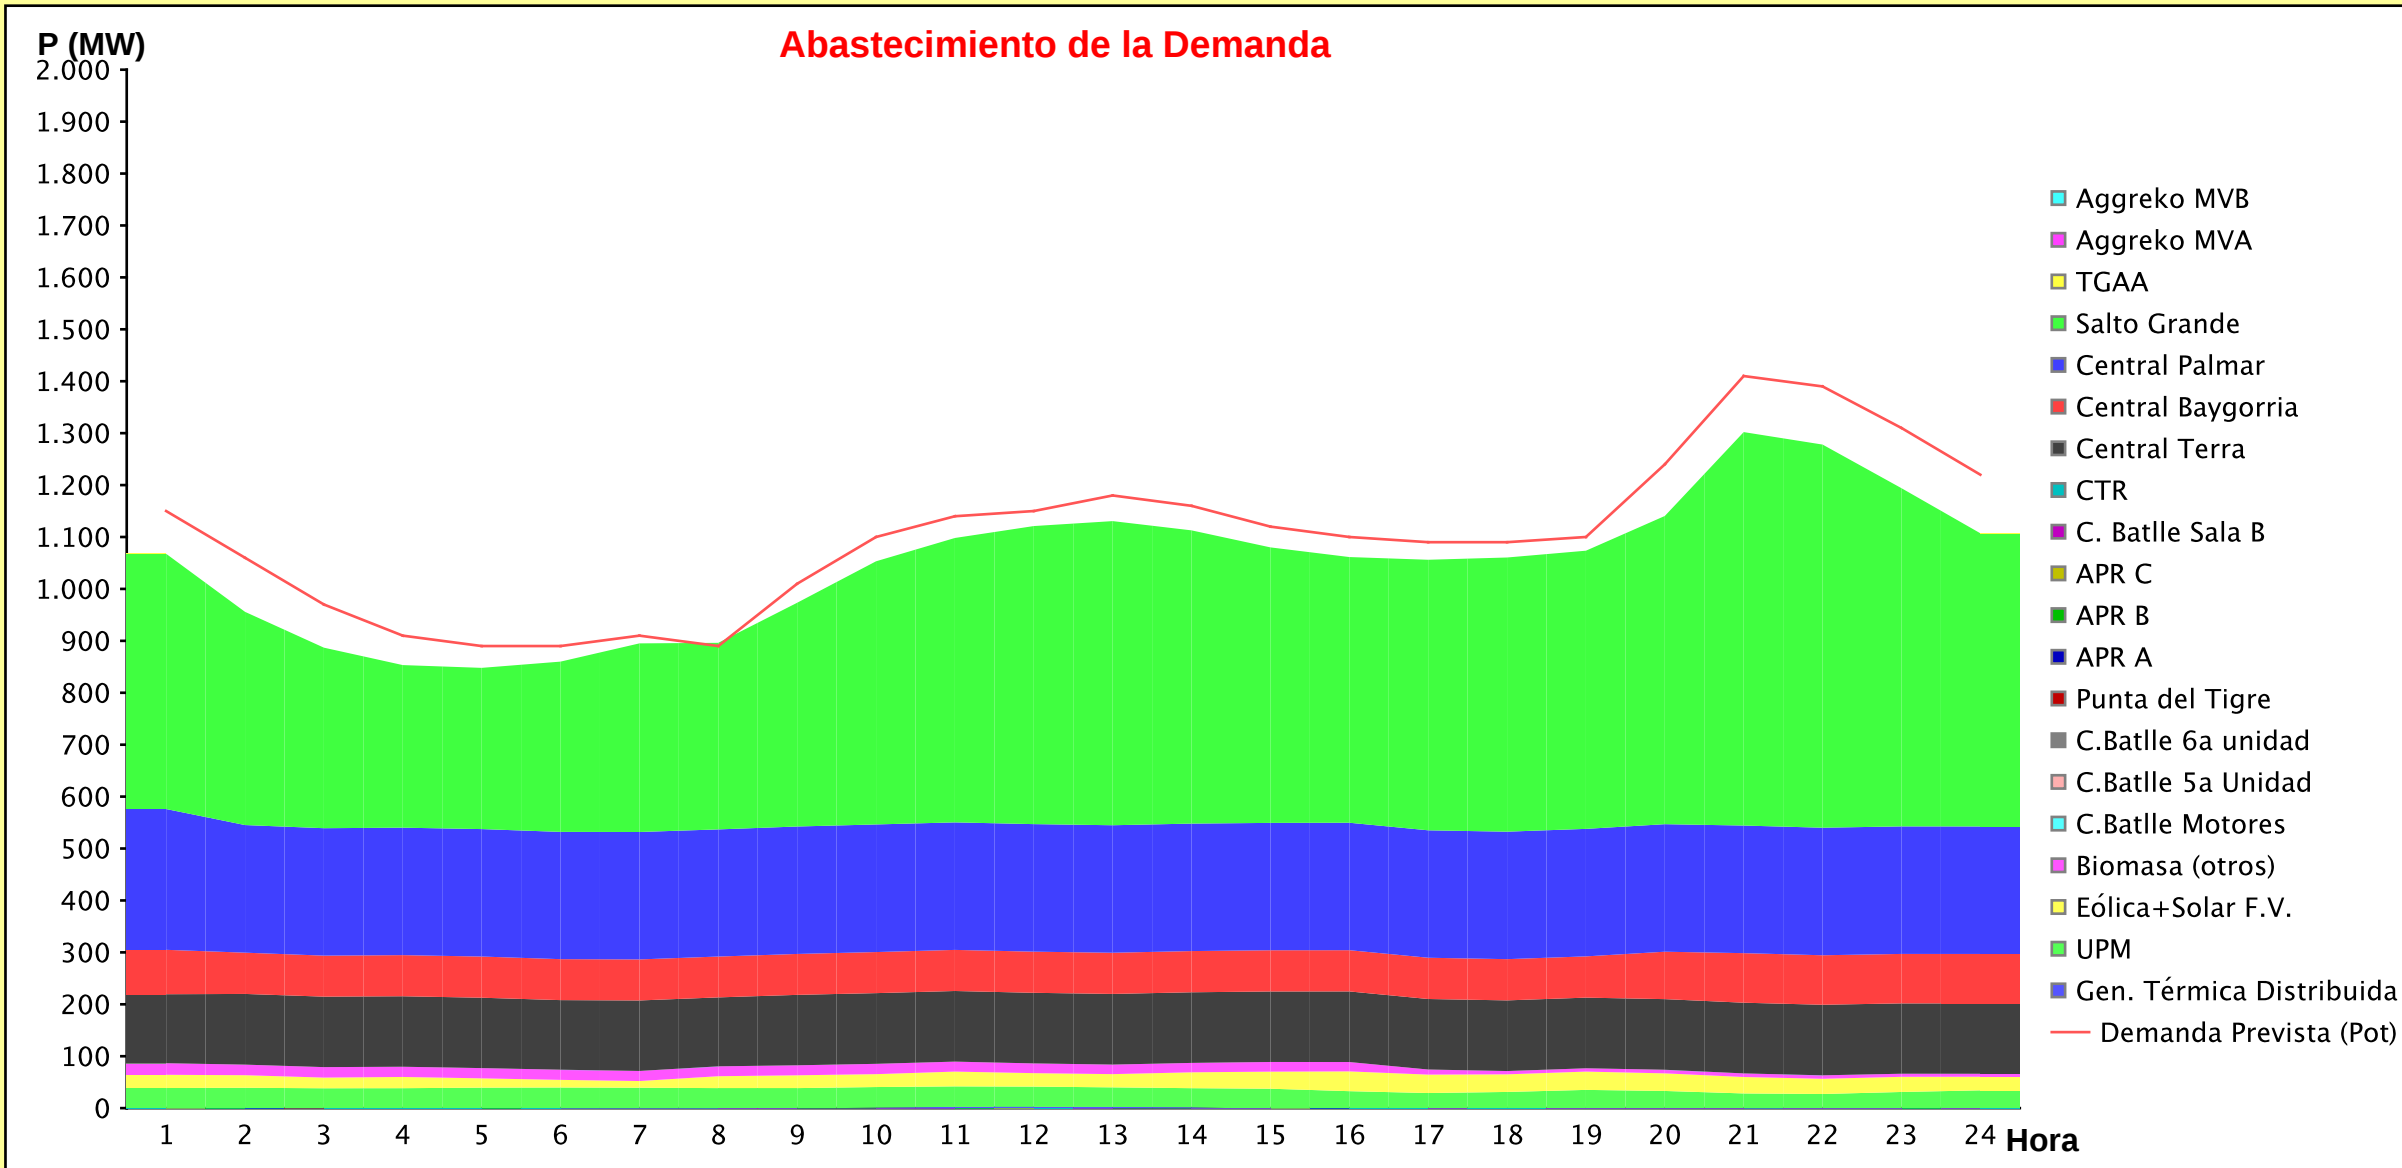

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.003
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.480
Diferencia (MWh)	-1.477
Ejecutada - Programada	-5.58 %

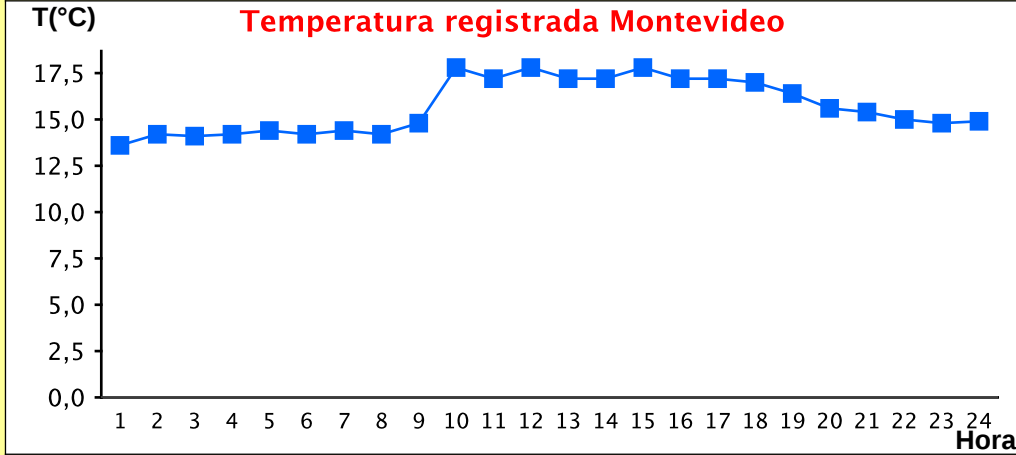



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1152 Hora 12:18
Potencia mínima:	850 Hora 4:40:
Pico noche:	1338 Hora 21:08

Generación Media (MW)	
Eólica	26,9
Biomasa	55,8
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,4
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

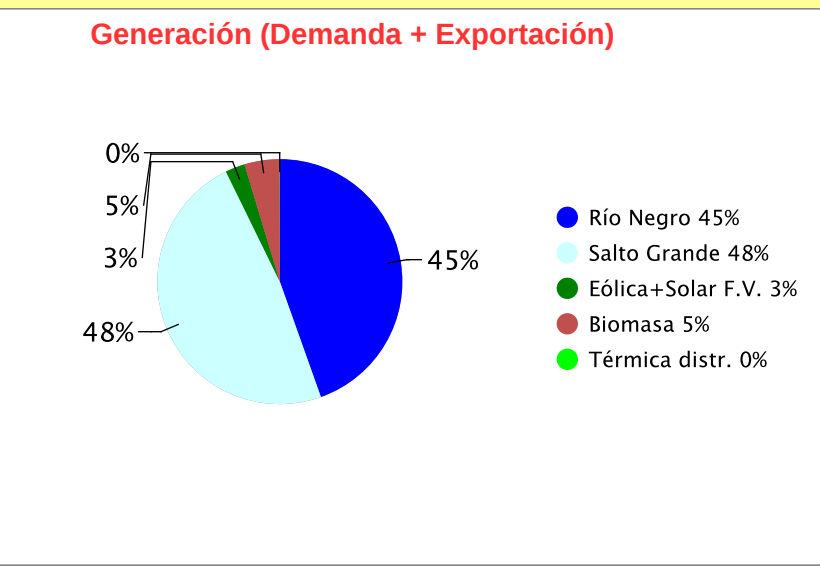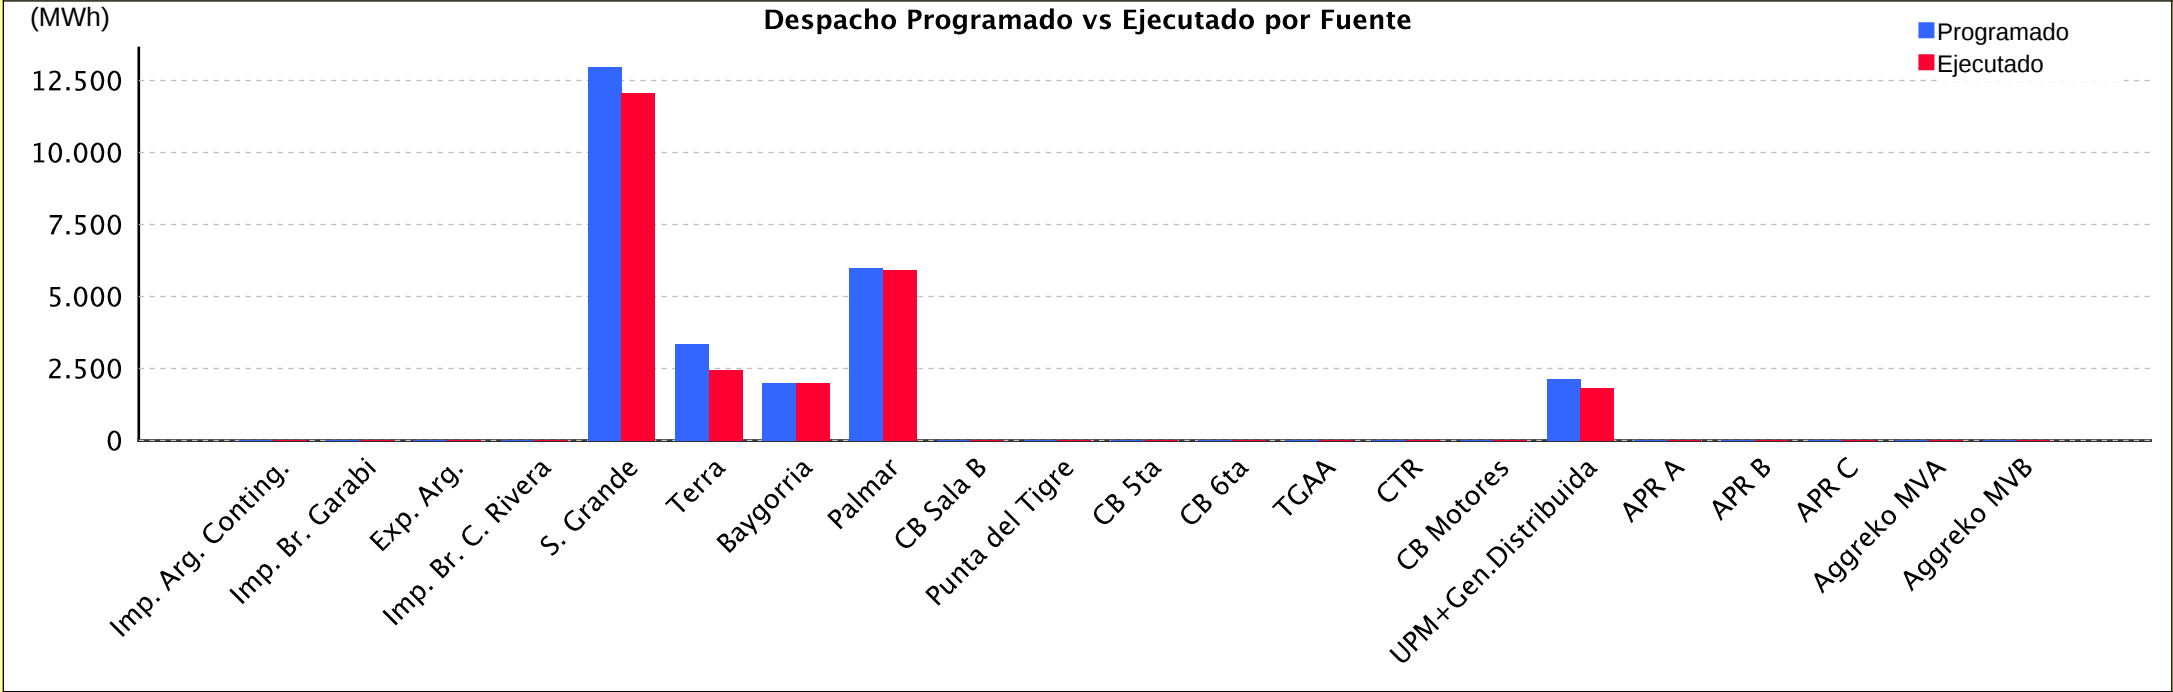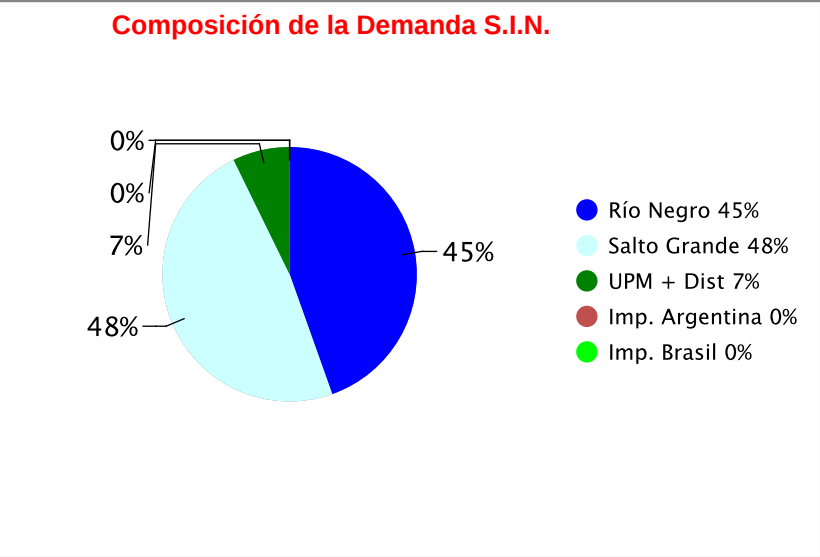



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

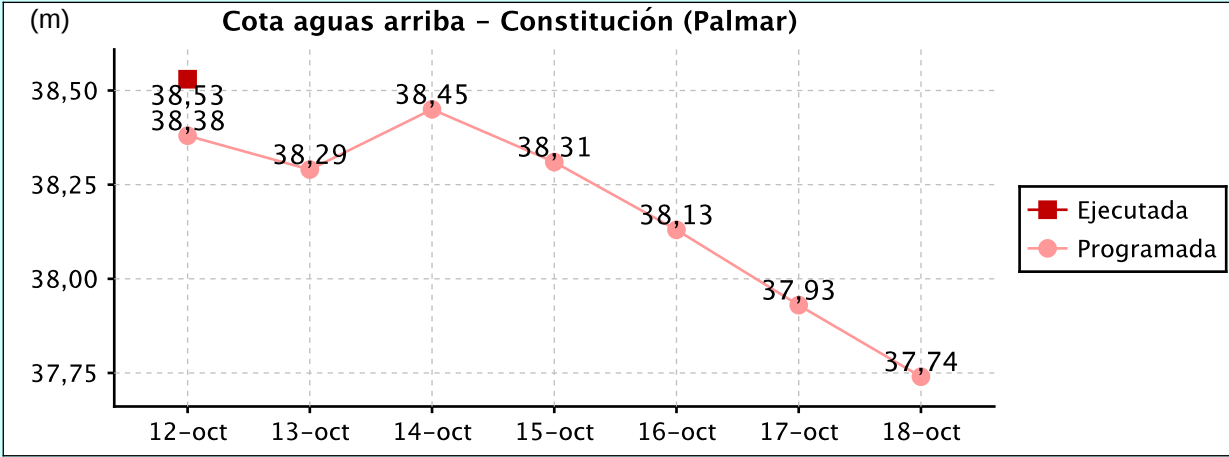
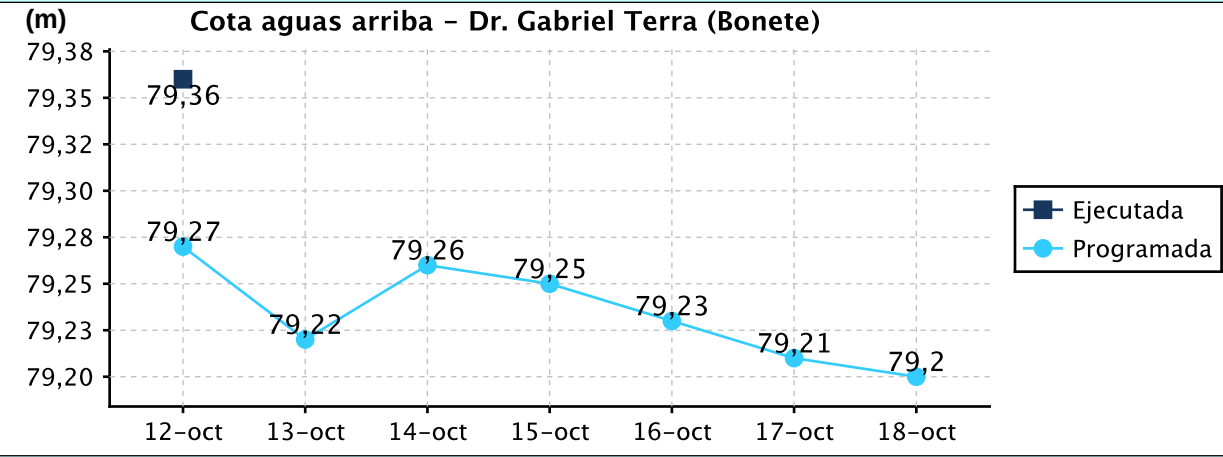


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,27	79,36
Baygorria	53,78	53,82
Palmar	38,38	38,53
SGU	33,84	33,98

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

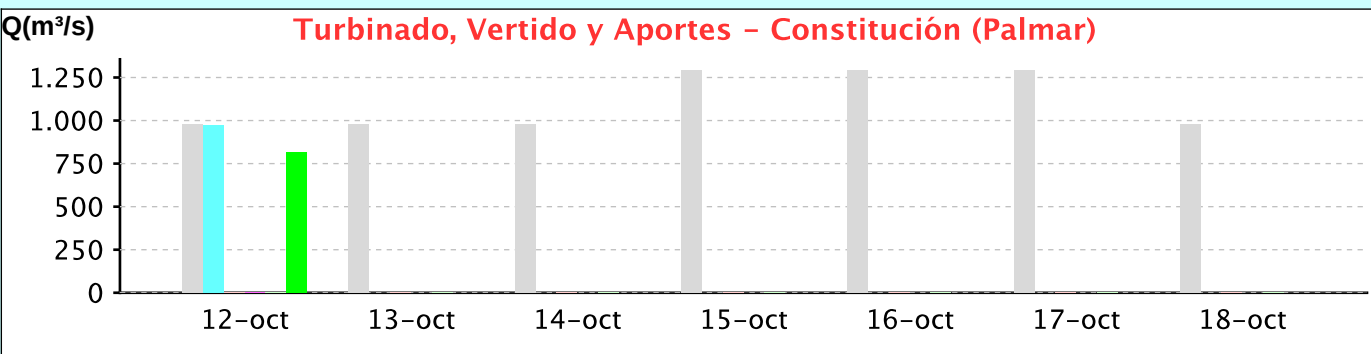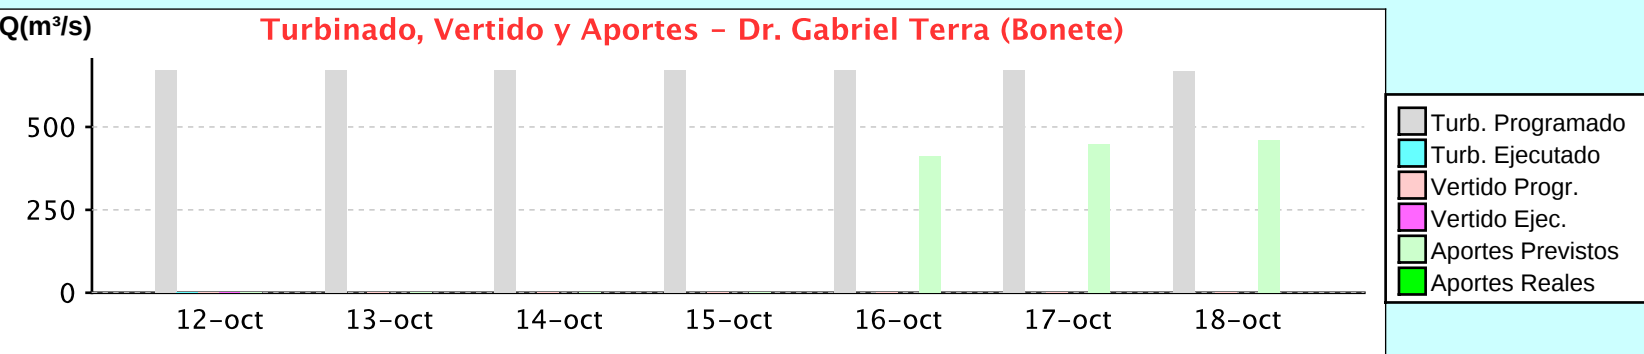

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

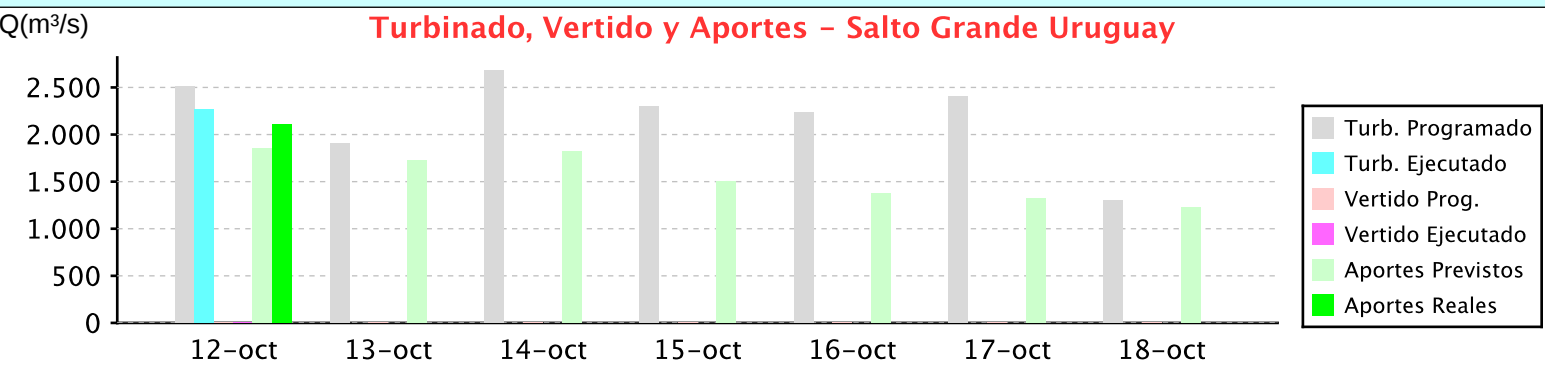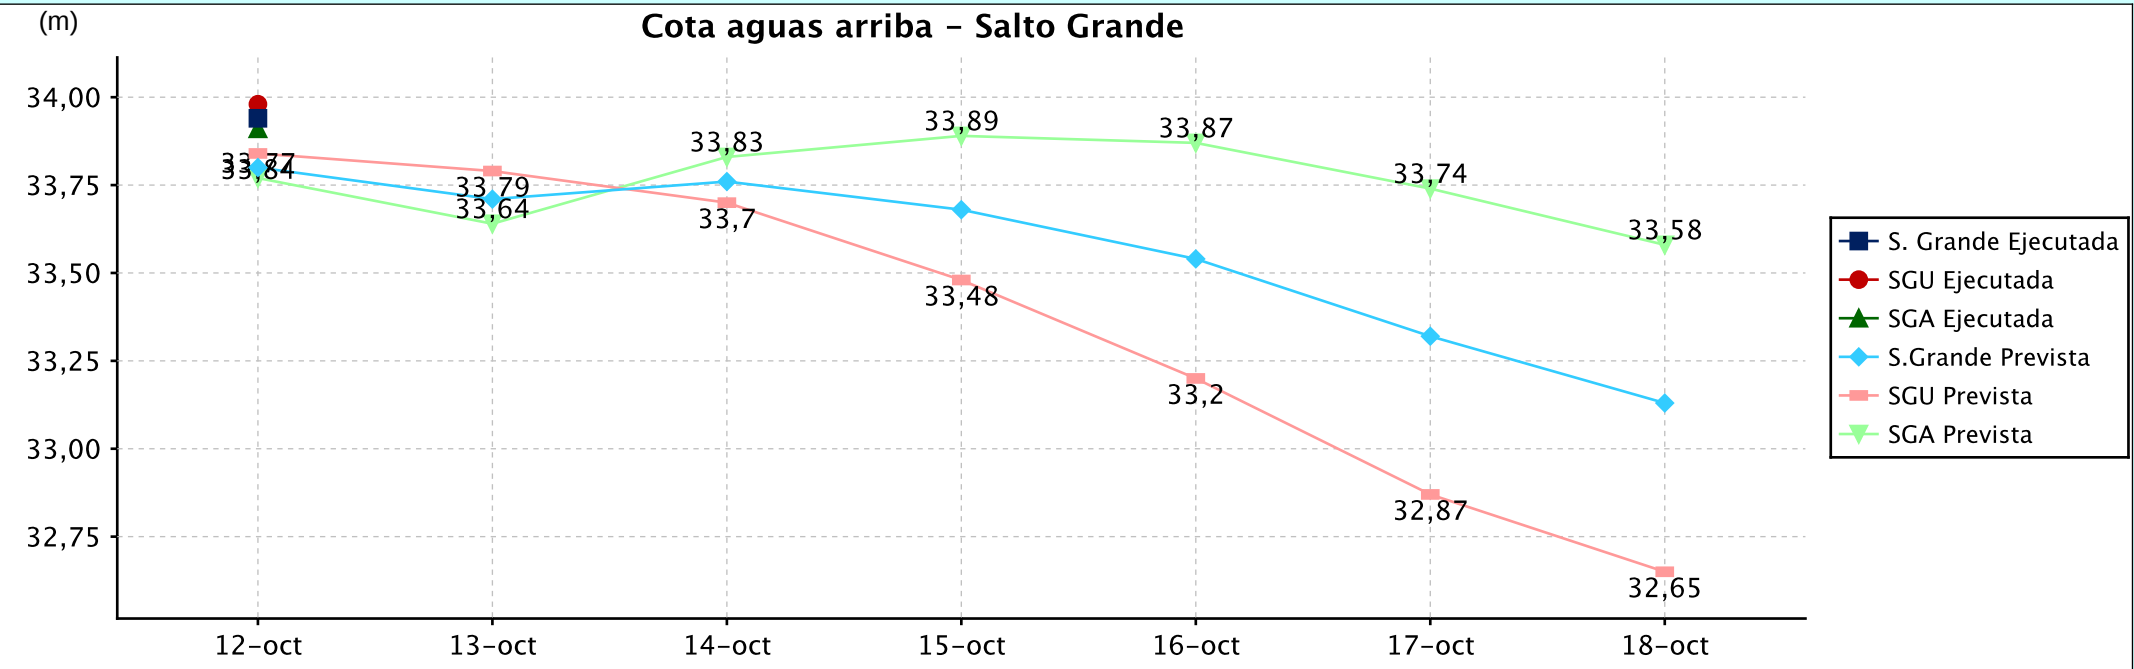

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,98
Cota Vista Arg	33,91
Cota real	33,94
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	1.626

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	670	0
Baygorria	661	
Palmar	978	970
SGU	2.514	2.262

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	
Baygorria	0	
Palmar	0	817
SGU	1.850	2.111

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Debido a las medidas gremiales adoptadas en UTE, no se cuenta con la información de: picos de potencia (mínimo y medidía), turbinado ejecutado en Terra y Baygorria, aportes en Terra y Baygorria 26. 770 16
