




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 15 de octubre de 2013


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-87
Central P. del Tigre	42
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-1
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.257
C. Baygorria	1.942
C. Palmar	7.801
C. Salto Grande	12.430
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.244
TOTAL Generación	26.619

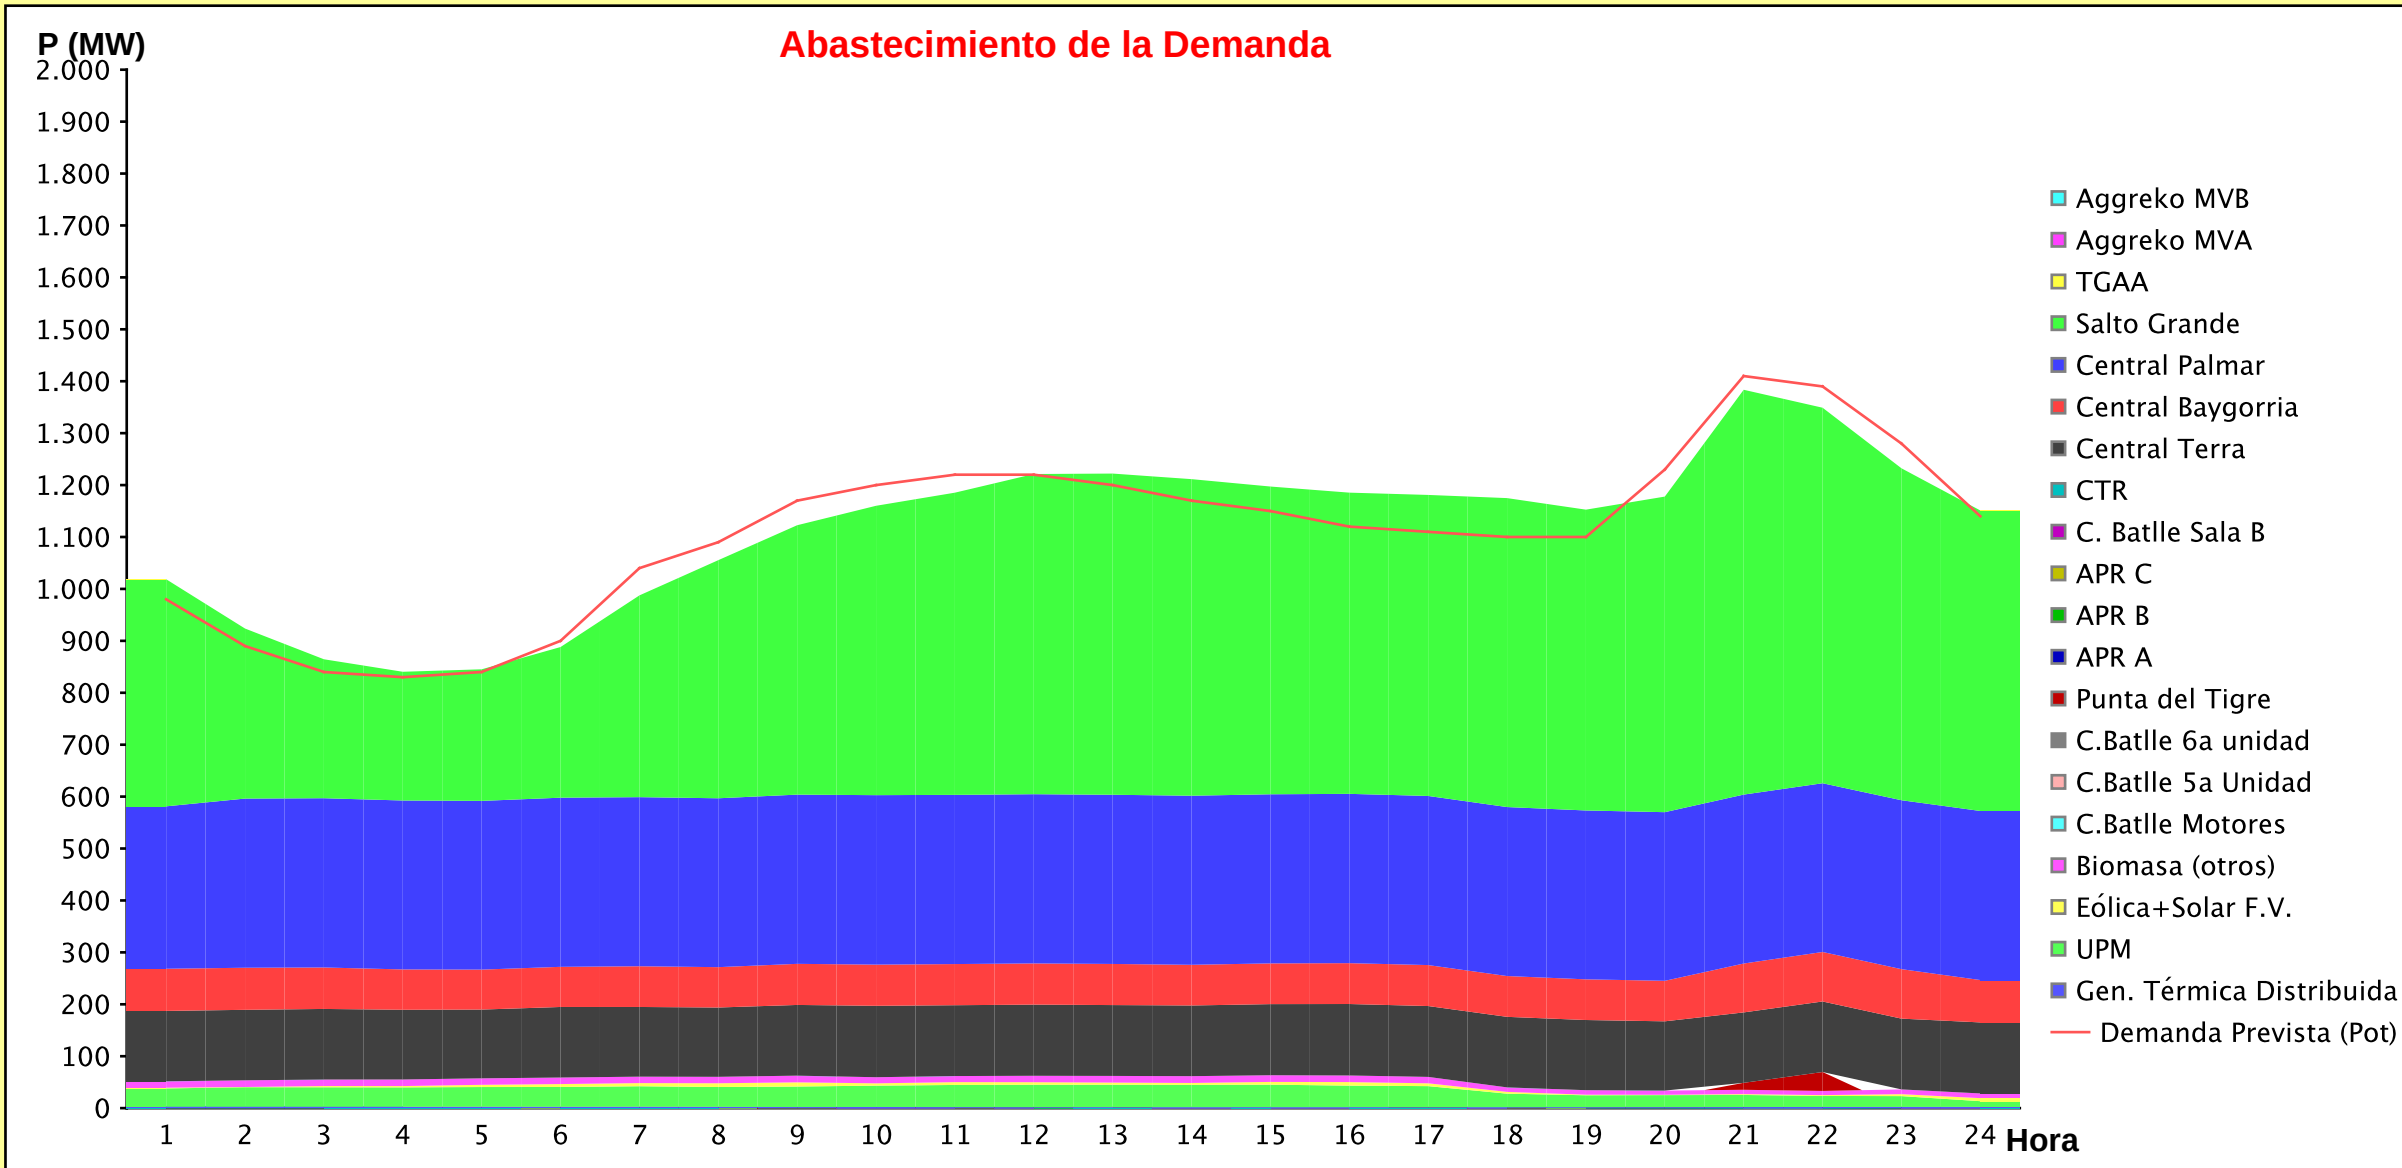

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.619
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.620
Diferencia (MWh)	-1
Ejecutada - Programada	-0,00 %

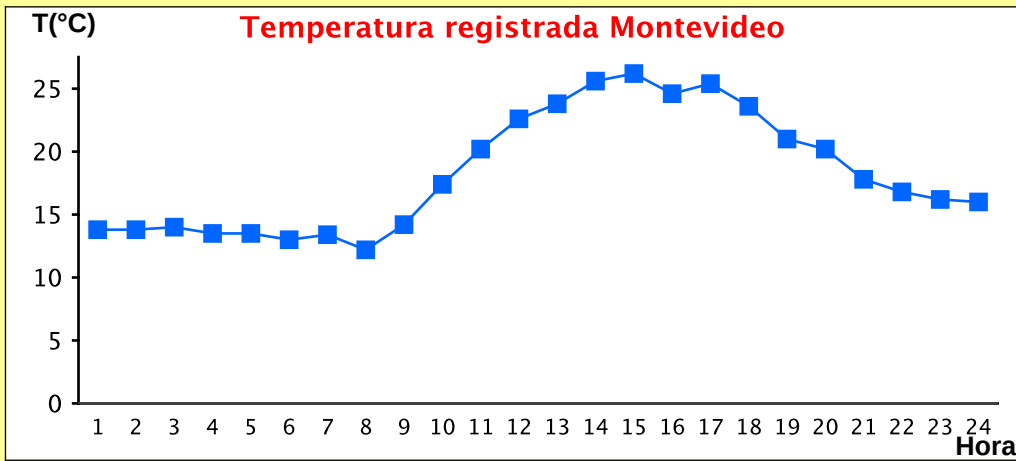



Picos de Potencia (MW)	
Pico noche:	1478
Hora 20:54	

Generación Media (MW)	
Eólica	4,2
Biomasa	50,3
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	2,2
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

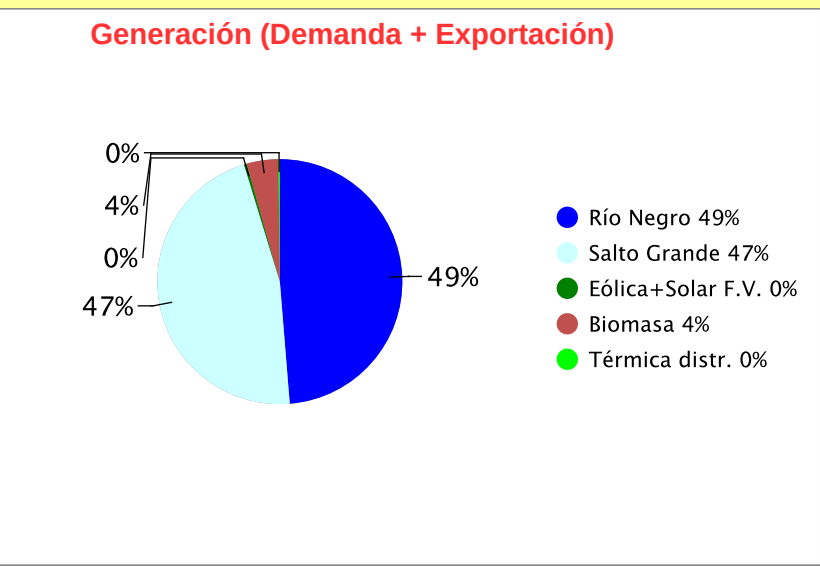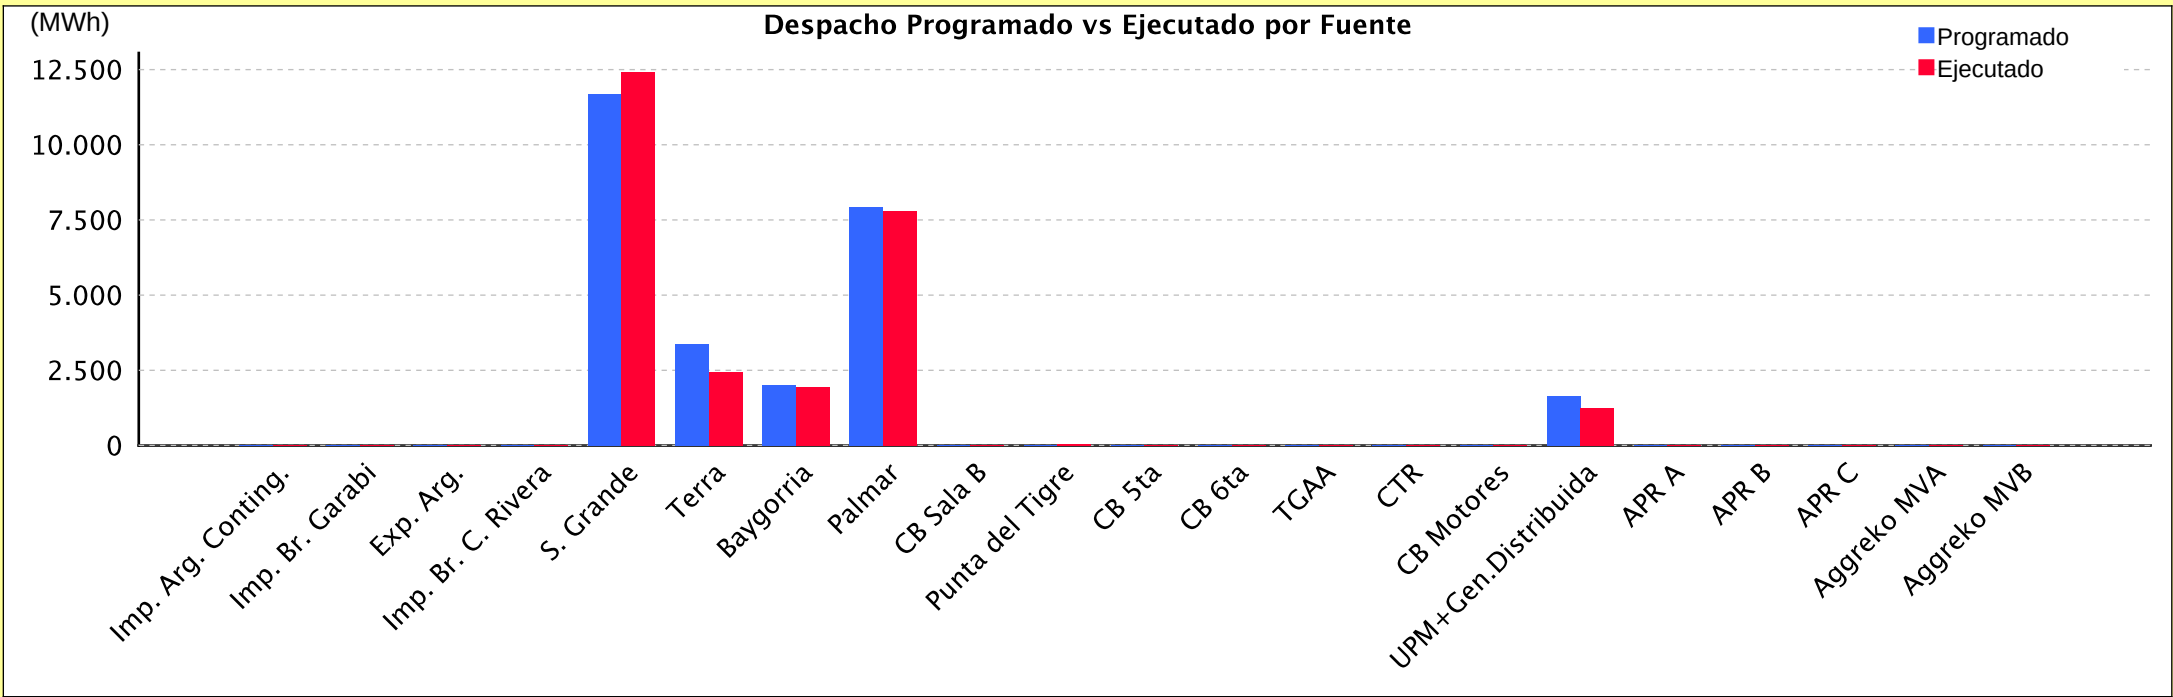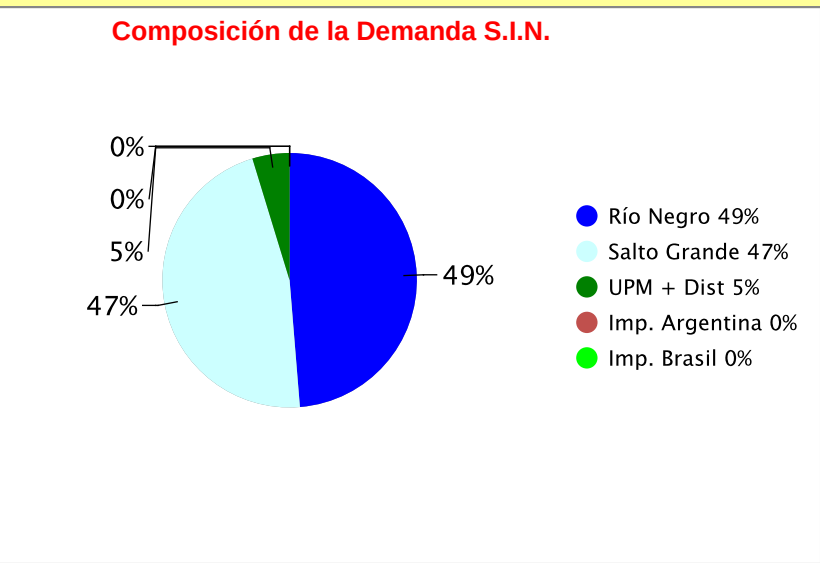



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

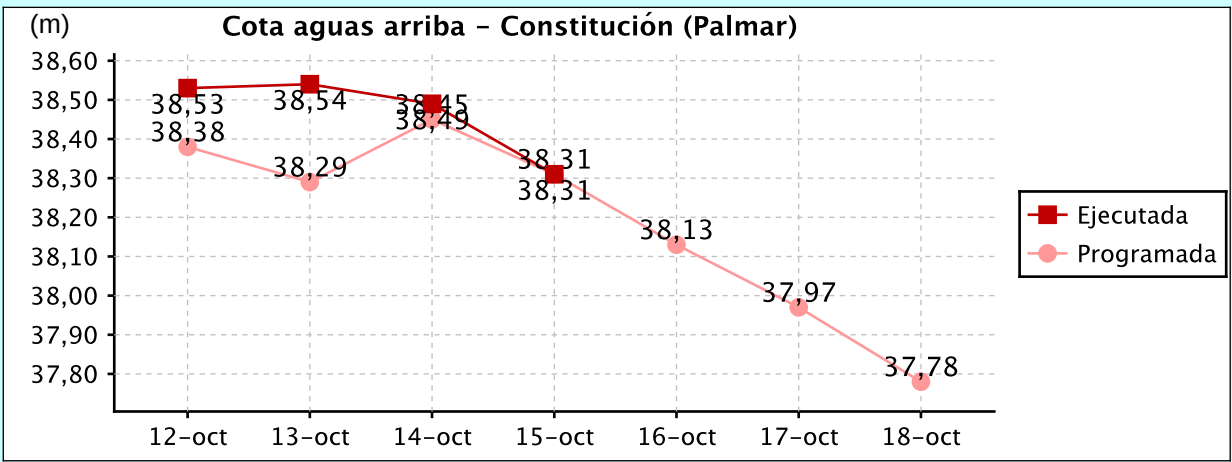
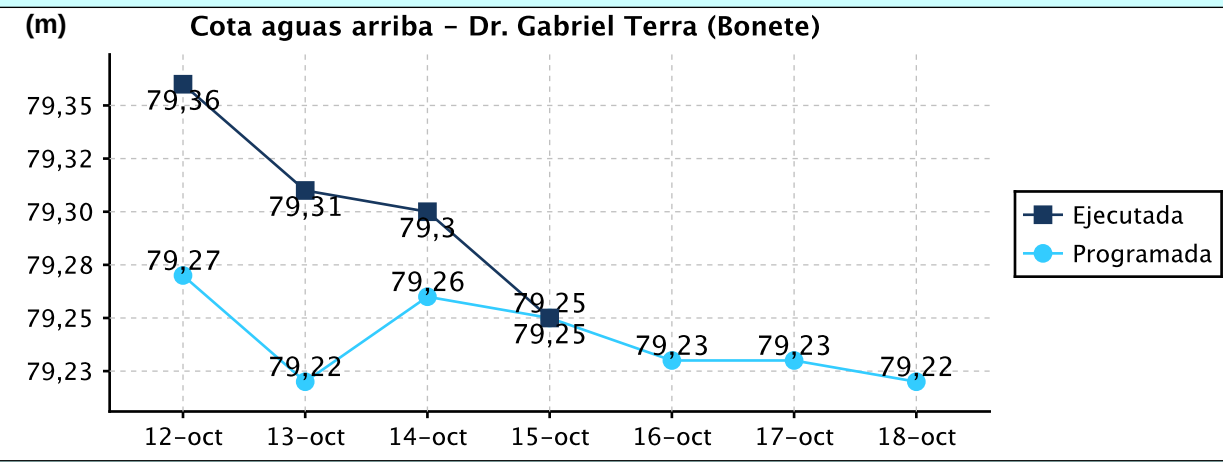


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,25	79,25
Baygorria	53,83	53,84
Palmar	38,31	38,31
SGU	33,48	33,51

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

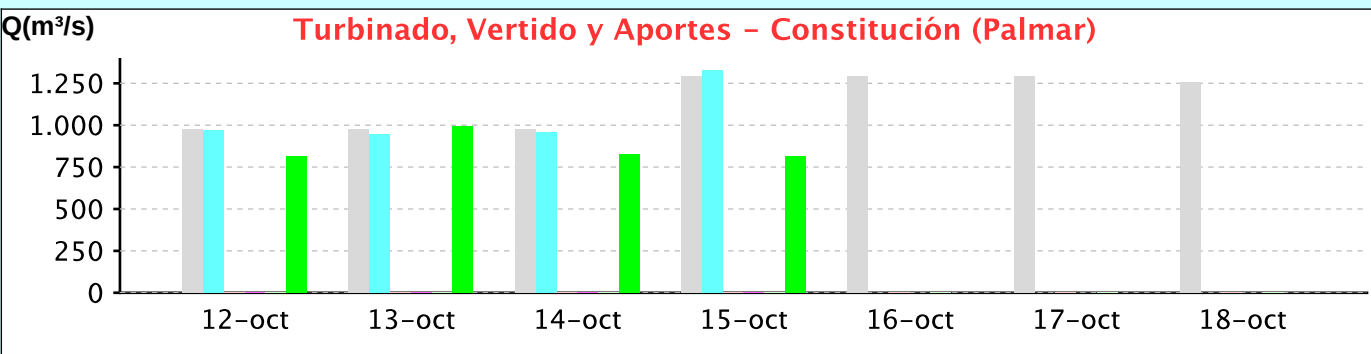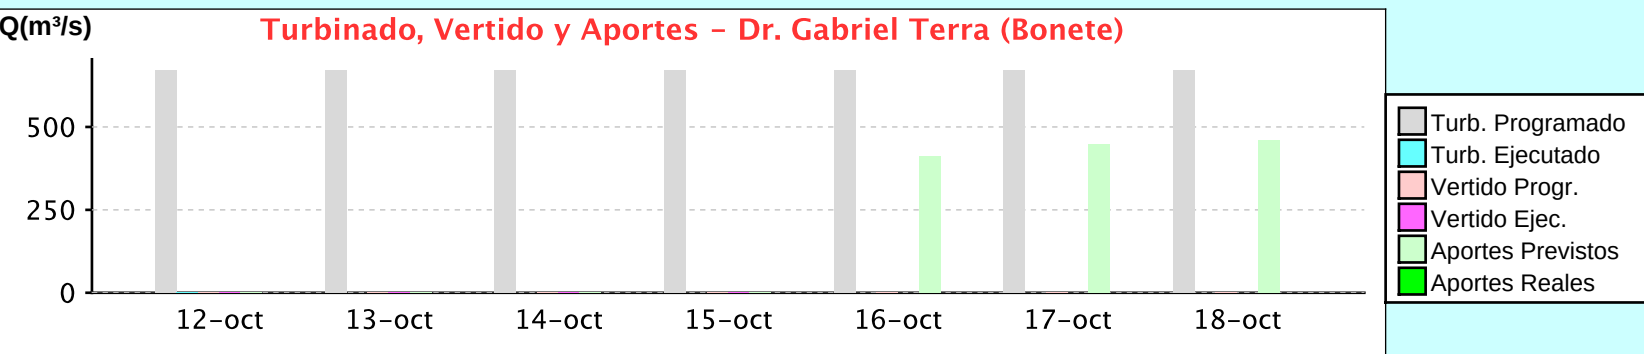

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

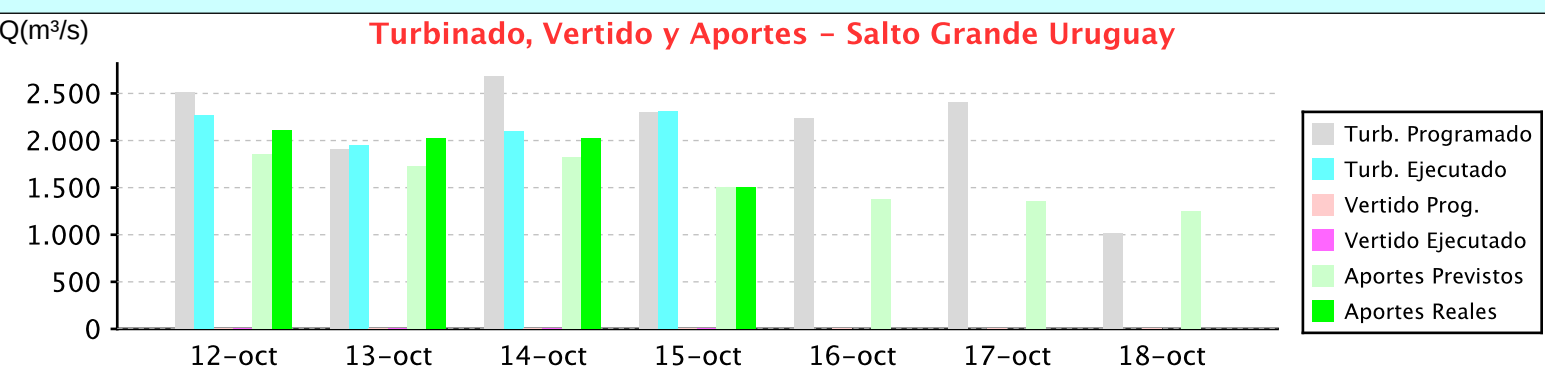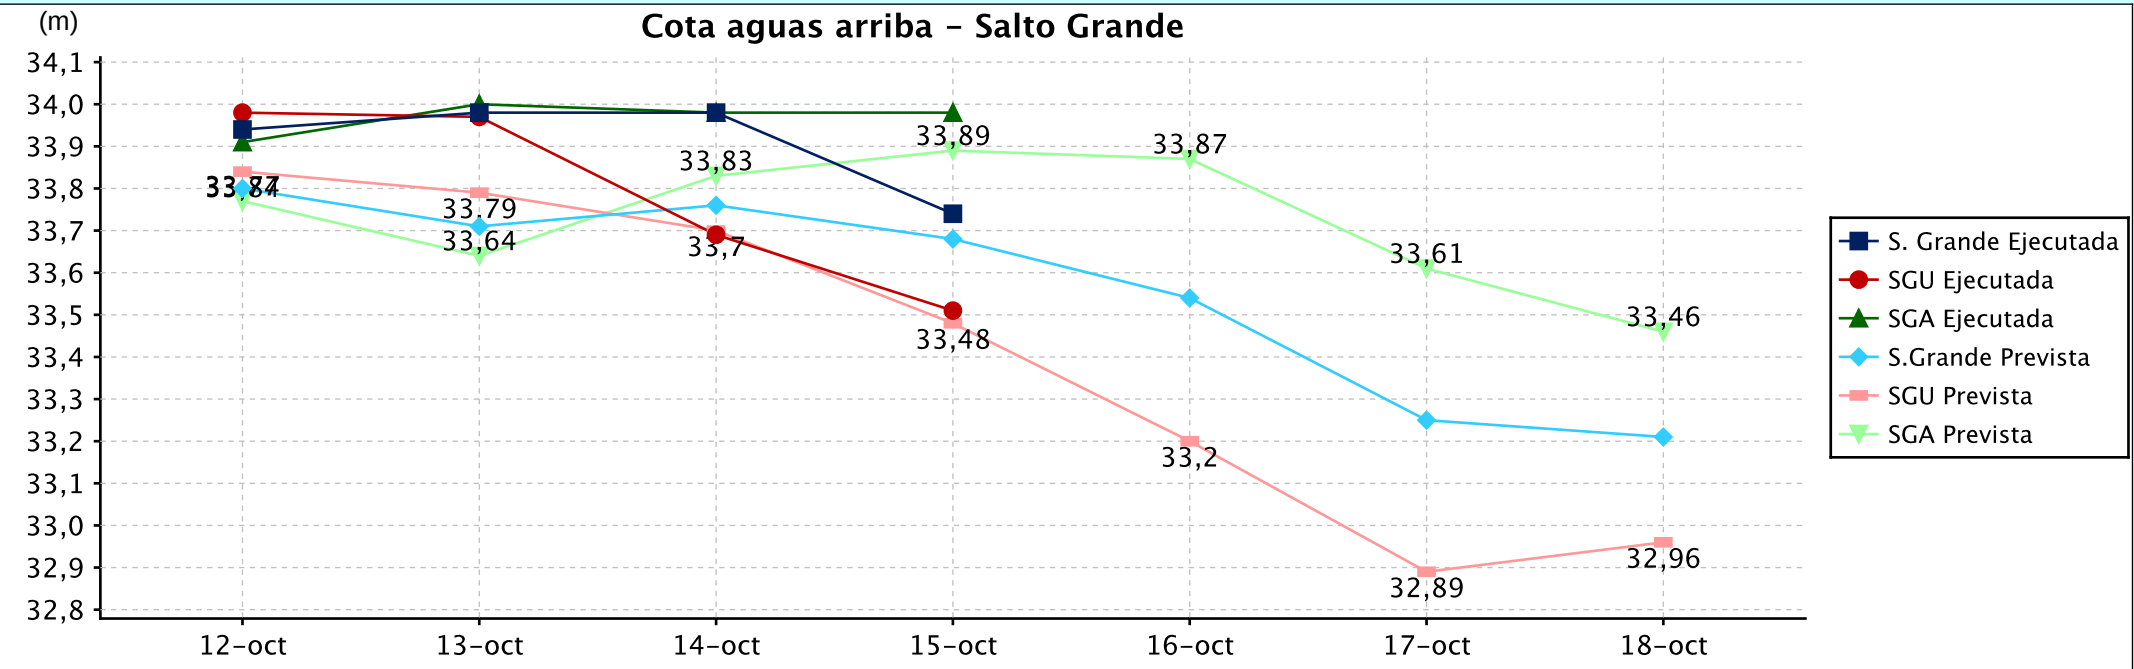

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,51
Cota Vista Arg	33,98
Cota real	33,74
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-9.435

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	670	
Baygorria	661	
Palmar	1.291	1.327
SGU	2.296	2.305

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	
Baygorria	0	
Palmar	0	815
SGU	1.500	1.502

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Debido a las medidas gremiales adoptadas en UTE, no se cuenta con la información de: picos de potencia (mínimo y medidía), turbinado ejecutado en Terra y Baygorria, aportes en Terra y Baygorria.
