




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 16 de octubre de 2013


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-84
Central P. del Tigre	90
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-1
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.266
C. Baygorria	1.993
C. Palmar	6.811
C. Salto Grande	13.684
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	636
TOTAL Generación	26.386

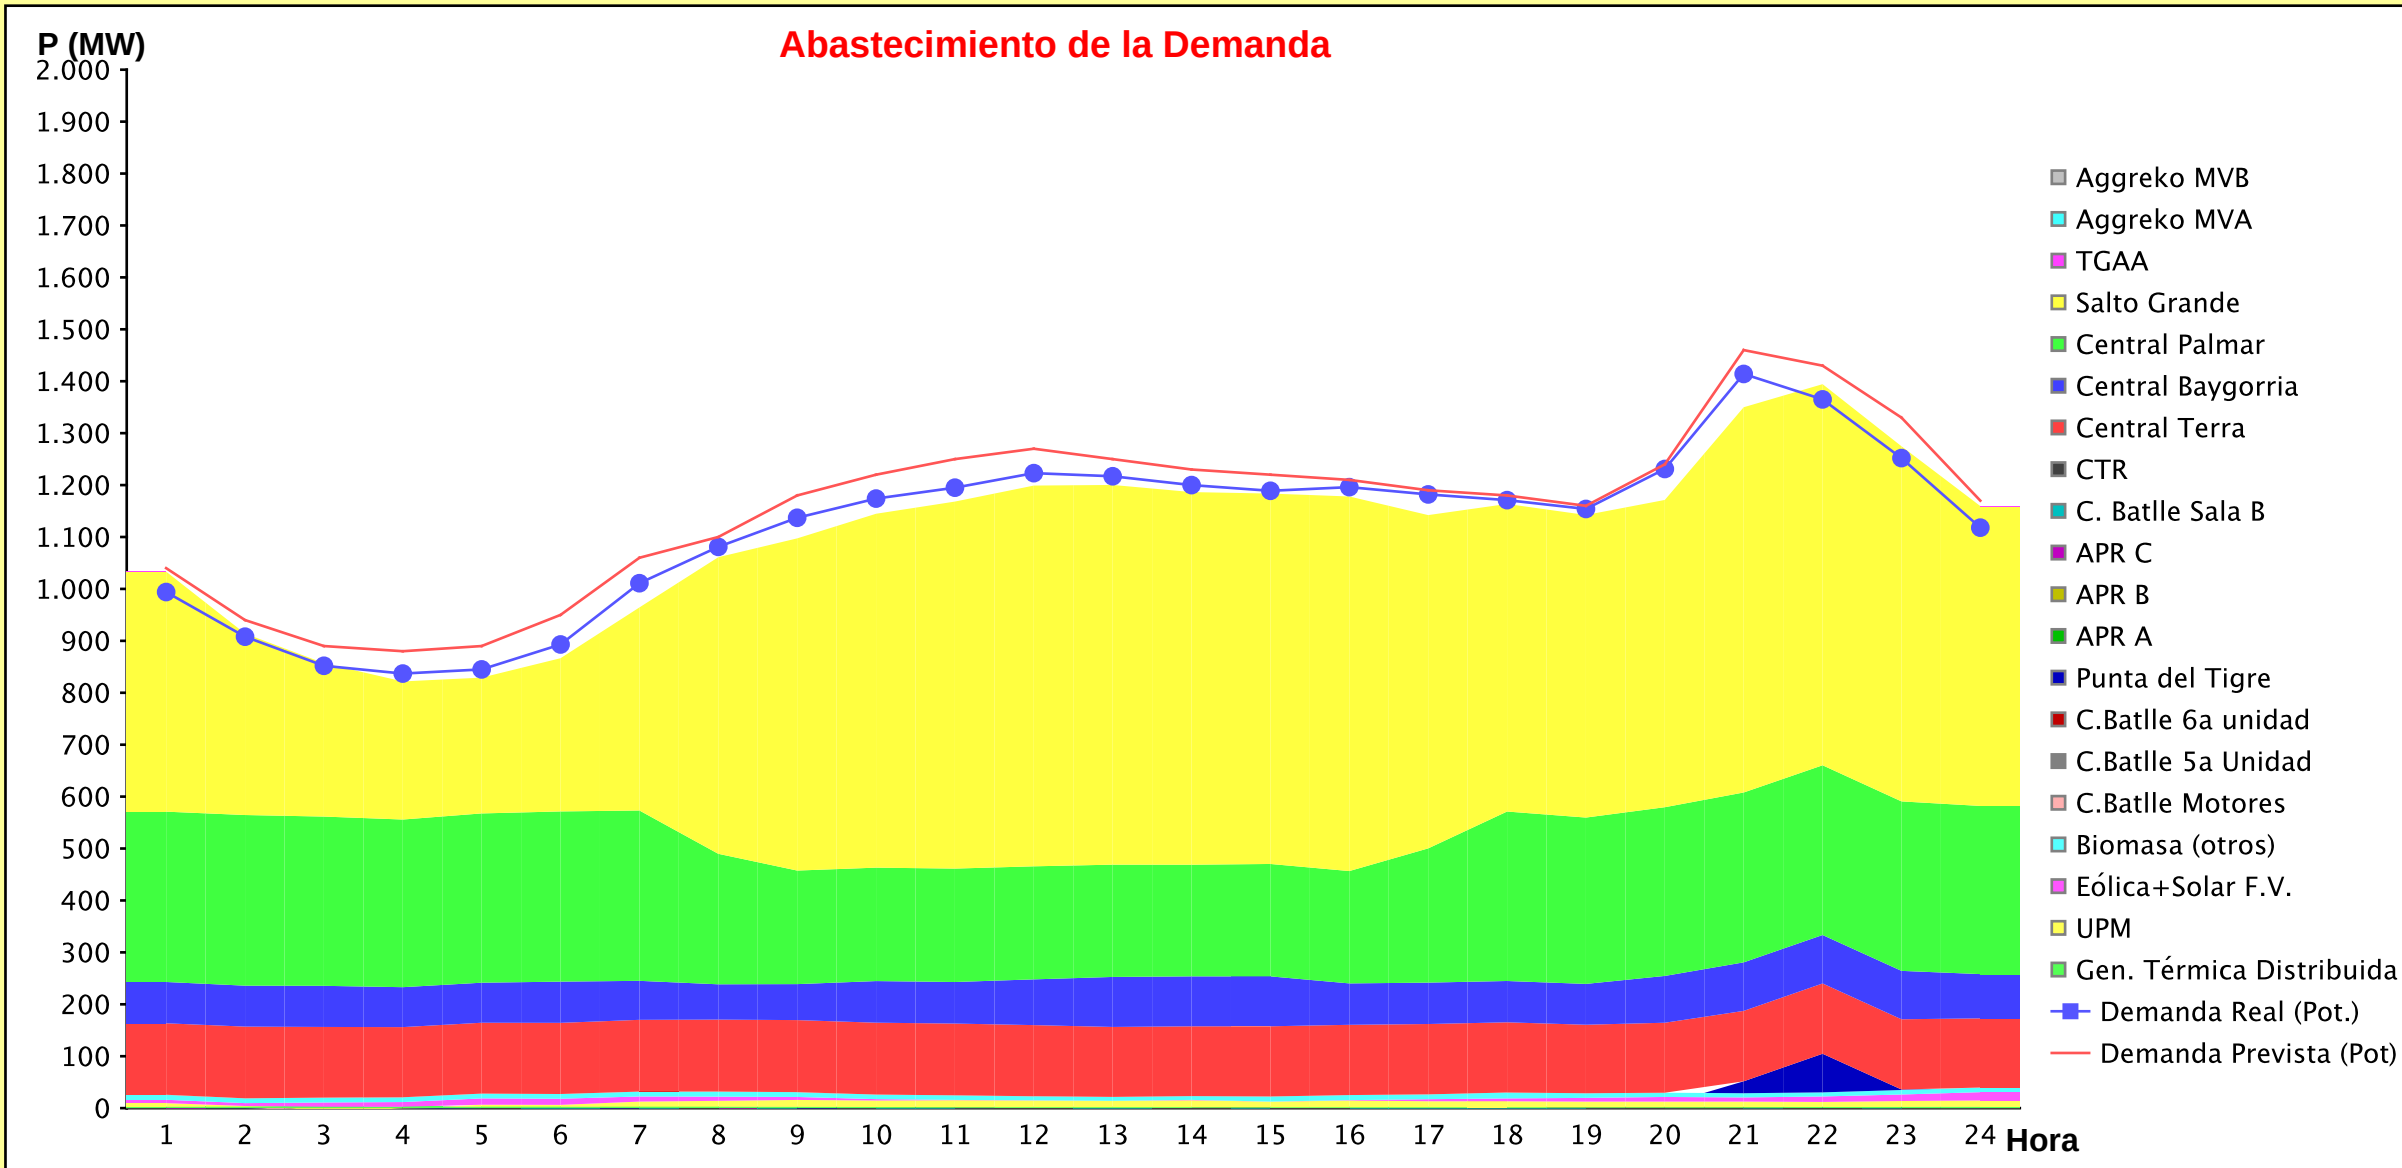

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.386
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.740
Diferencia (MWh)	-1.354
Ejecutada - Programada	-4,88 %

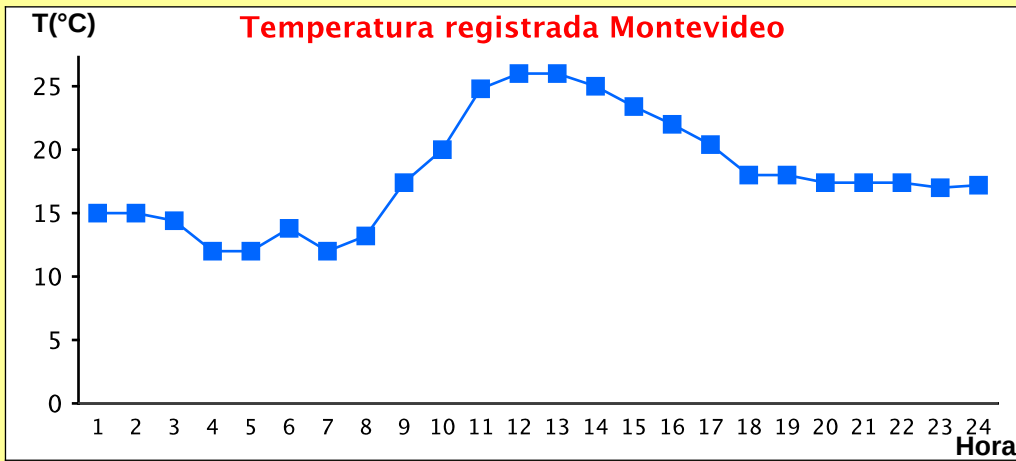



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1264,84 Hora 11:52
Potencia mínima:	851,08 Hora 04:10
Pico noche:	1446,81 Hora 21:18

Generación Media (MW)	
Eólica	6,6
Biomasa	23,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	2,2
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

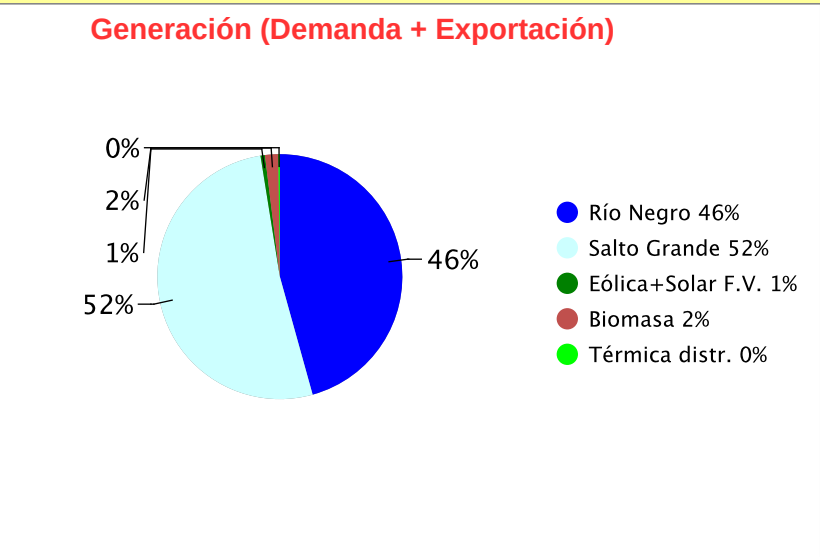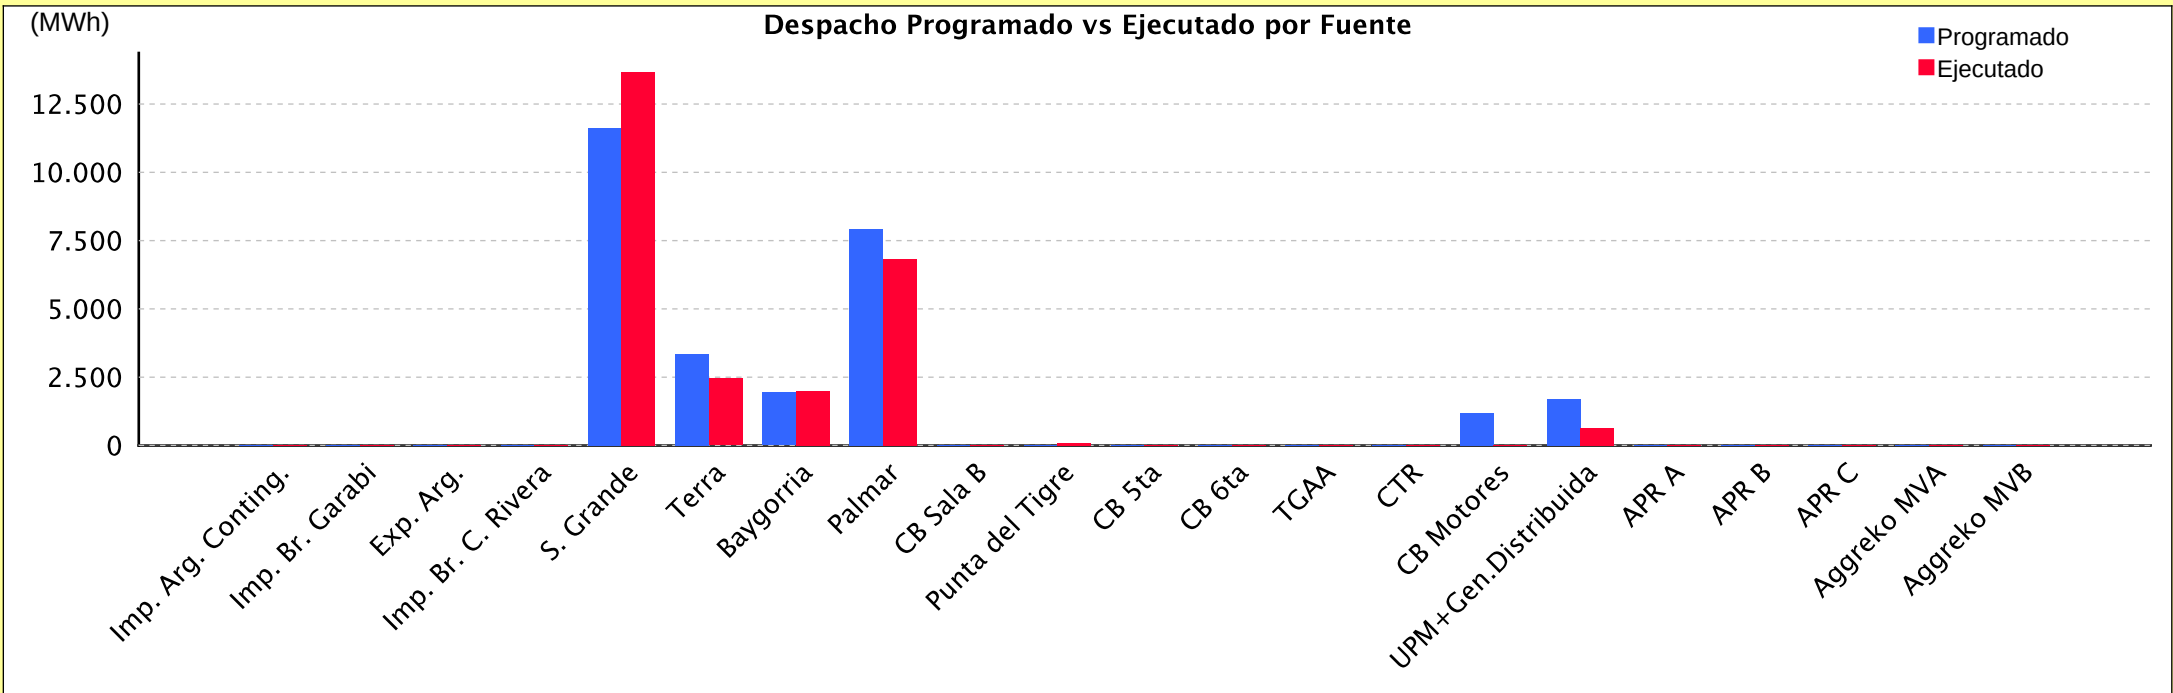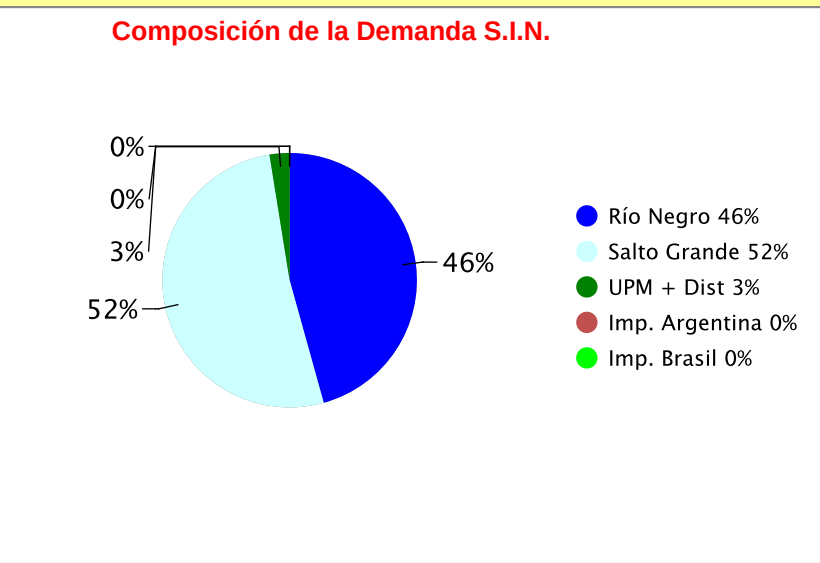



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

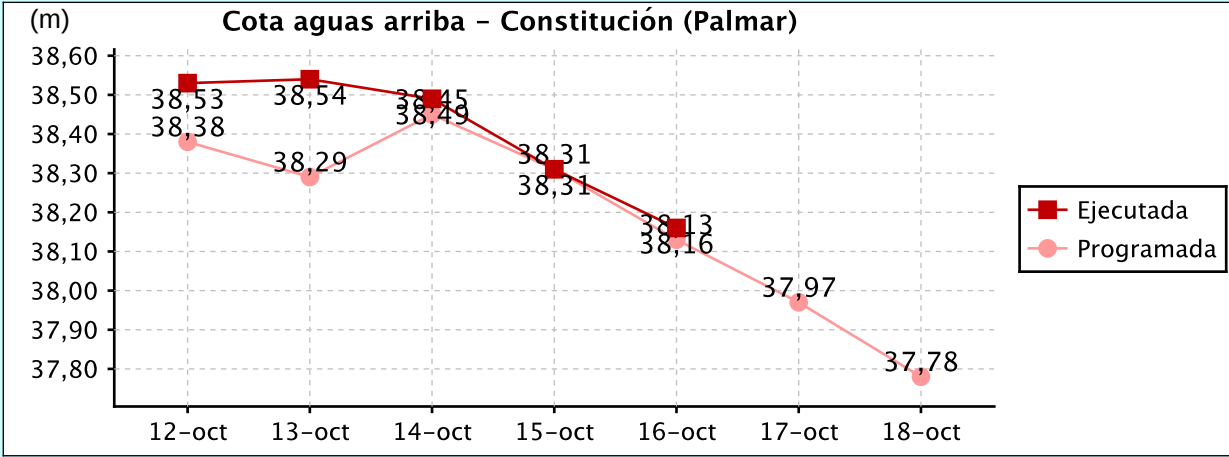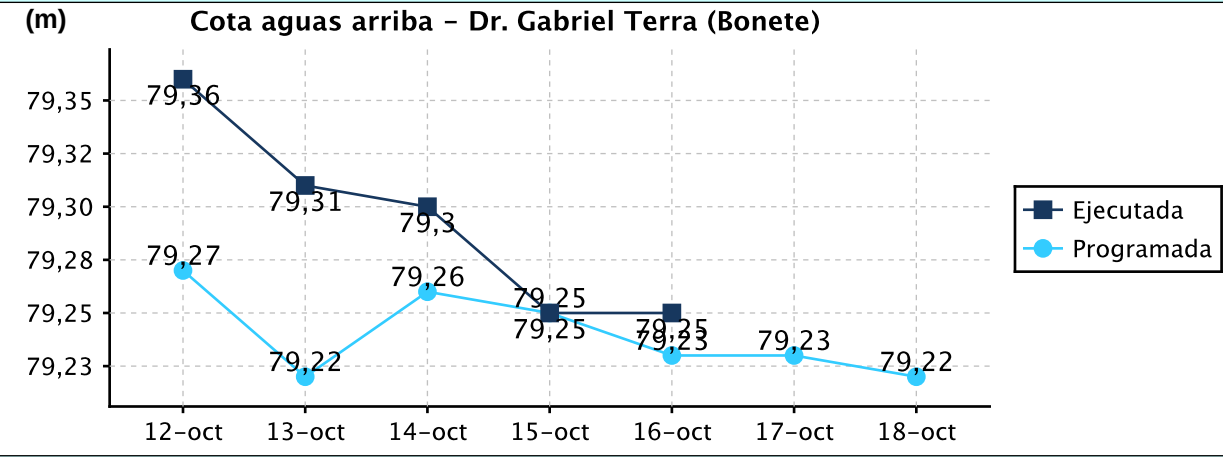


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,23	79,25
Baygorria	53,84	53,87
Palmar	38,13	38,16
SGU	33,20	33,07

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

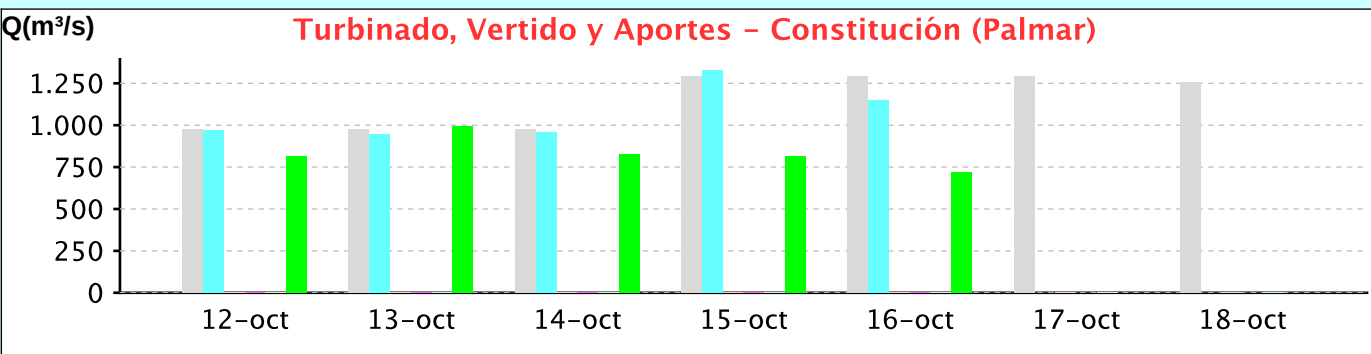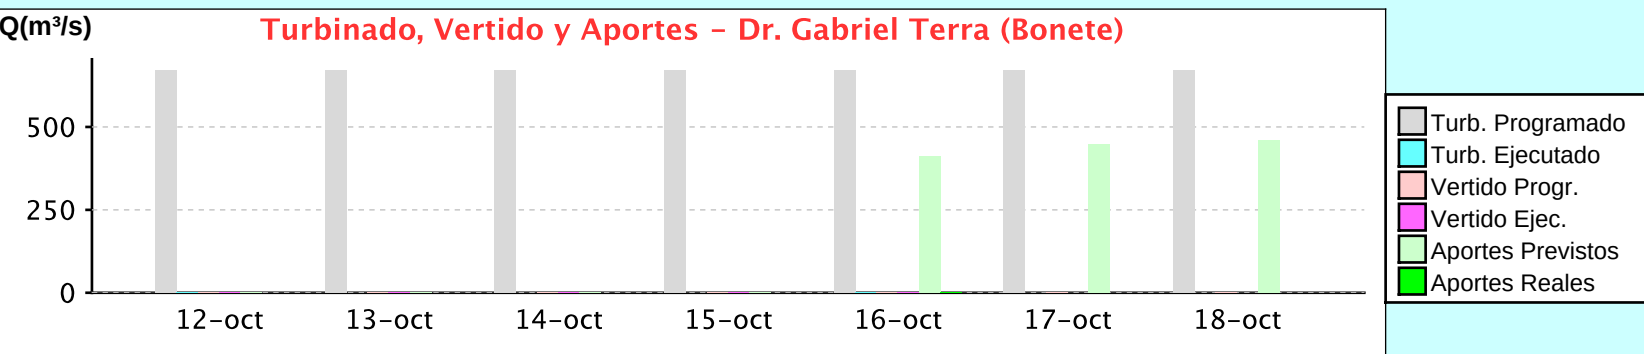

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

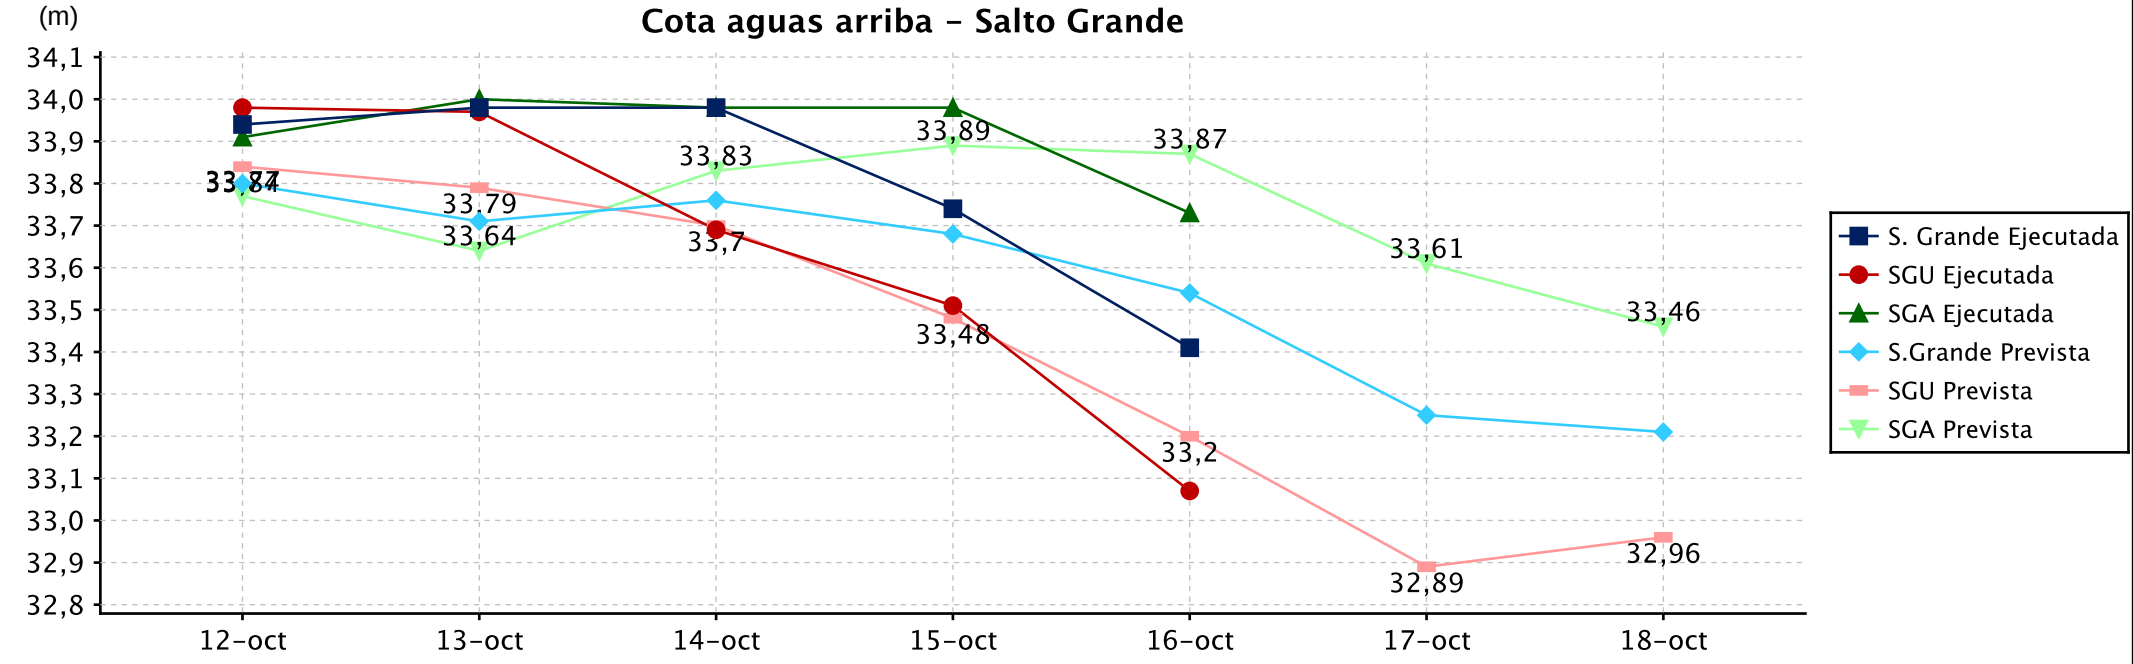


TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	670	0
Baygorria	642	0
Palmar	1.291	1.151
SGU	2.238	2.656

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	411	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	720
SGU	1.375	1.375

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

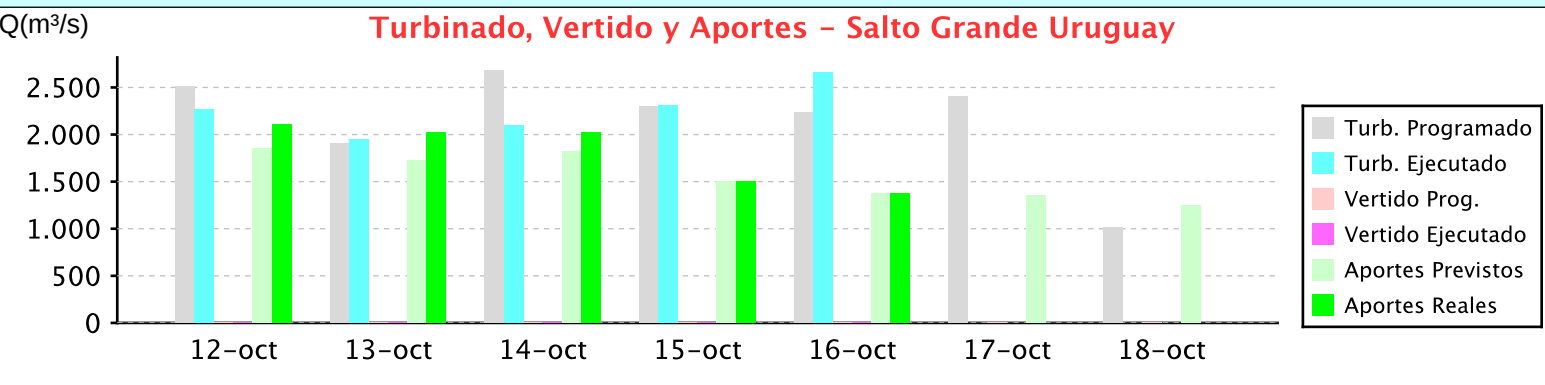

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,07
Cota Vista Arg	33,73
Cota real	33,41
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-12.584

OBSERVACIONES
