



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



jueves 17 de octubre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-87
Central P. del Tigre	2.514
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-1
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.225
C. Baygorria	2.013
C. Palmar	7.827
C. Salto Grande	9.761
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.364
TOTAL Generación	26.607

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.607
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.650
Diferencia (MWh)	-1.043
Ejecutada - Programada	-3,77 %

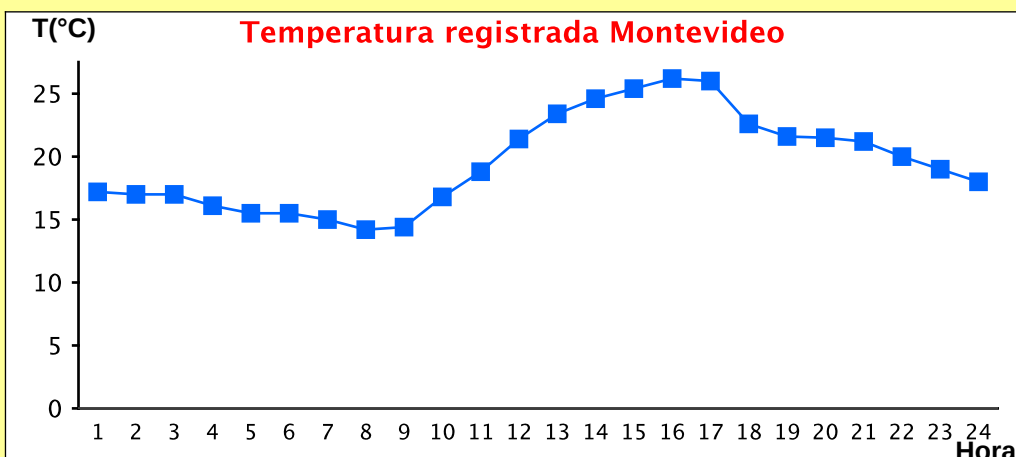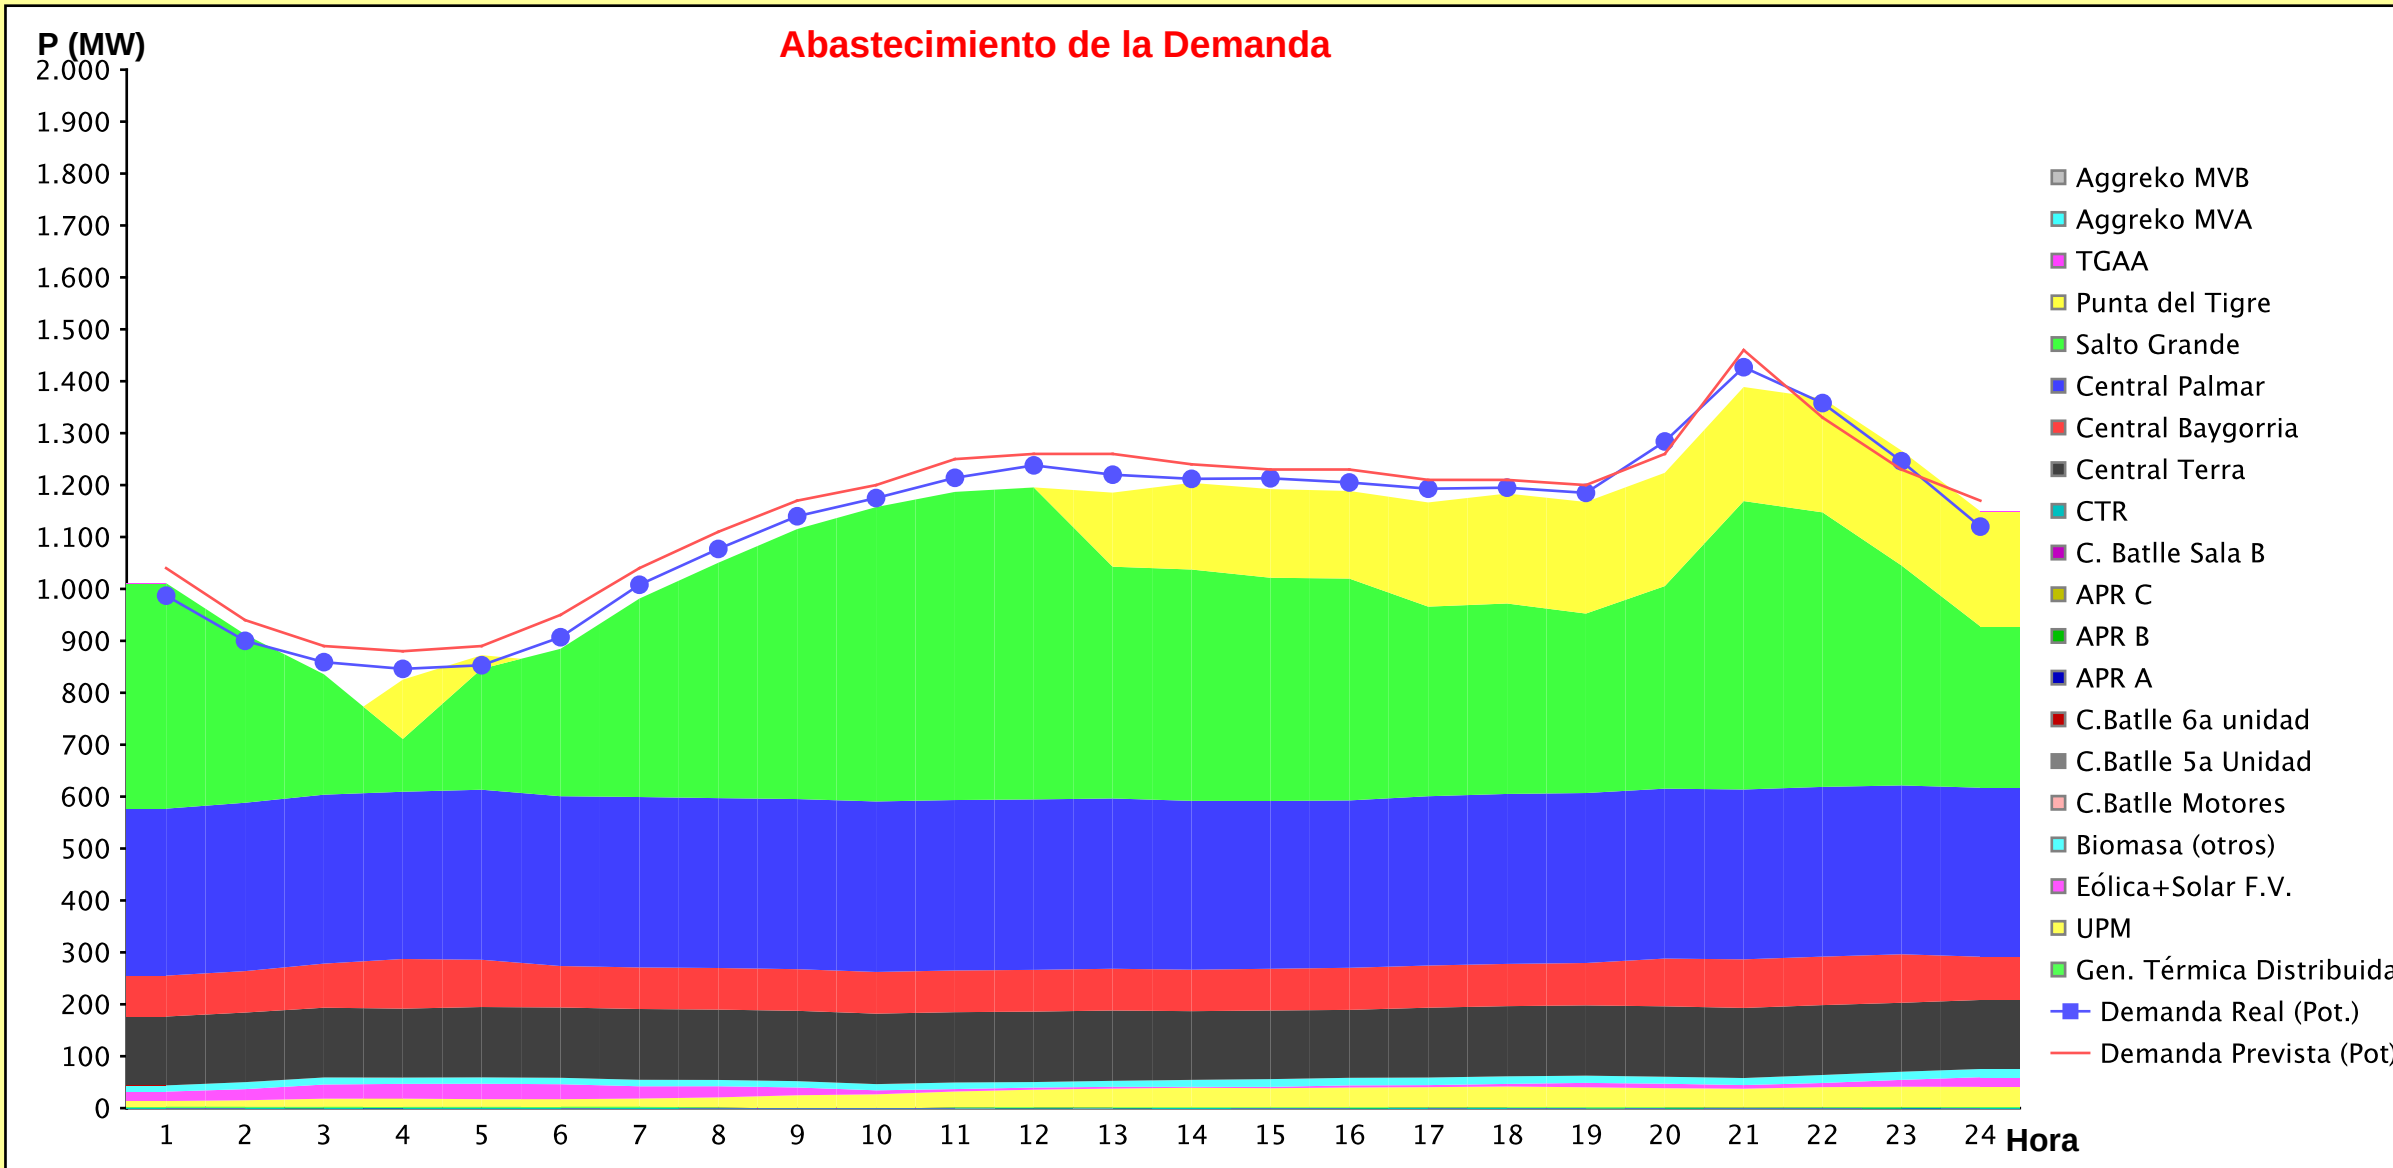



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1277,96 Hora 11:44
Potencia mínima:	845,69 Hora 04:09
Pico noche:	1463,52 Hora 20:49

Generación Media (MW)	
Eólica	13,4
Biomasa	46,4
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	1,9
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

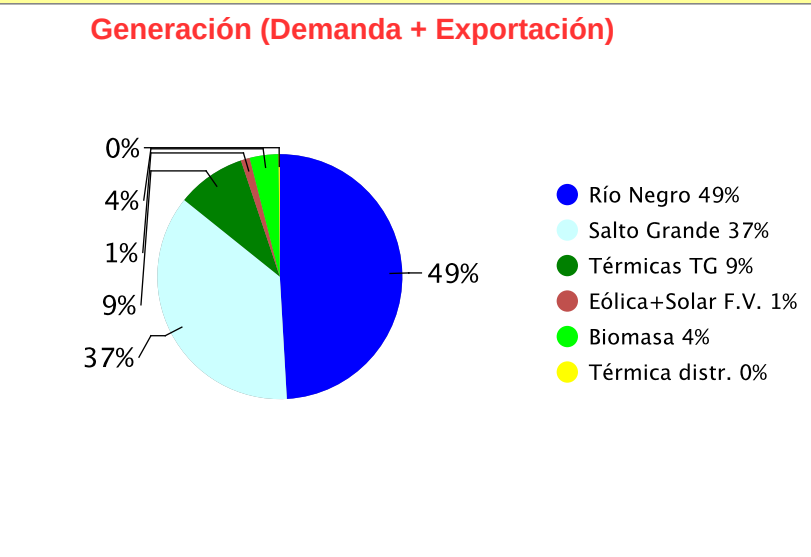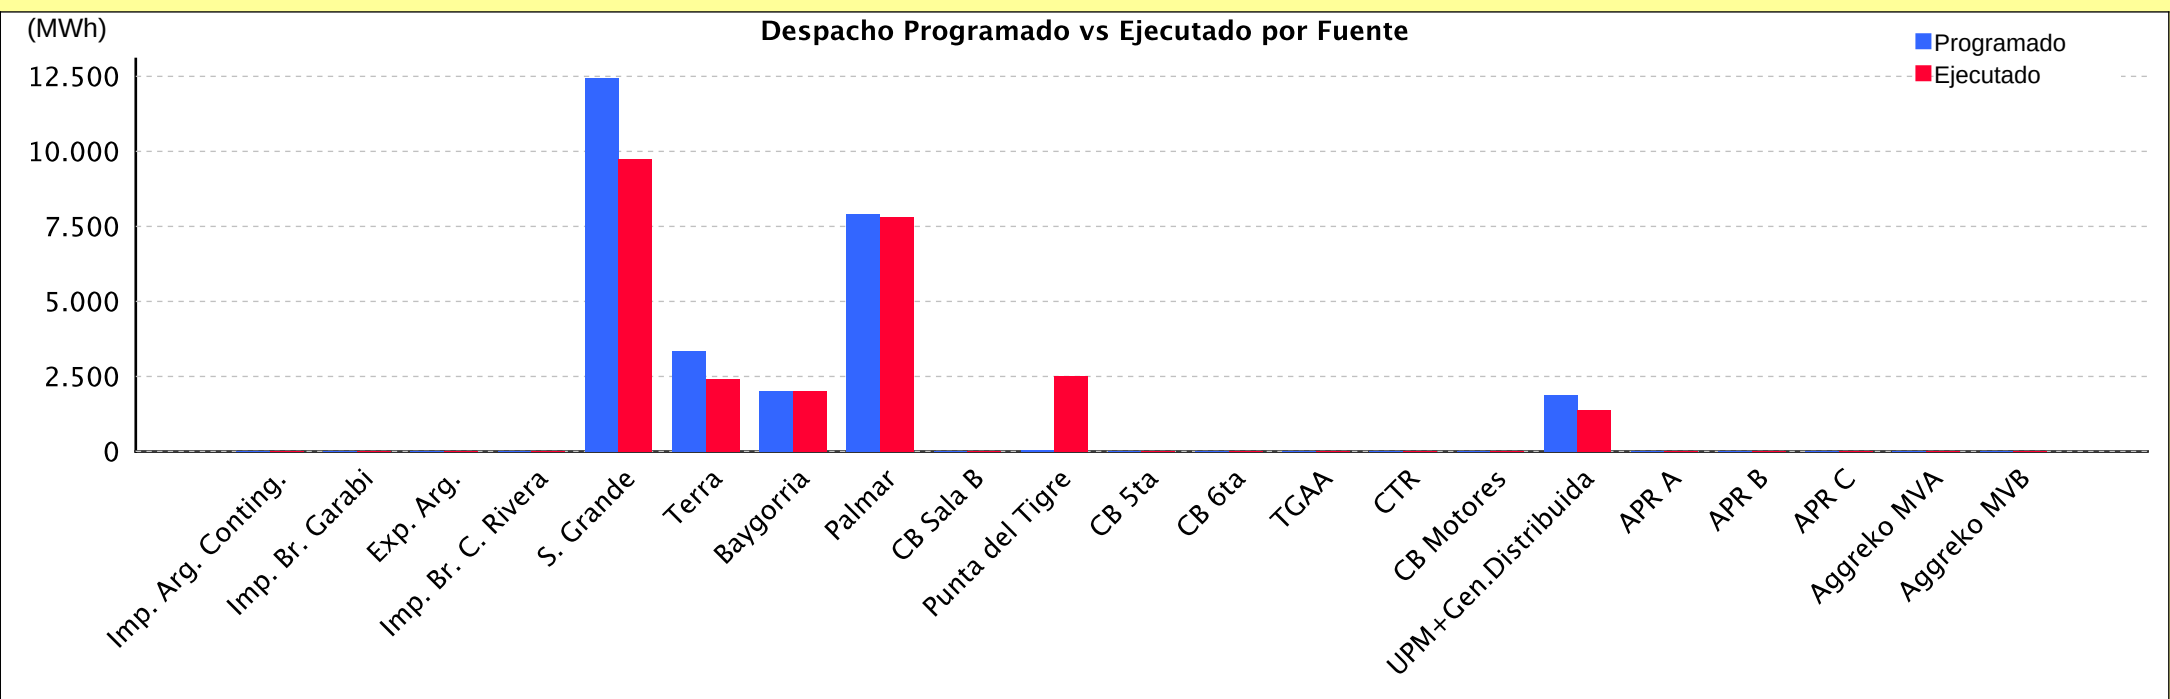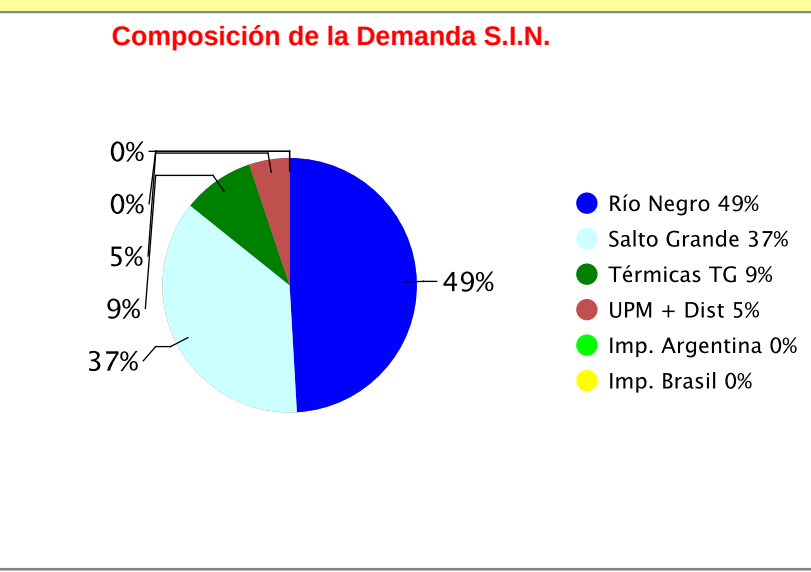



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

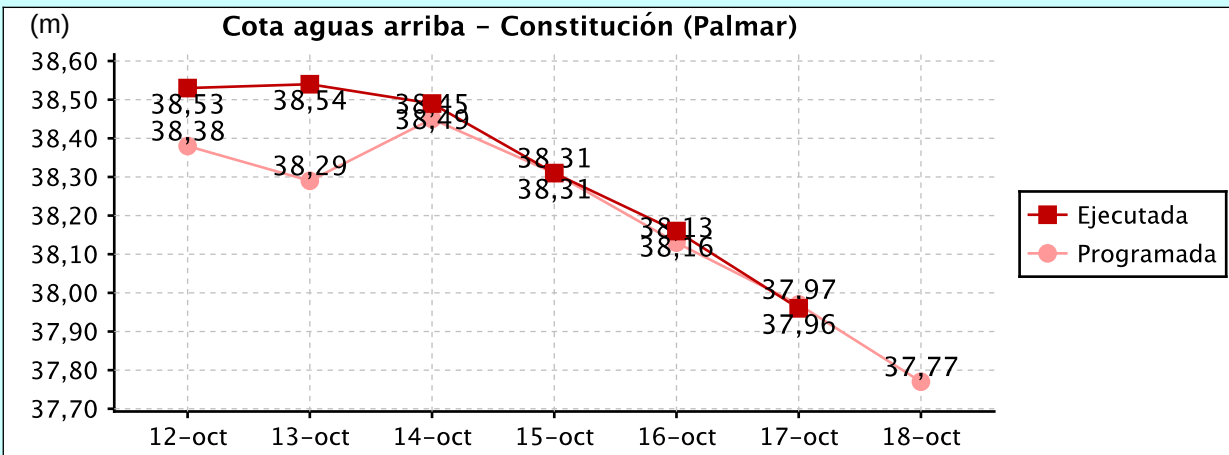
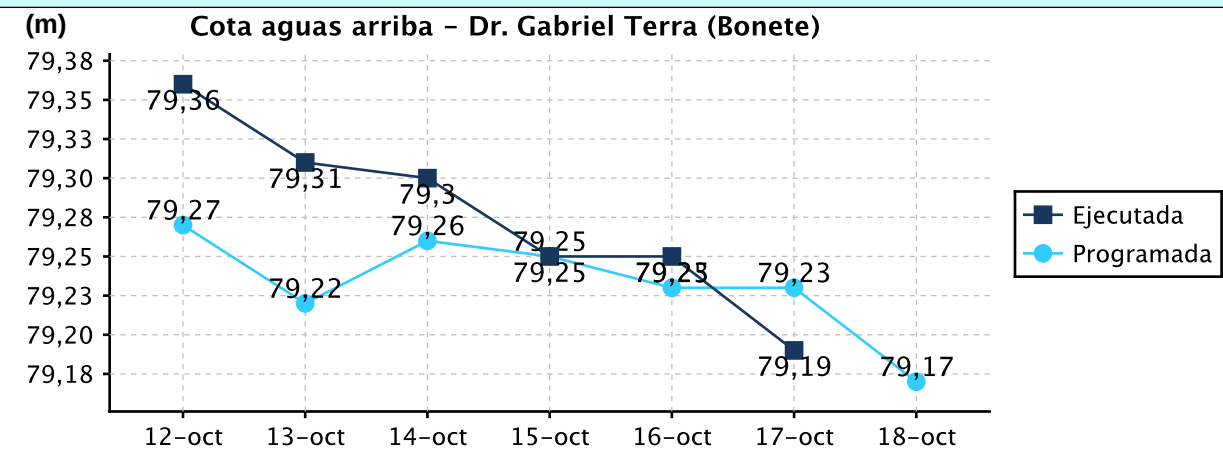


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,23	79,19
Baygorria	53,87	53,88
Palmar	37,97	37,96
SGU	32,89	32,94

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

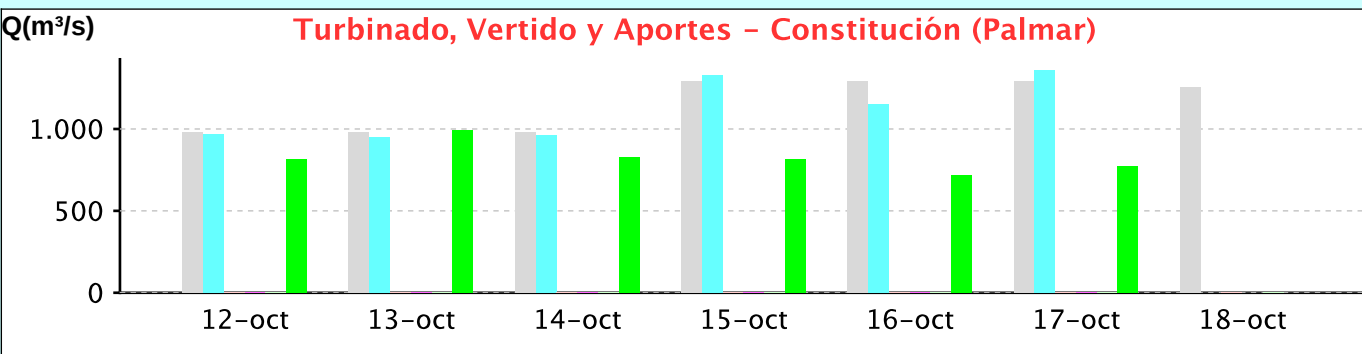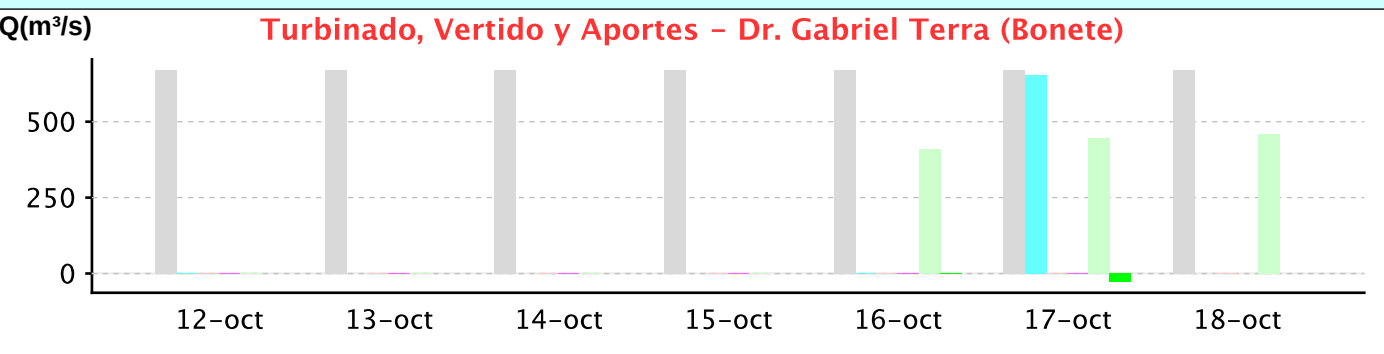

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

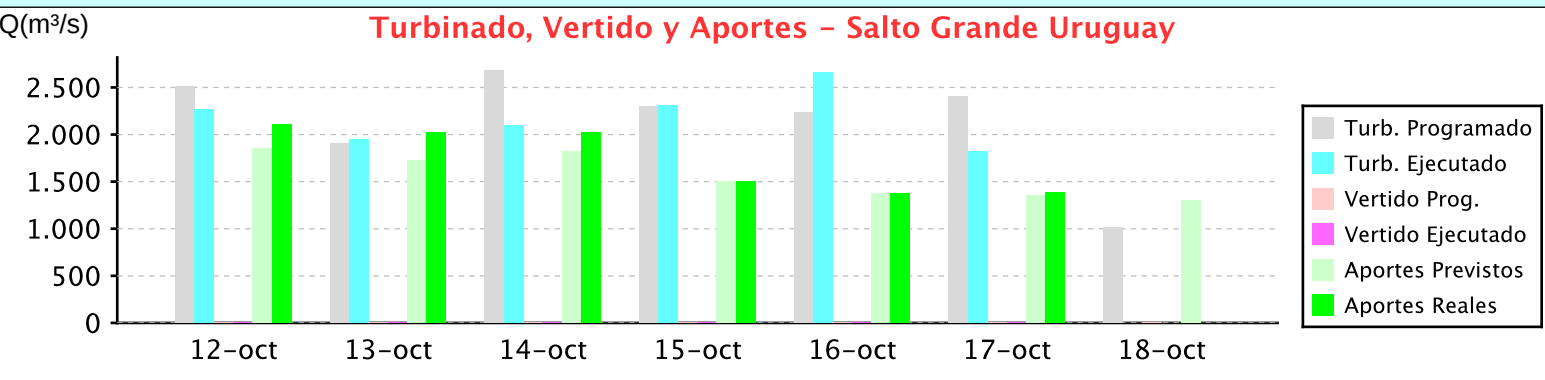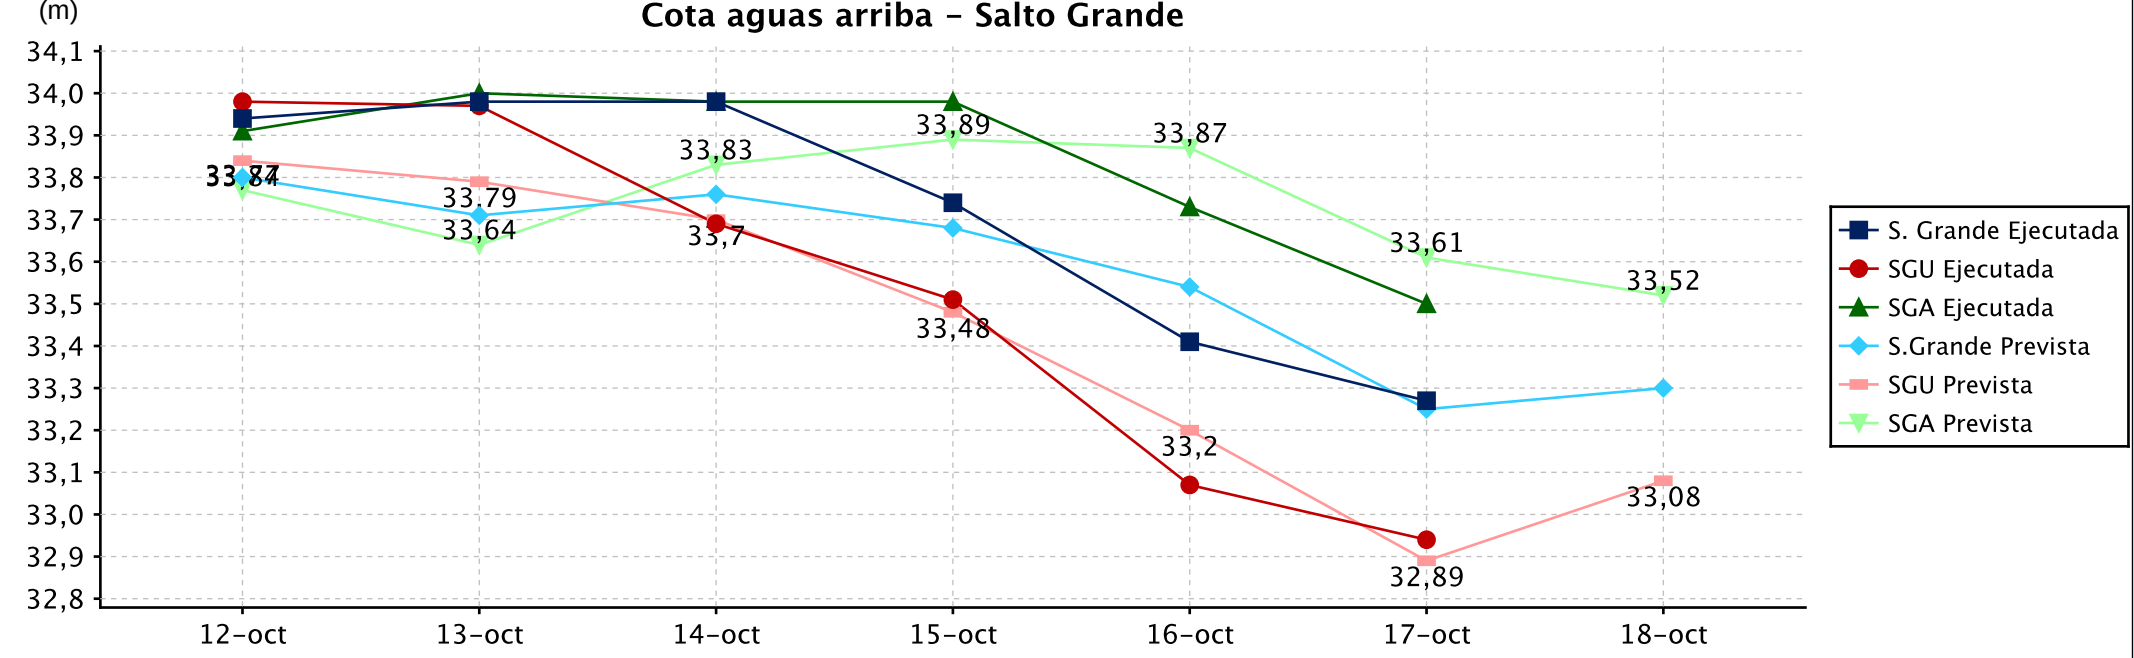

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	32,94
Cota Vista Arg	33,50
Cota real	33,27

Dif. Energ. (U-A)	
Acumulado MWh	-11.372

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	670	654
Baygorria	661	0
Palmar	1.291	1.357
SGU	2.408	1.820

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	447	-28
Baygorria	0	0
Palmar	0	775
SGU	1.350	1.386

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
