



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



viernes 18 de octubre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	657
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	193
Motores	468
Central La Tablada	-89
Central P. del Tigre	5.134
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-1
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.259
C. Baygorria	1.984
C. Palmar	7.625
C. Salto Grande	6.269
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.706
TOTAL Generación	26.540

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.540
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.420
Diferencia (MWh)	-880
Ejecutada - Programada	-3,21 %

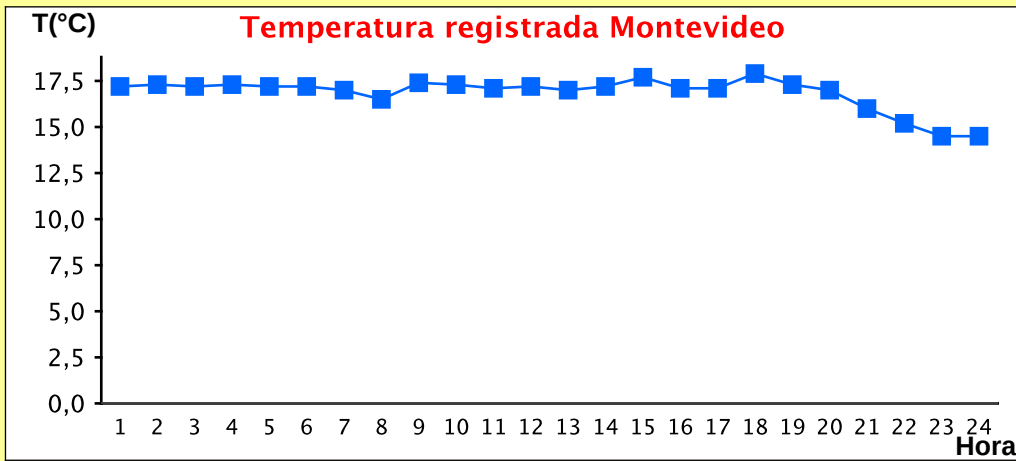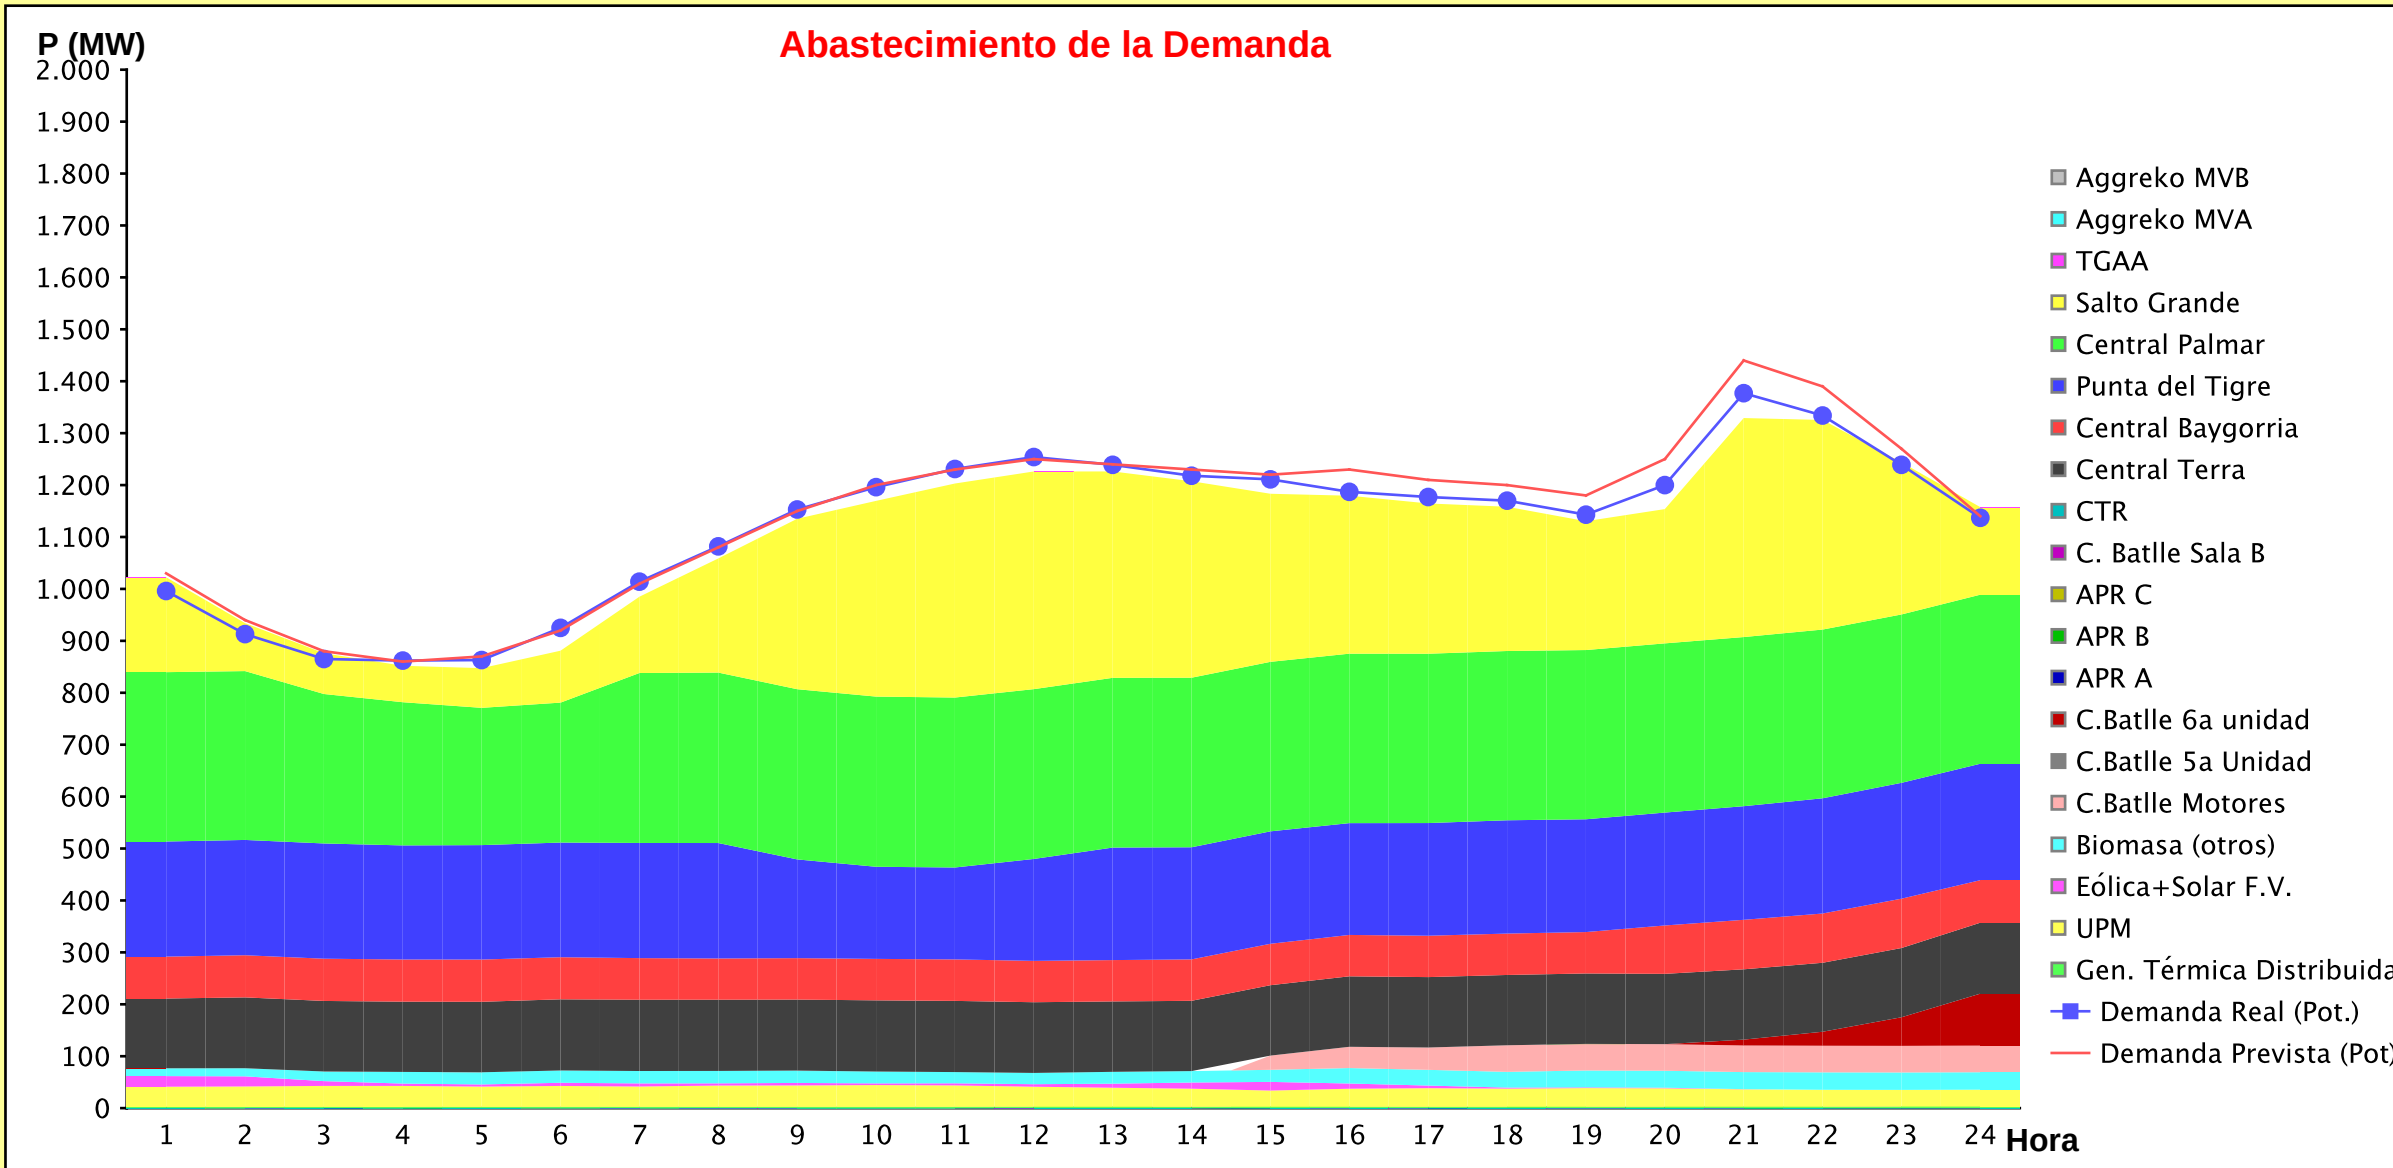



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1298 Hora 11:39
Potencia mínima:	879,93 Hora 03:29
Pico noche:	1418,53 Hora 20:56

Generación Media (MW)	
Eólica	6,5
Biomasa	67,3
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	2,5
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

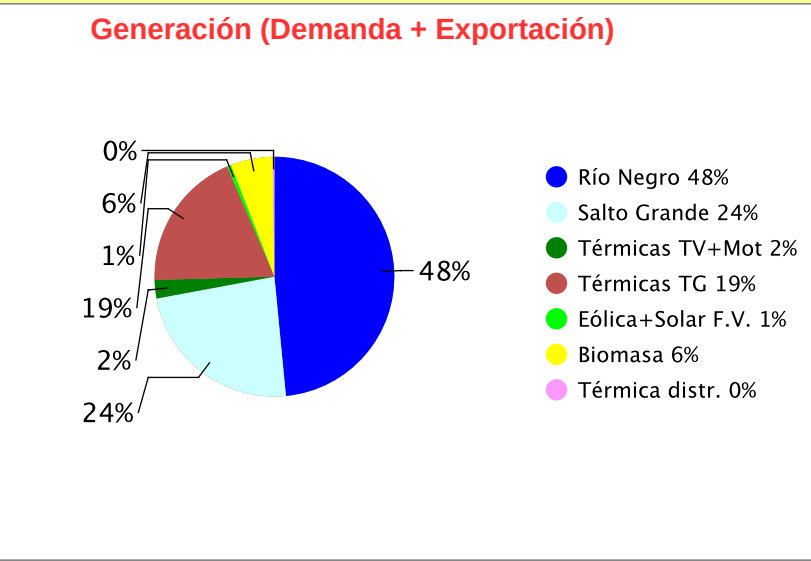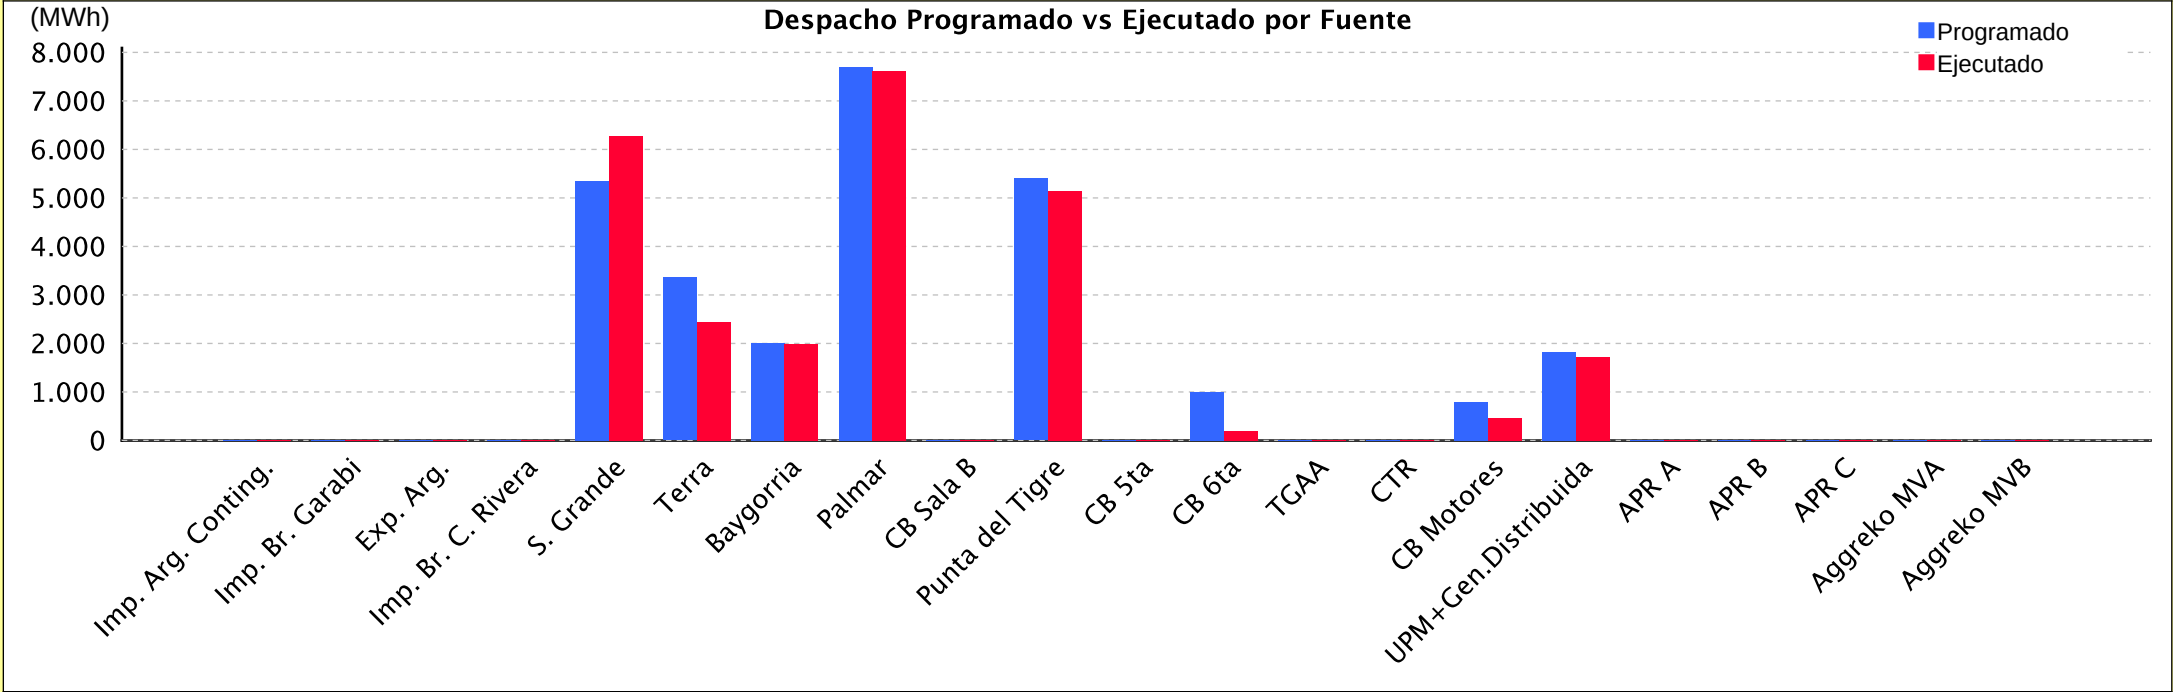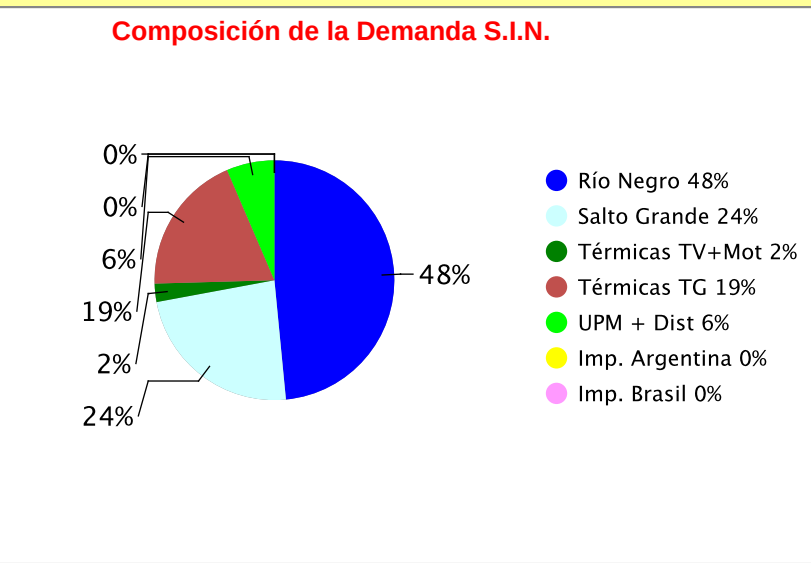



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

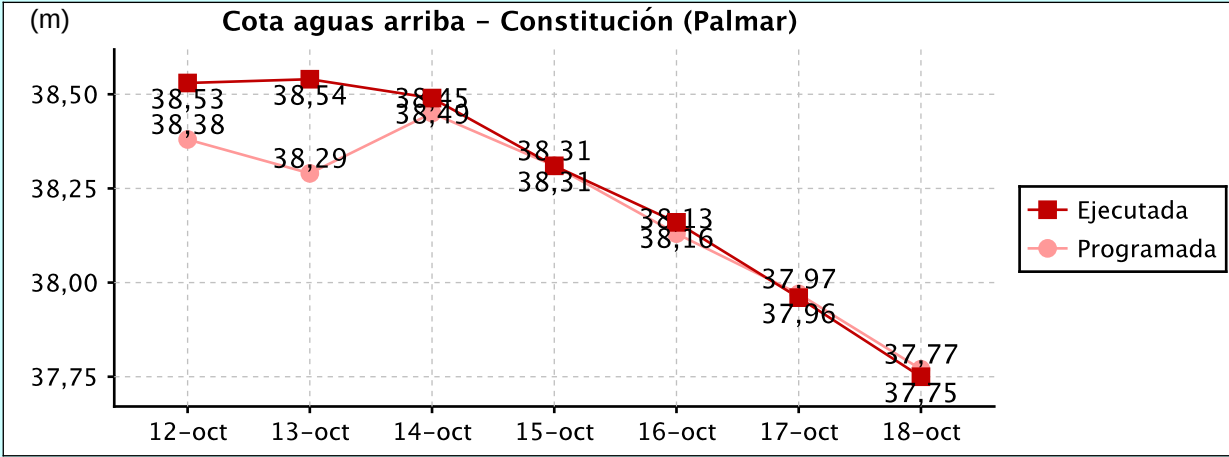
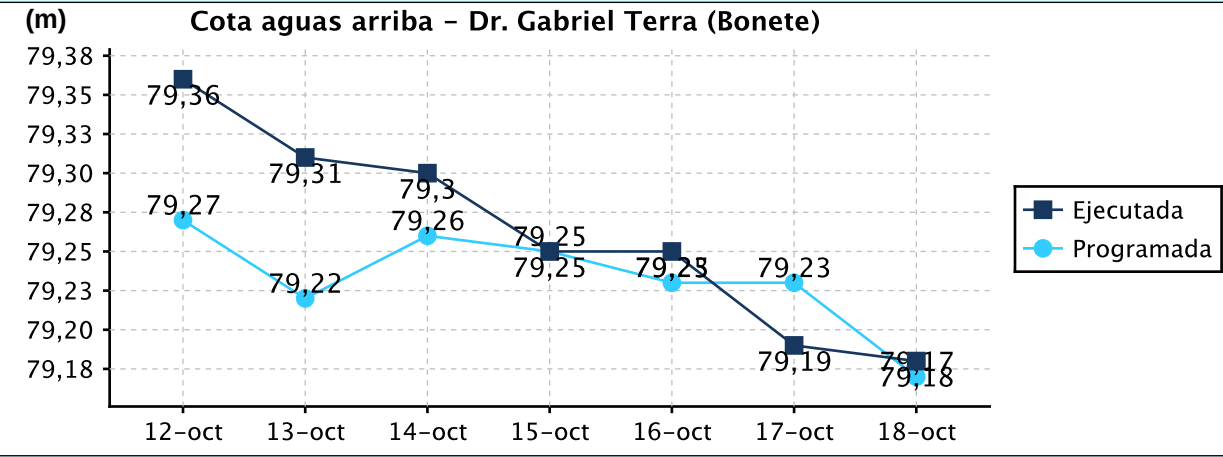


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,17	79,18
Baygorria	53,88	53,92
Palmar	37,77	37,75
SGU	33,08	32,96

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

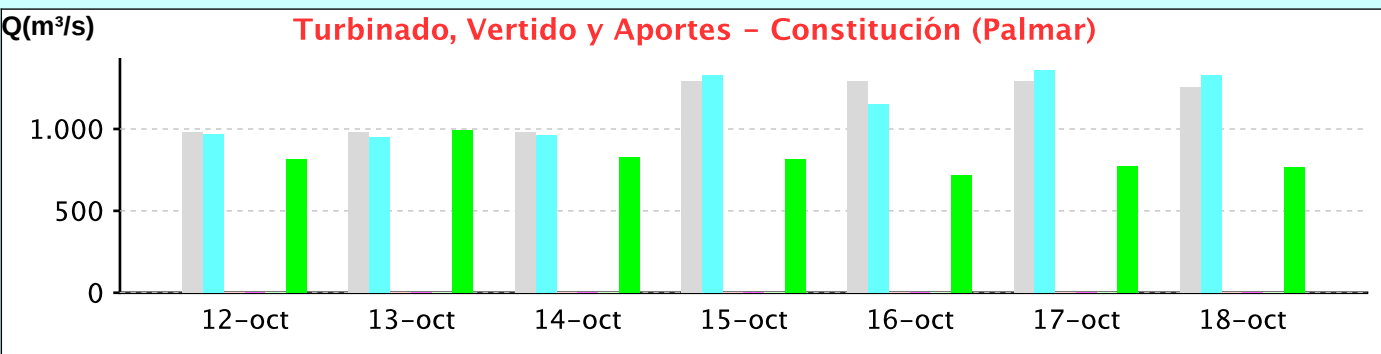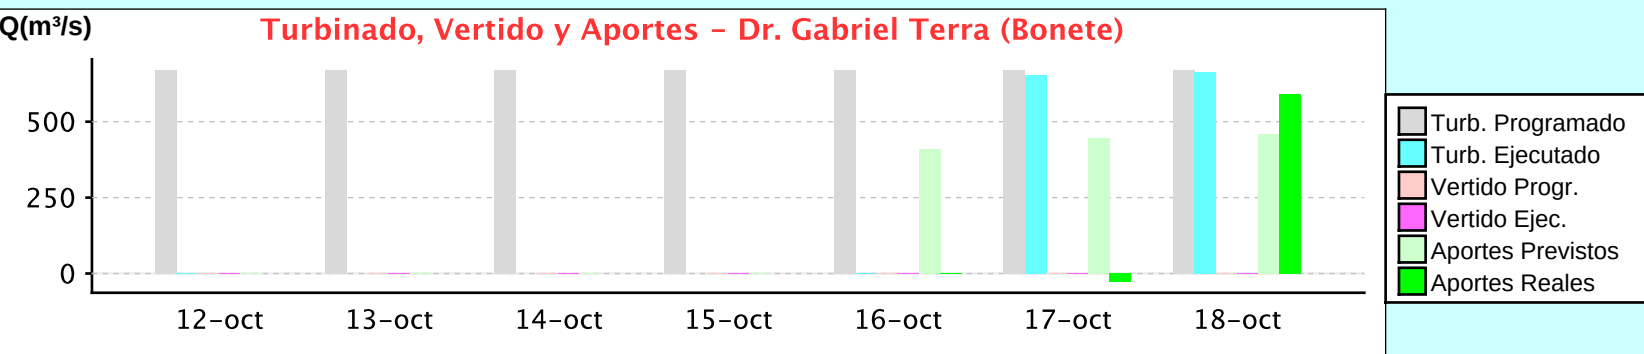

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

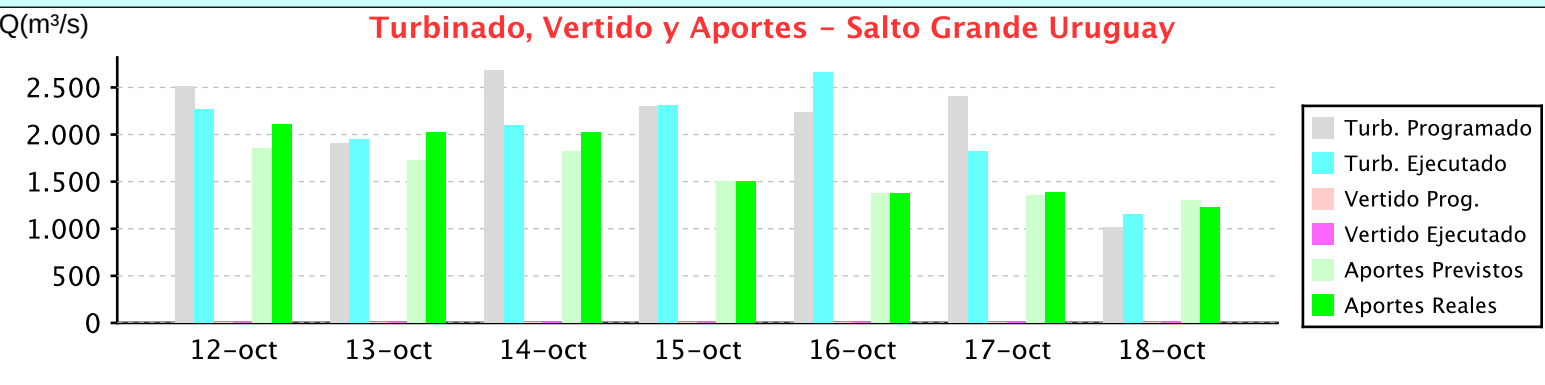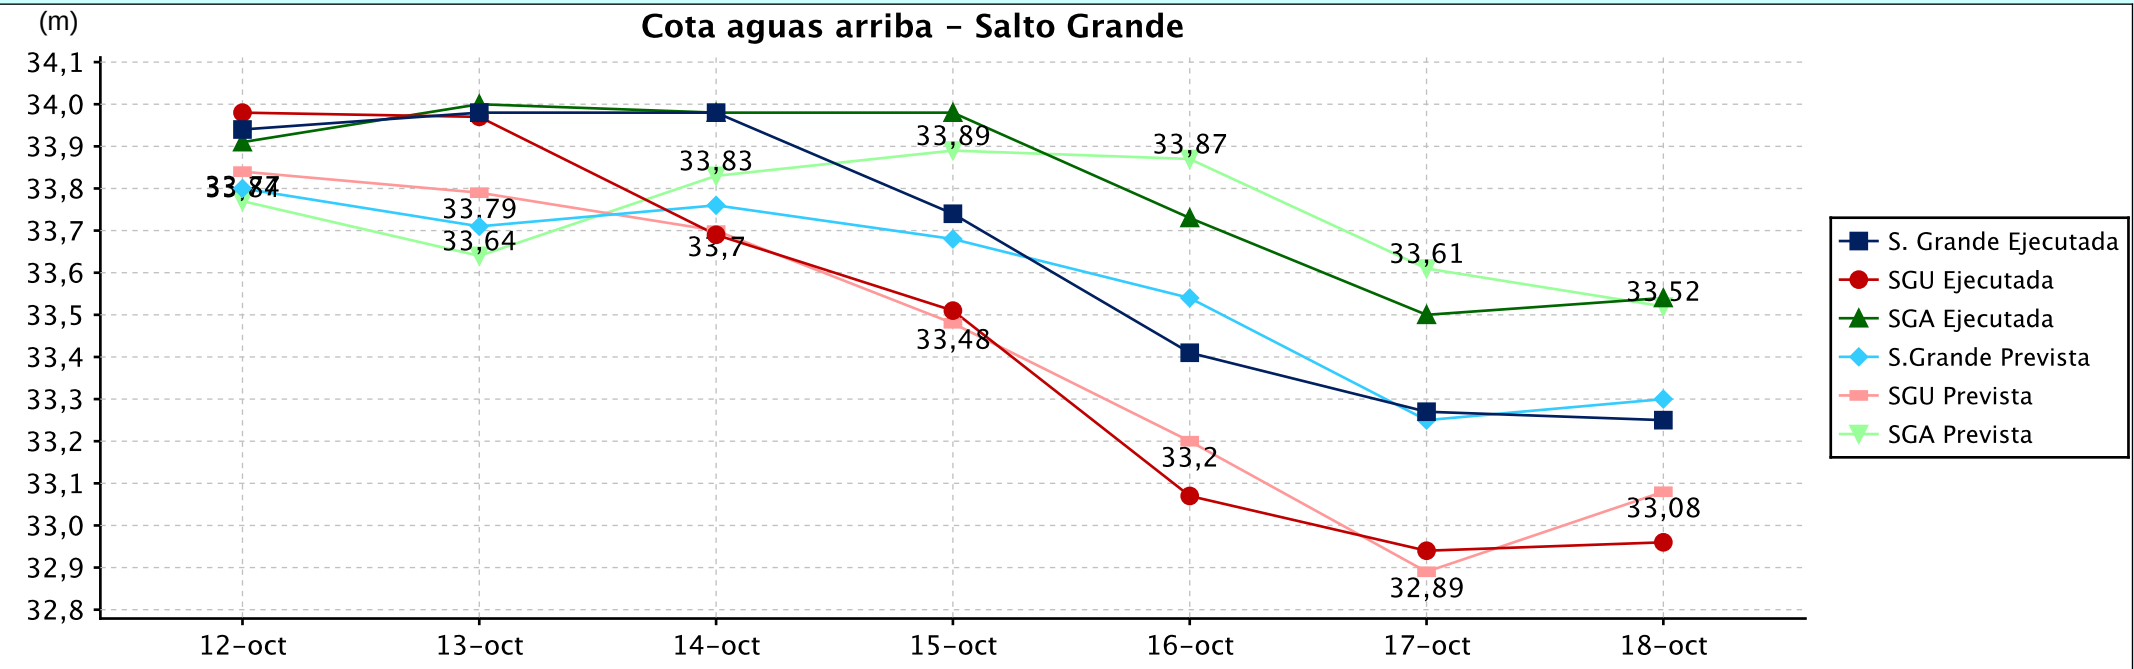

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	32,96
Cota Vista Arg	33,54
Cota real	33,25

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-10.825
------------------------------------	---------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	670	662
Baygorria	661	0
Palmar	1.256	1.328
SGU	1.013	1.155

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	460	593
Baygorria	0	0
Palmar	0	769
SGU	1.300	1.230

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
