




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 19 de octubre de 2013


Generación Térmica	
Central Battle	2.080
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	874
Motores	1.210
Central La Tablada	-97
Central P. del Tigre	5.140
APR A	1.880
APR B	2.179
APR C	-1
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.237
C. Baygorria	1.748
C. Palmar	4.168
C. Salto Grande	2.691
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.673
TOTAL Generación	24.695

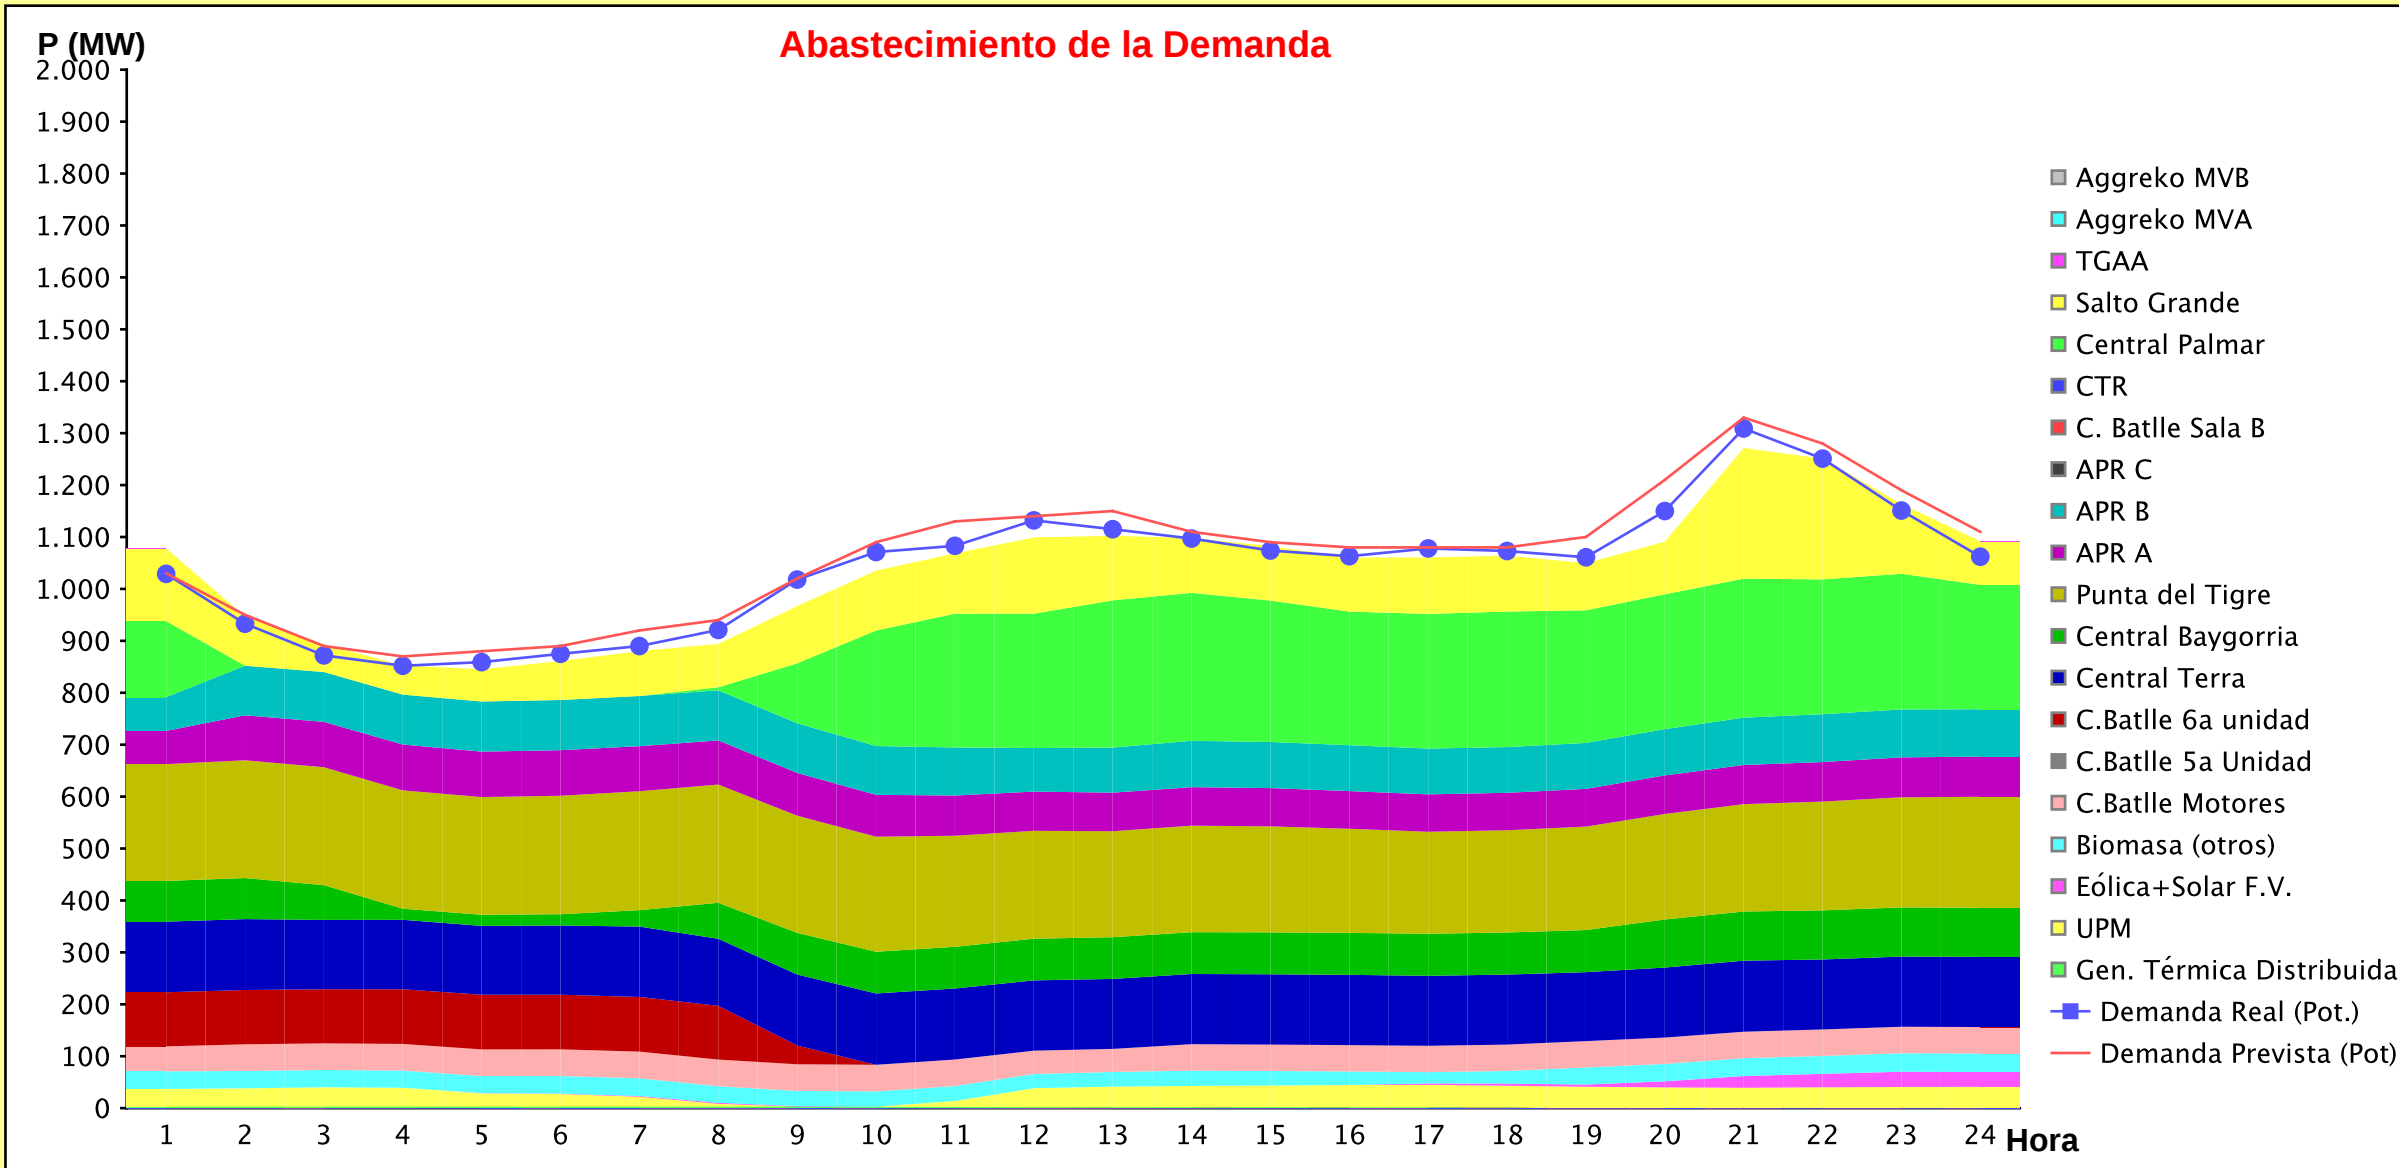

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	24.695
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	25.560
Diferencia (MWh)	-865
Ejecutada - Programada	-3,38 %

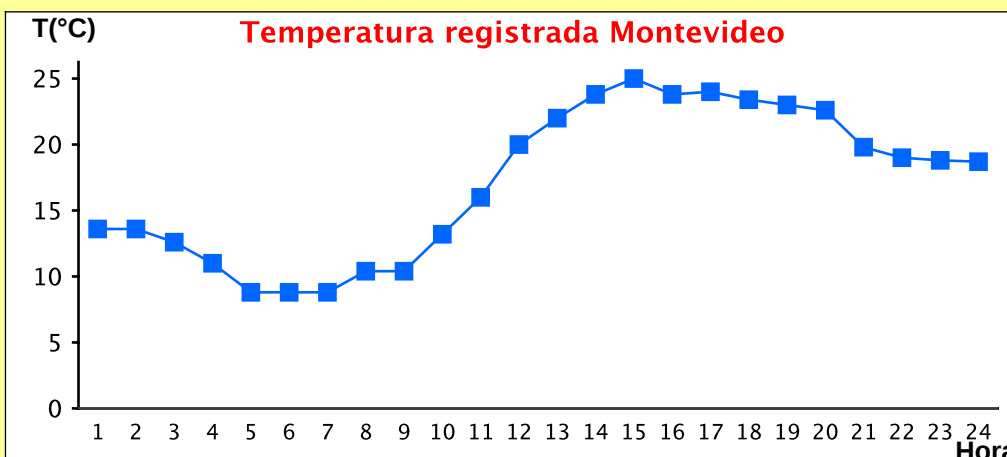



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1169,16 Hora 12:51
Potencia mínima:	877,67 Hora 04:28
Pico noche:	1334,98 Hora 21:05

Generación Media (MW)	
Eólica	6,0
Biomasa	66,4
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	1,8
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

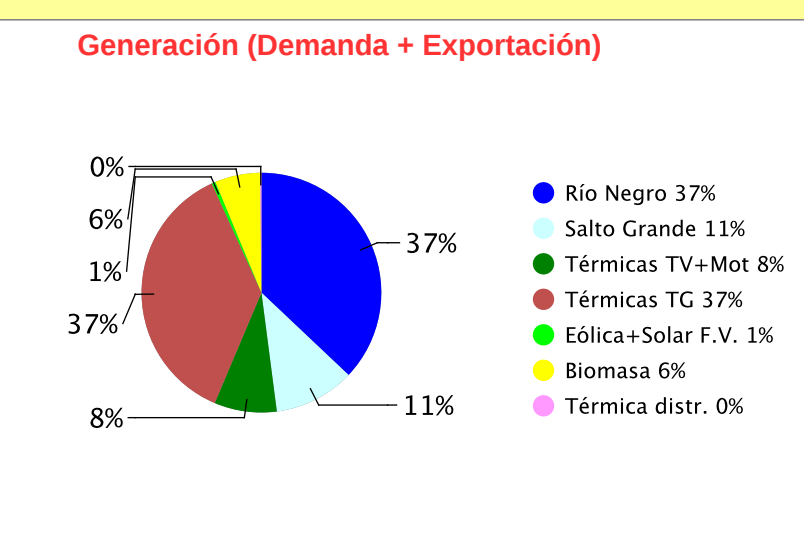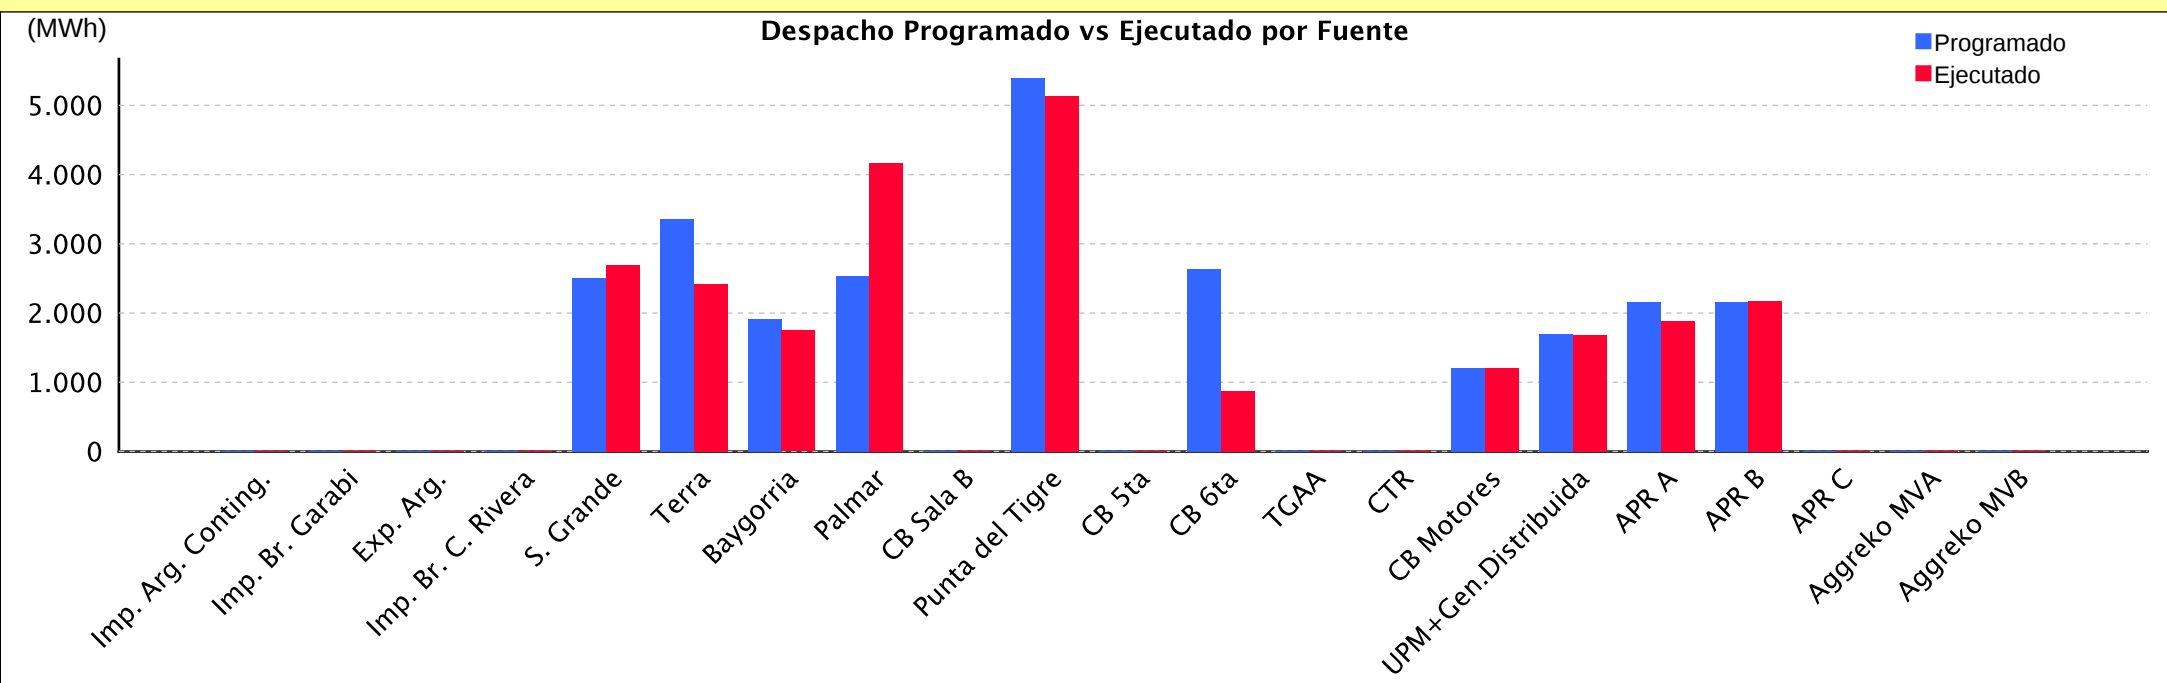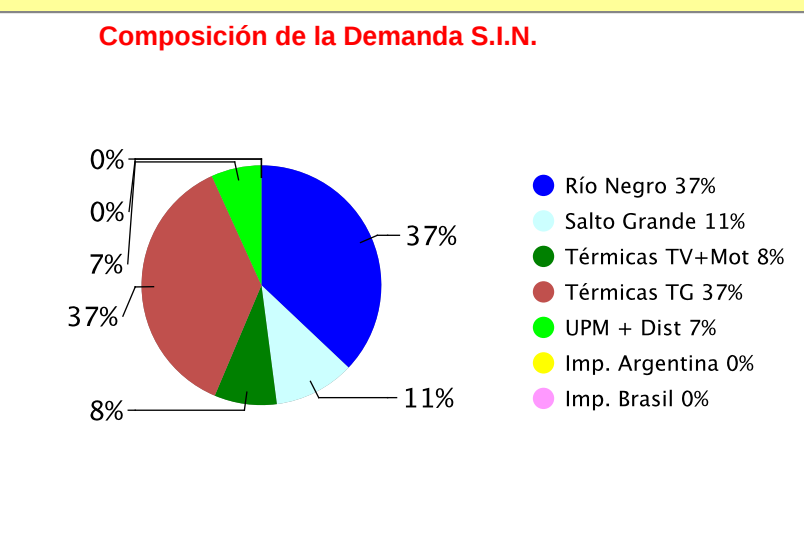



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

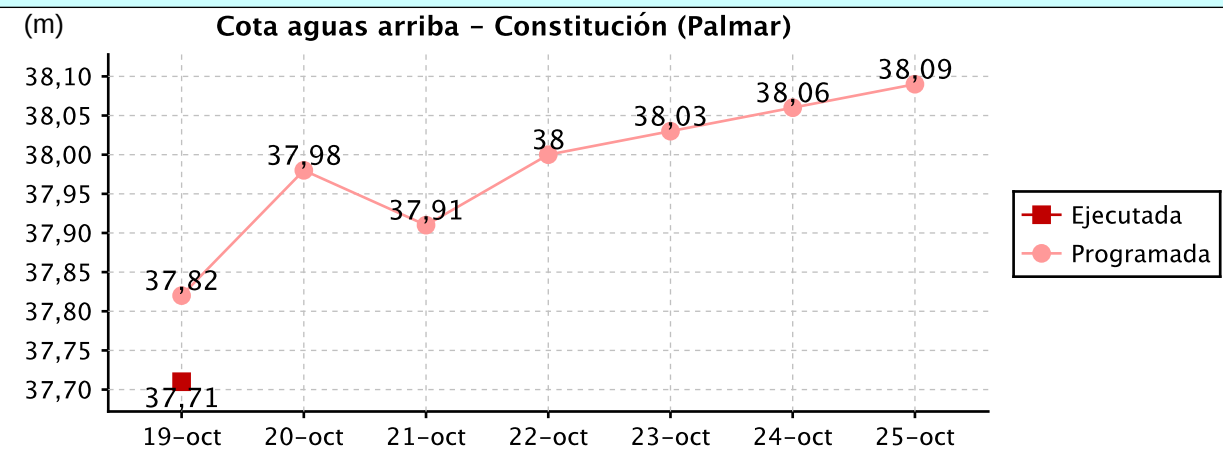
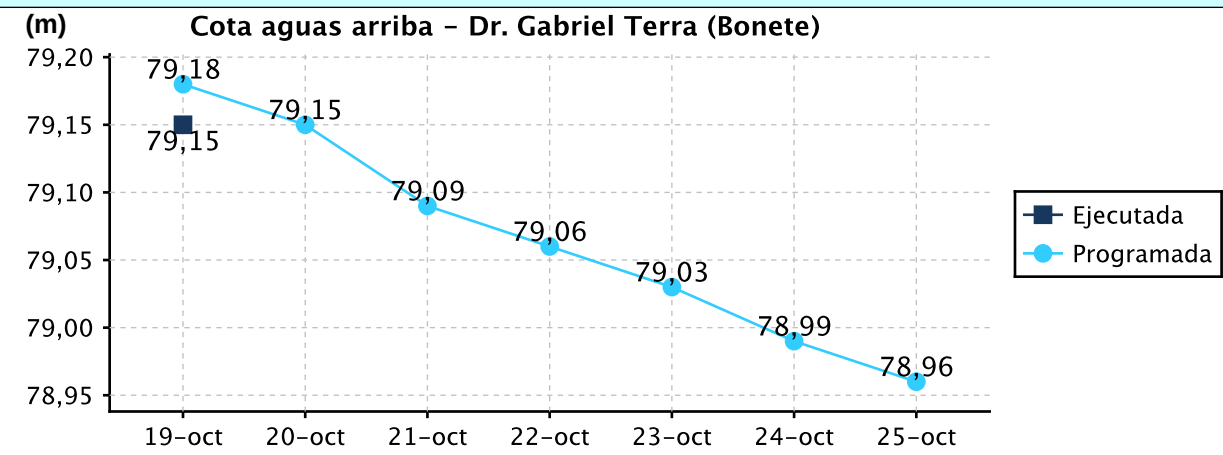


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,18	79,15
Baygorria	53,82	54,04
Palmar	37,82	37,71
SGU	32,89	33,19

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

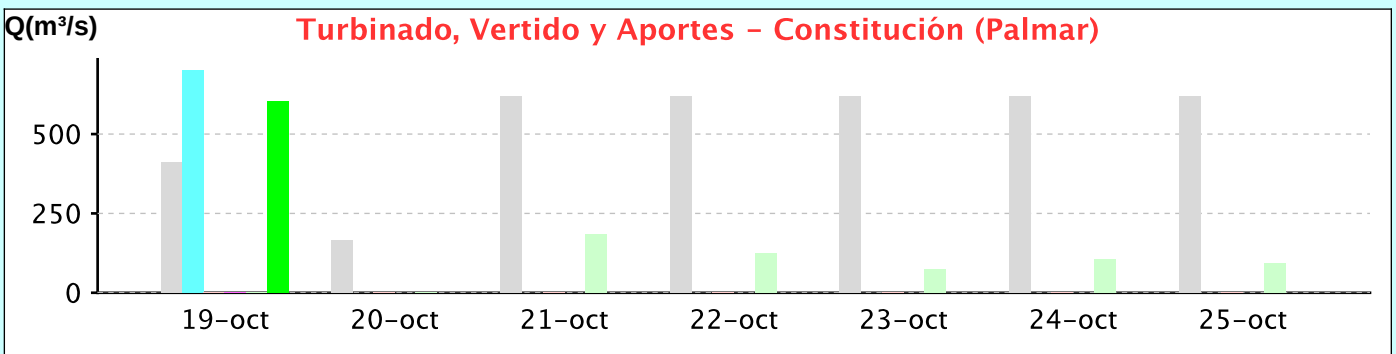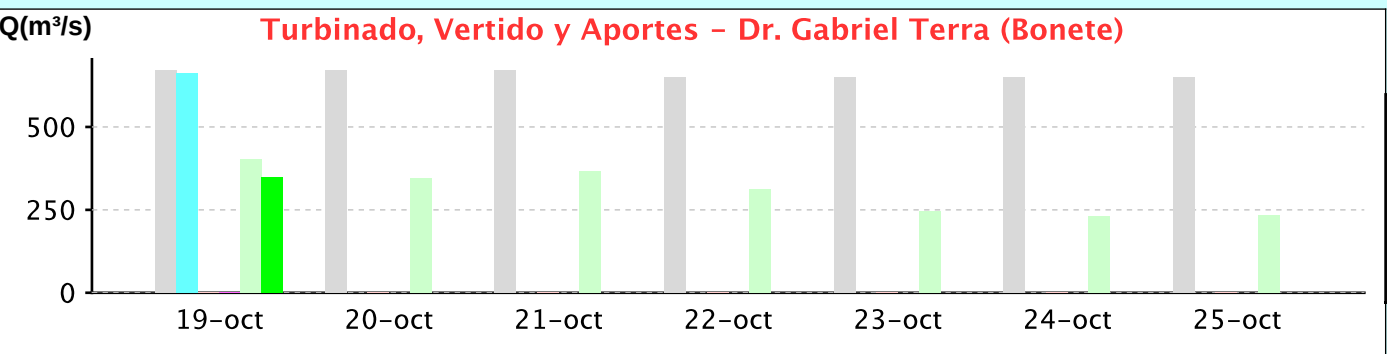

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

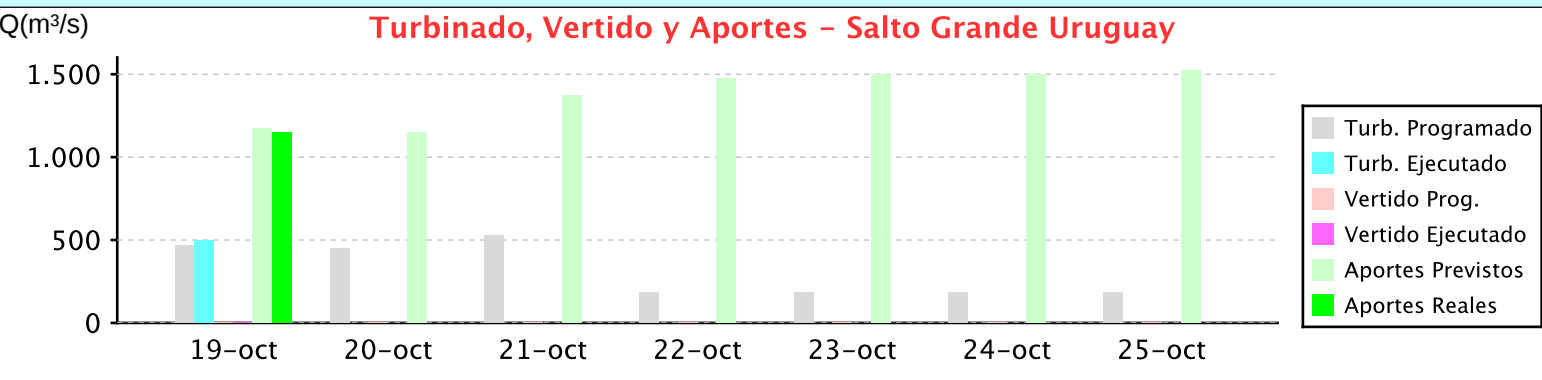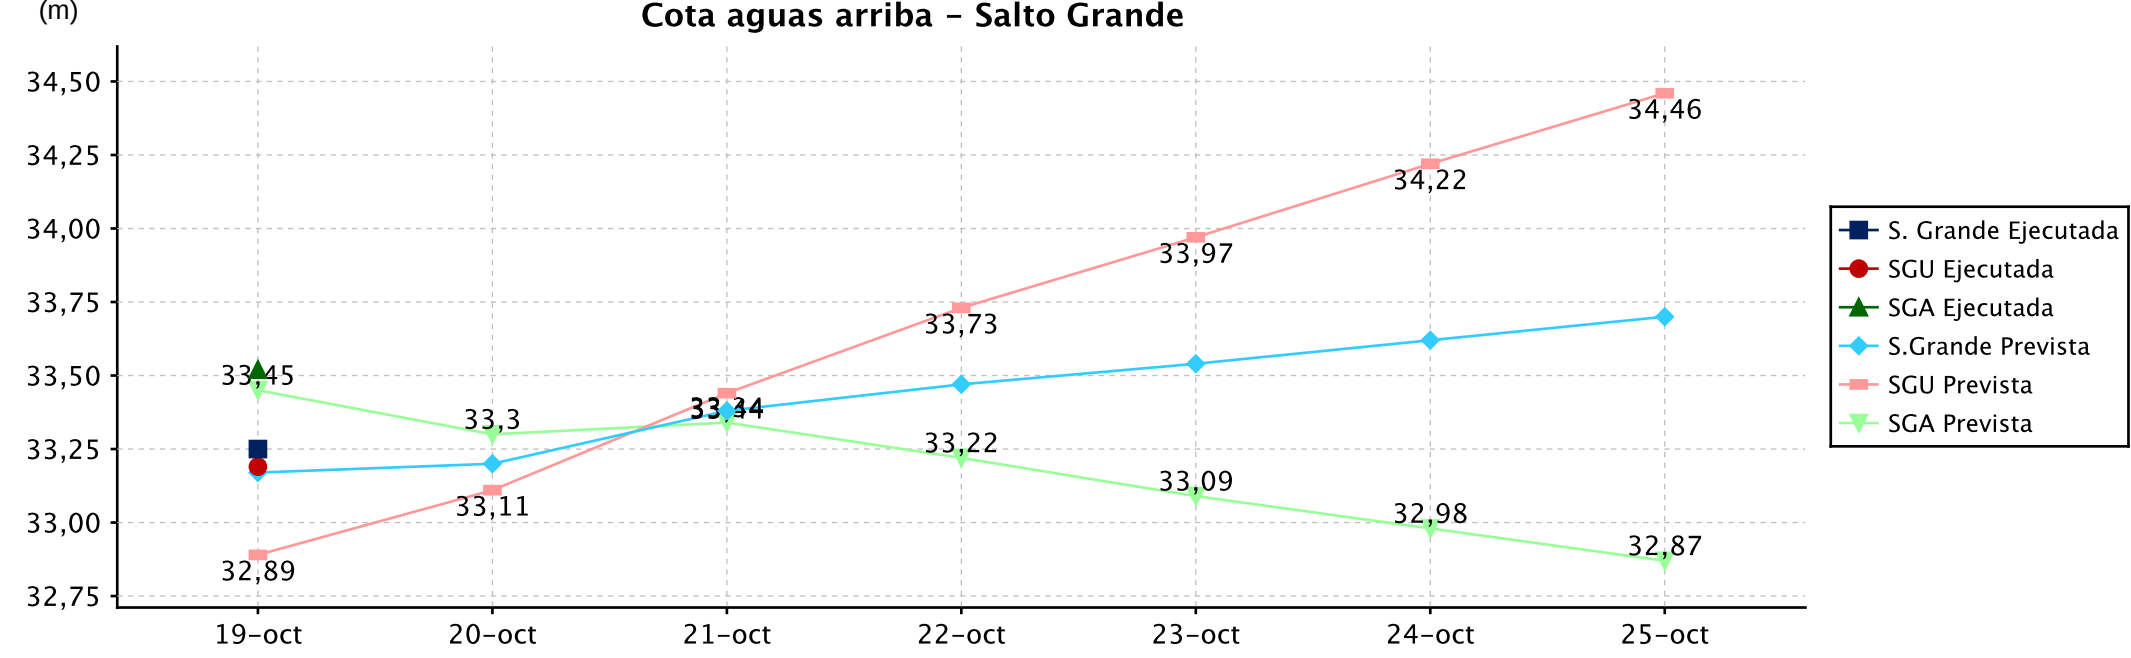

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,19
Cota Vista Arg	33,52
Cota real	33,25

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-6.116
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	670	661
Baygorria	632	0
Palmar	412	701
SGU	468	500

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	404	348
Baygorria	0	0
Palmar	0	603
SGU	1.175	1.150

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
