



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



viernes 25 de octubre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	912
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	916
Central La Tablada	-91
Central P. del Tigre	-11
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-2
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.310
C. Baygorria	1.805
C. Palmar	2.939
C. Salto Grande	17.764
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.971
TOTAL Generación	26.591

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.591
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.800
Diferencia (MWh)	-209
Ejecutada - Programada	-0,78 %

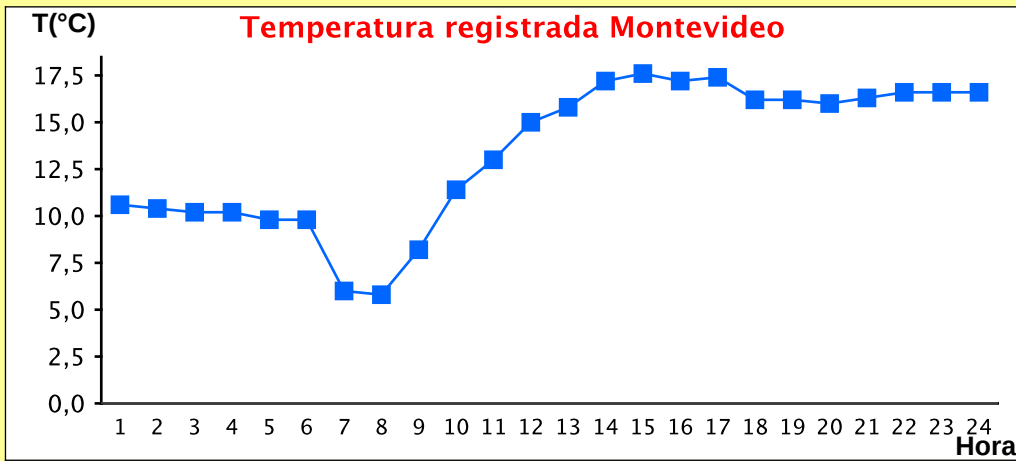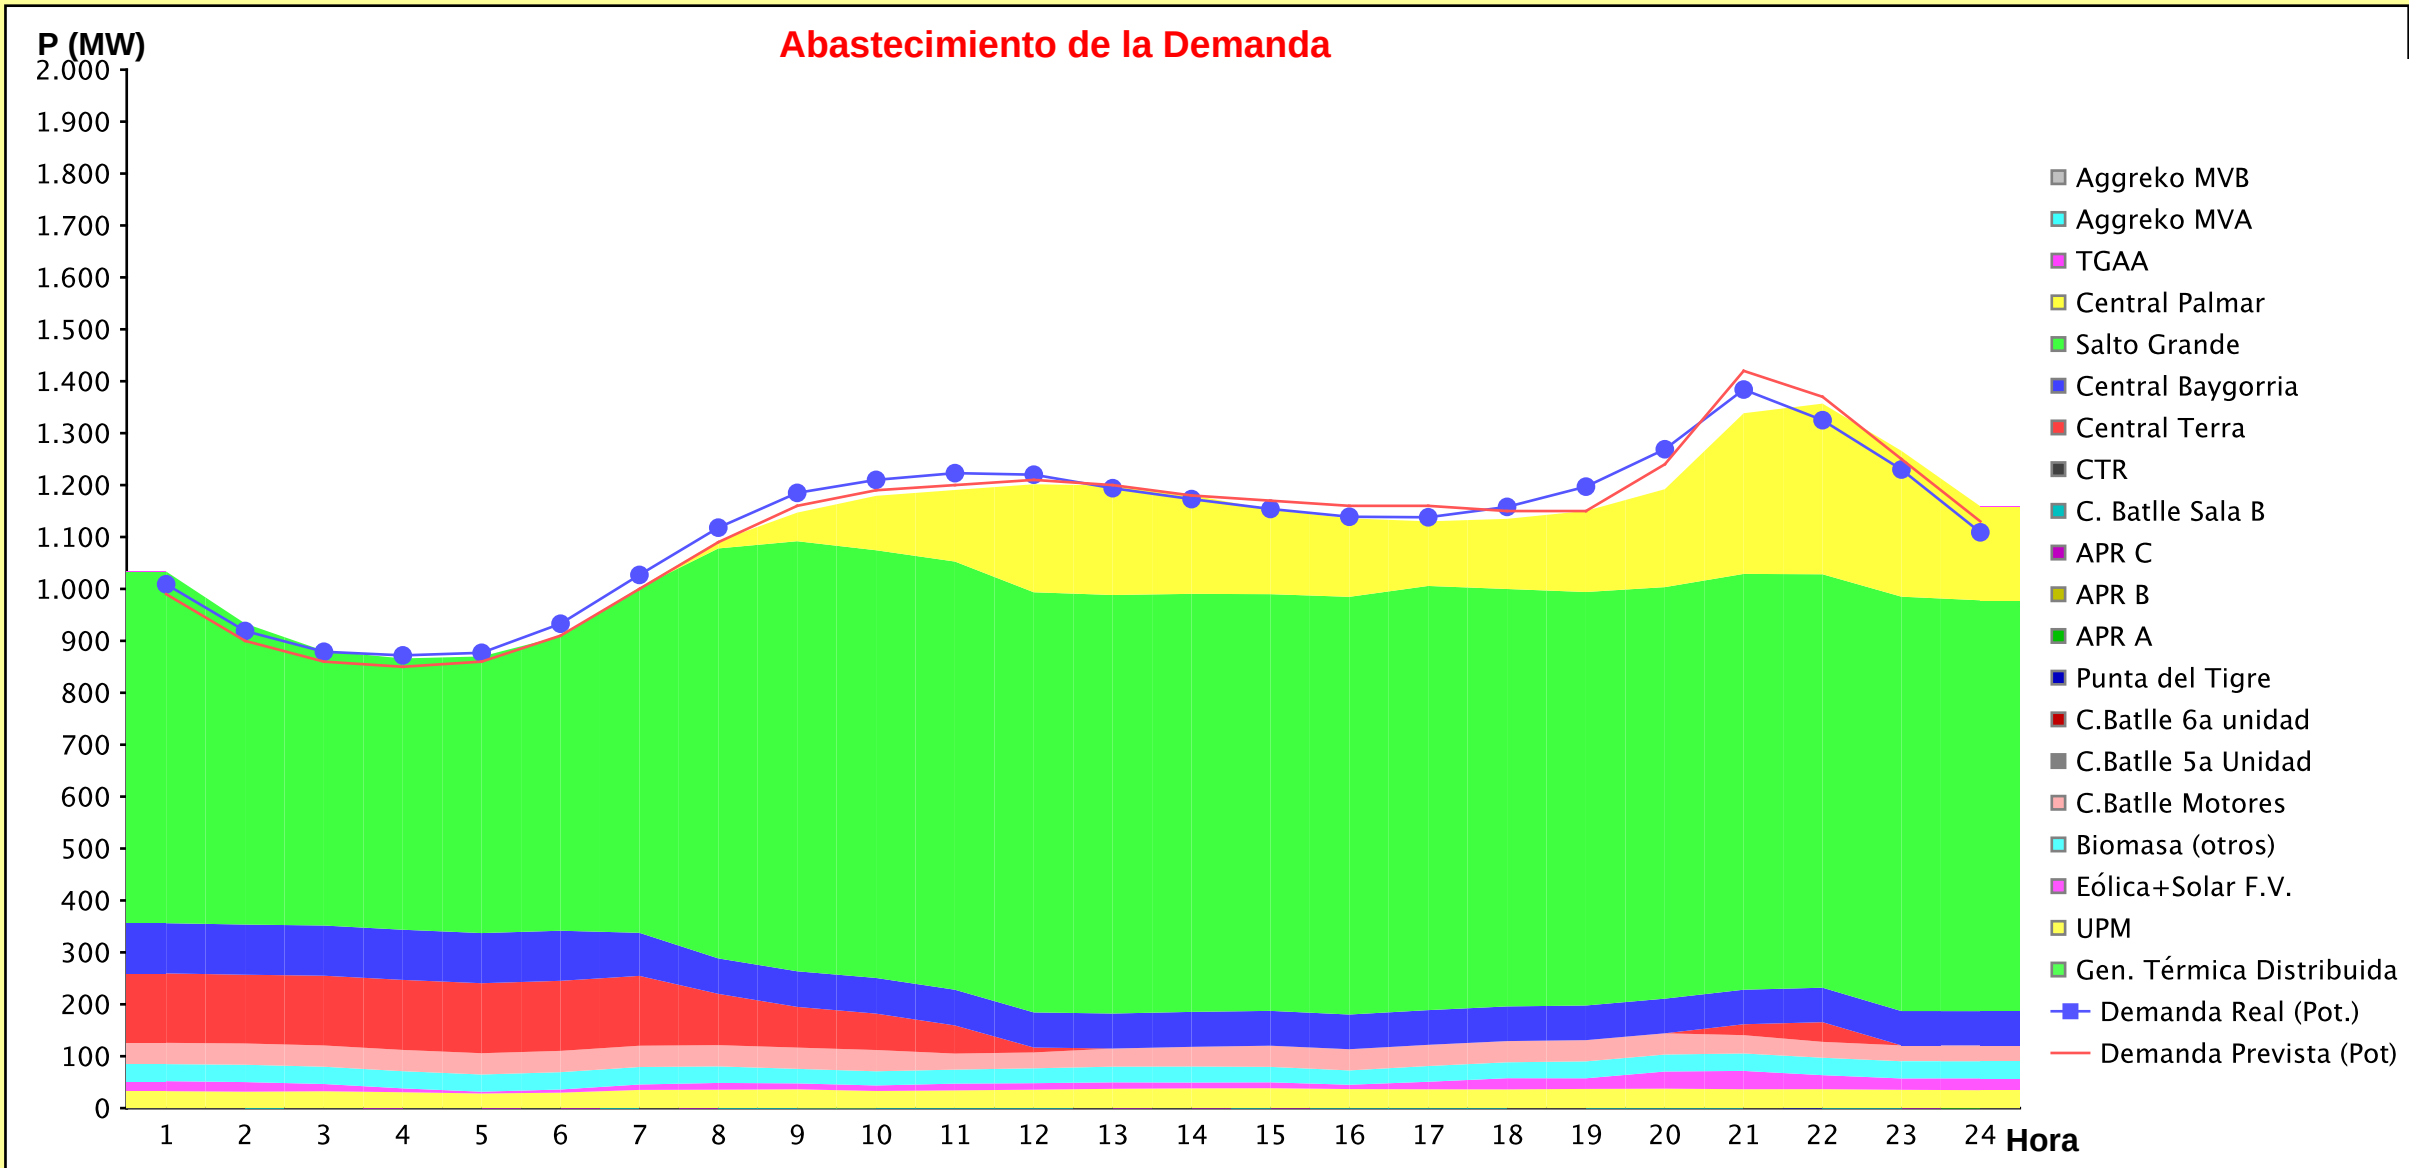



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1237,01 Hora 11:42
Potencia mínima:	859,08 Hora 04:02
Pico noche:	1386,5 Hora 21:15

Generación Media (MW)	
Eólica	16,1
Biomasa	70,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

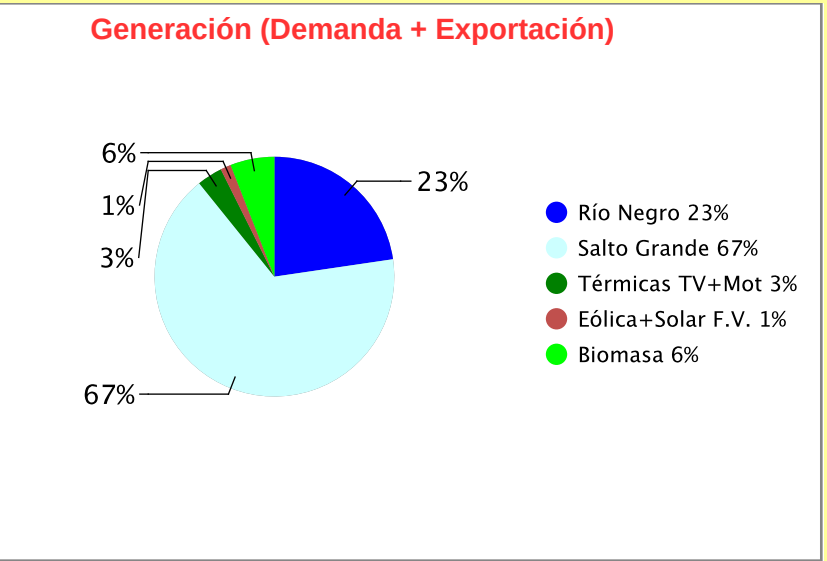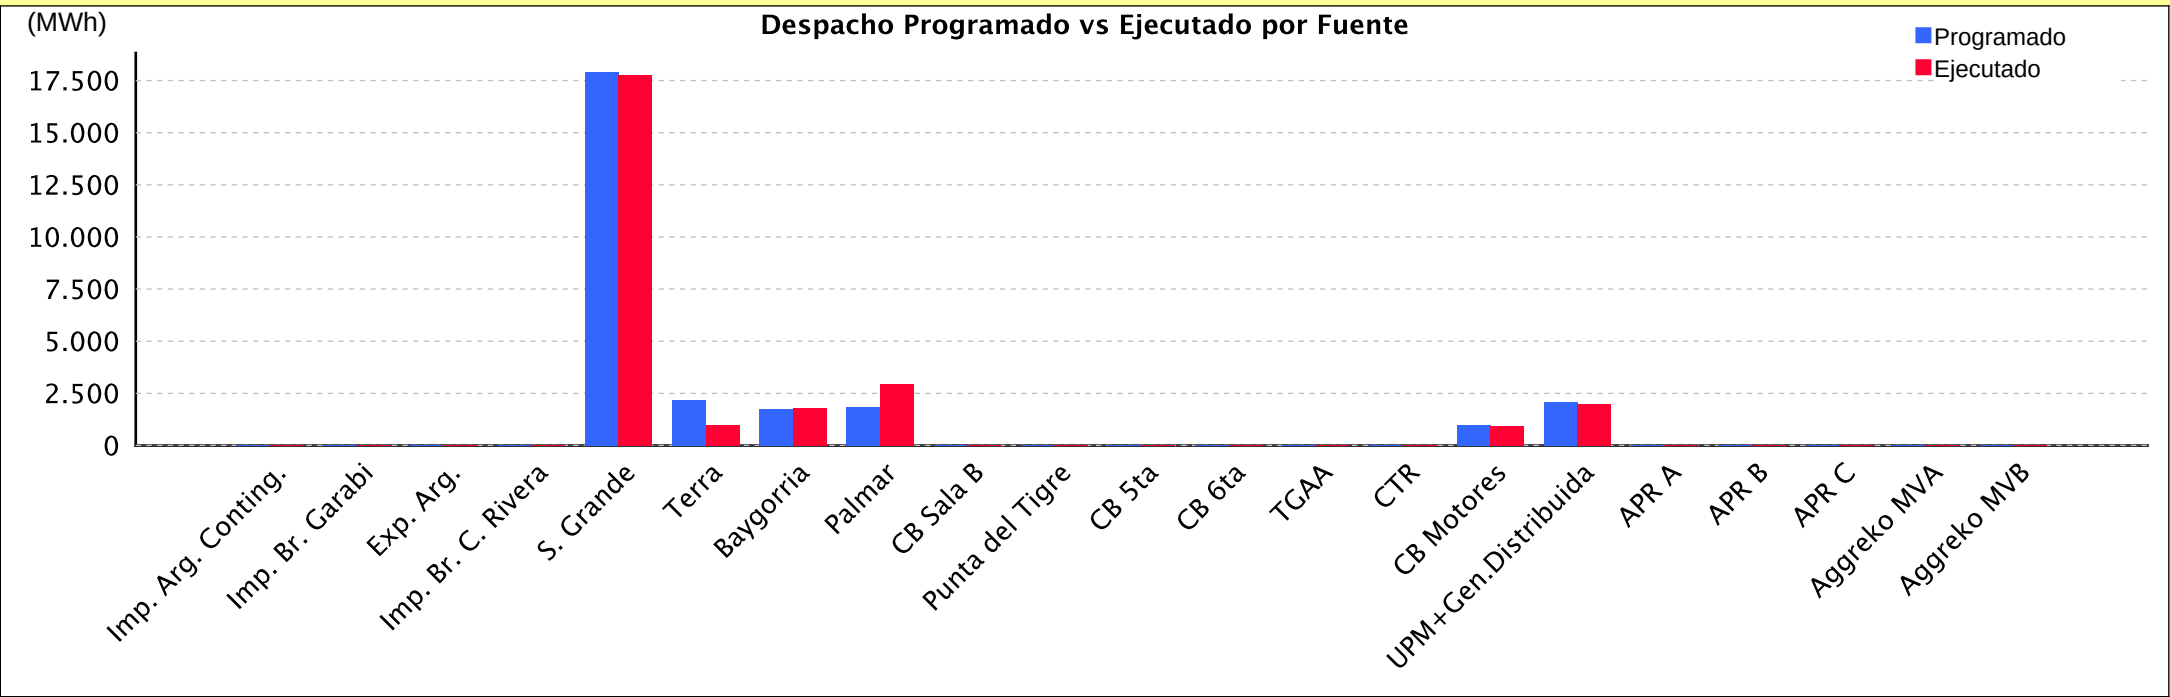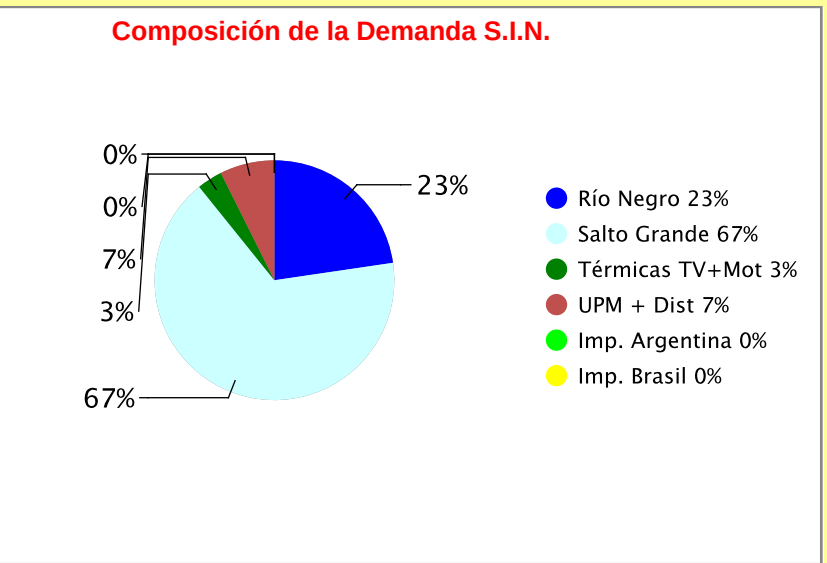



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

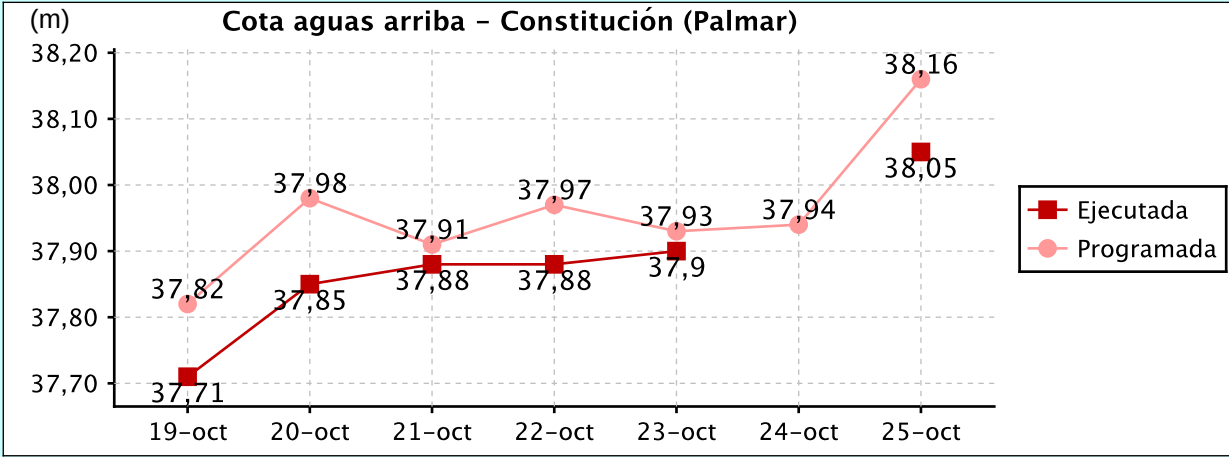
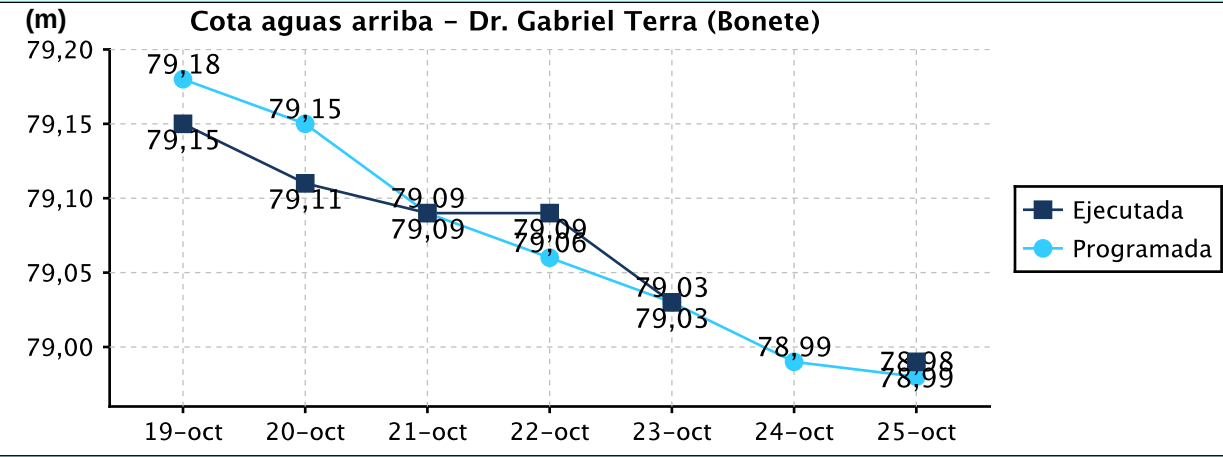


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,98	78,99
Baygorria	53,88	53,81
Palmar	38,16	38,05
SGU	32,85	33

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

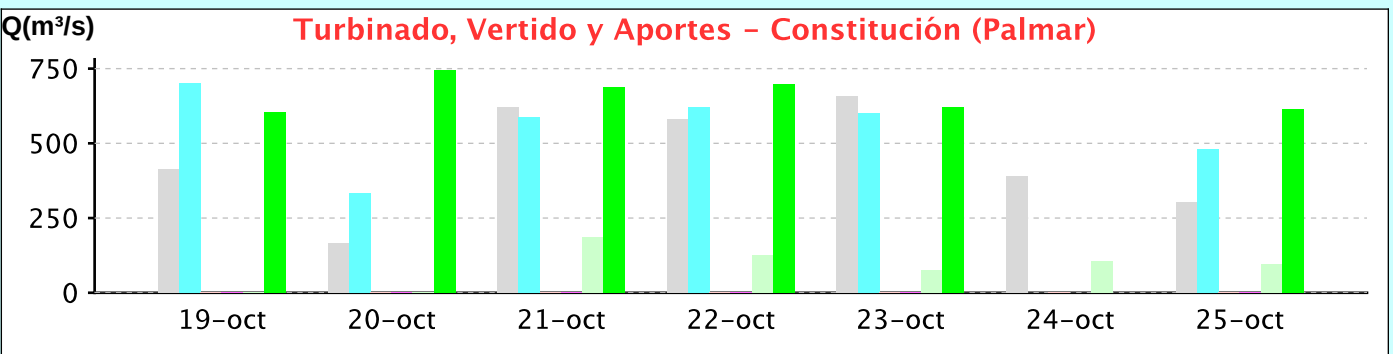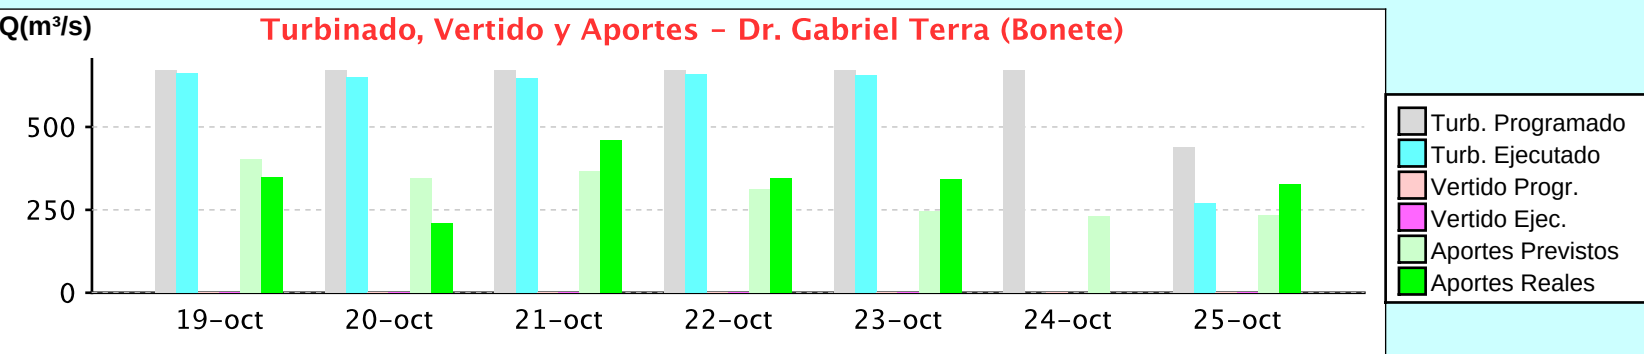

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

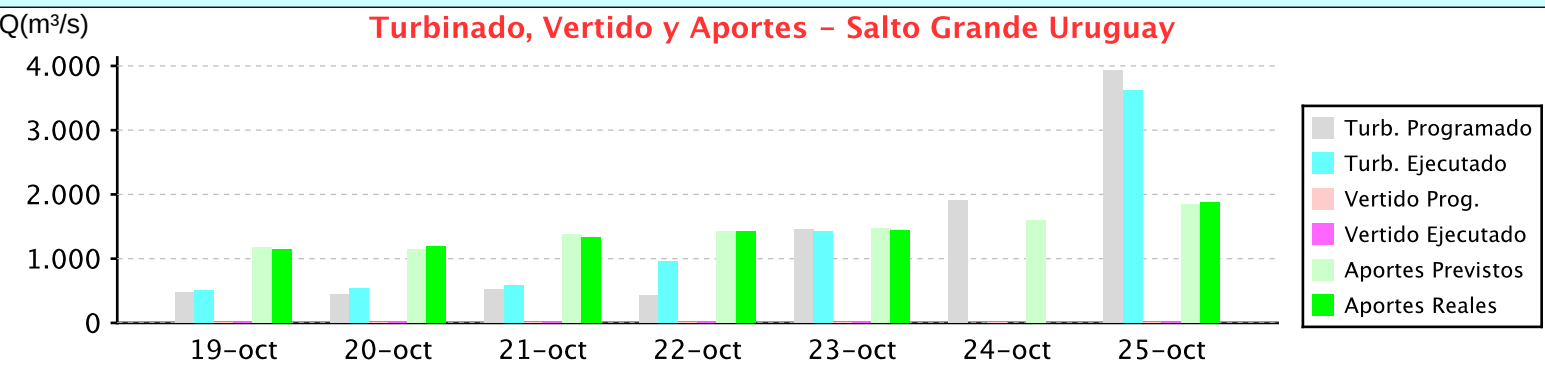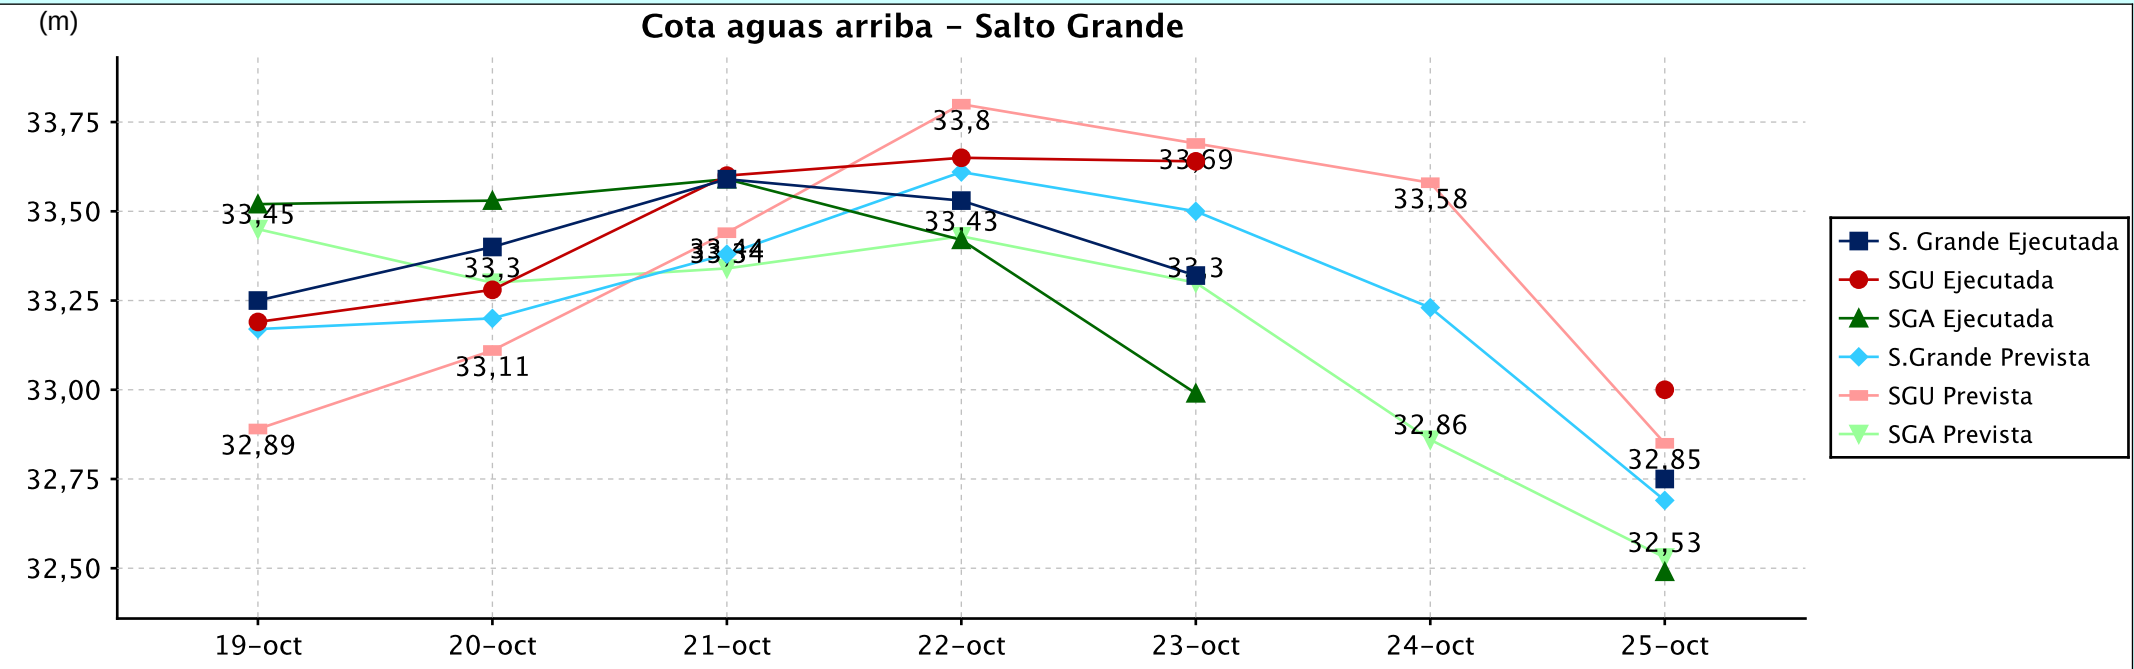

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,00
Cota Vista Arg	32,49
Cota real	32,75

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	8.748
------------------------------------	-------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	439	269
Baygorria	585	571
Palmar	303	481
SGU	3.935	3.627

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	233	326
Baygorria	0	326
Palmar	94	615
SGU	1.850	1.881

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Al momento están faltando medidas del 24/10, por lo tanto en este informe no se dispone de dicha información.
