



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



sábado 26 de octubre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	1.695
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	1.029
Motores	670
Central La Tablada	-92
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-1
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	960
C. Baygorria	1.568
C. Palmar	2.645
C. Salto Grande	16.209
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.813
TOTAL Generación	24.781

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	24.781
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	25.600
Diferencia (MWh)	-819
Ejecutada - Programada	-3,20 %

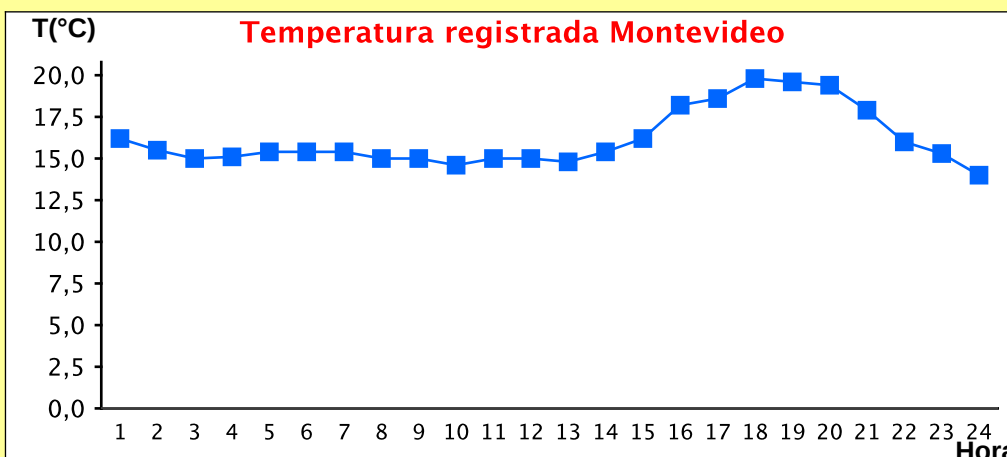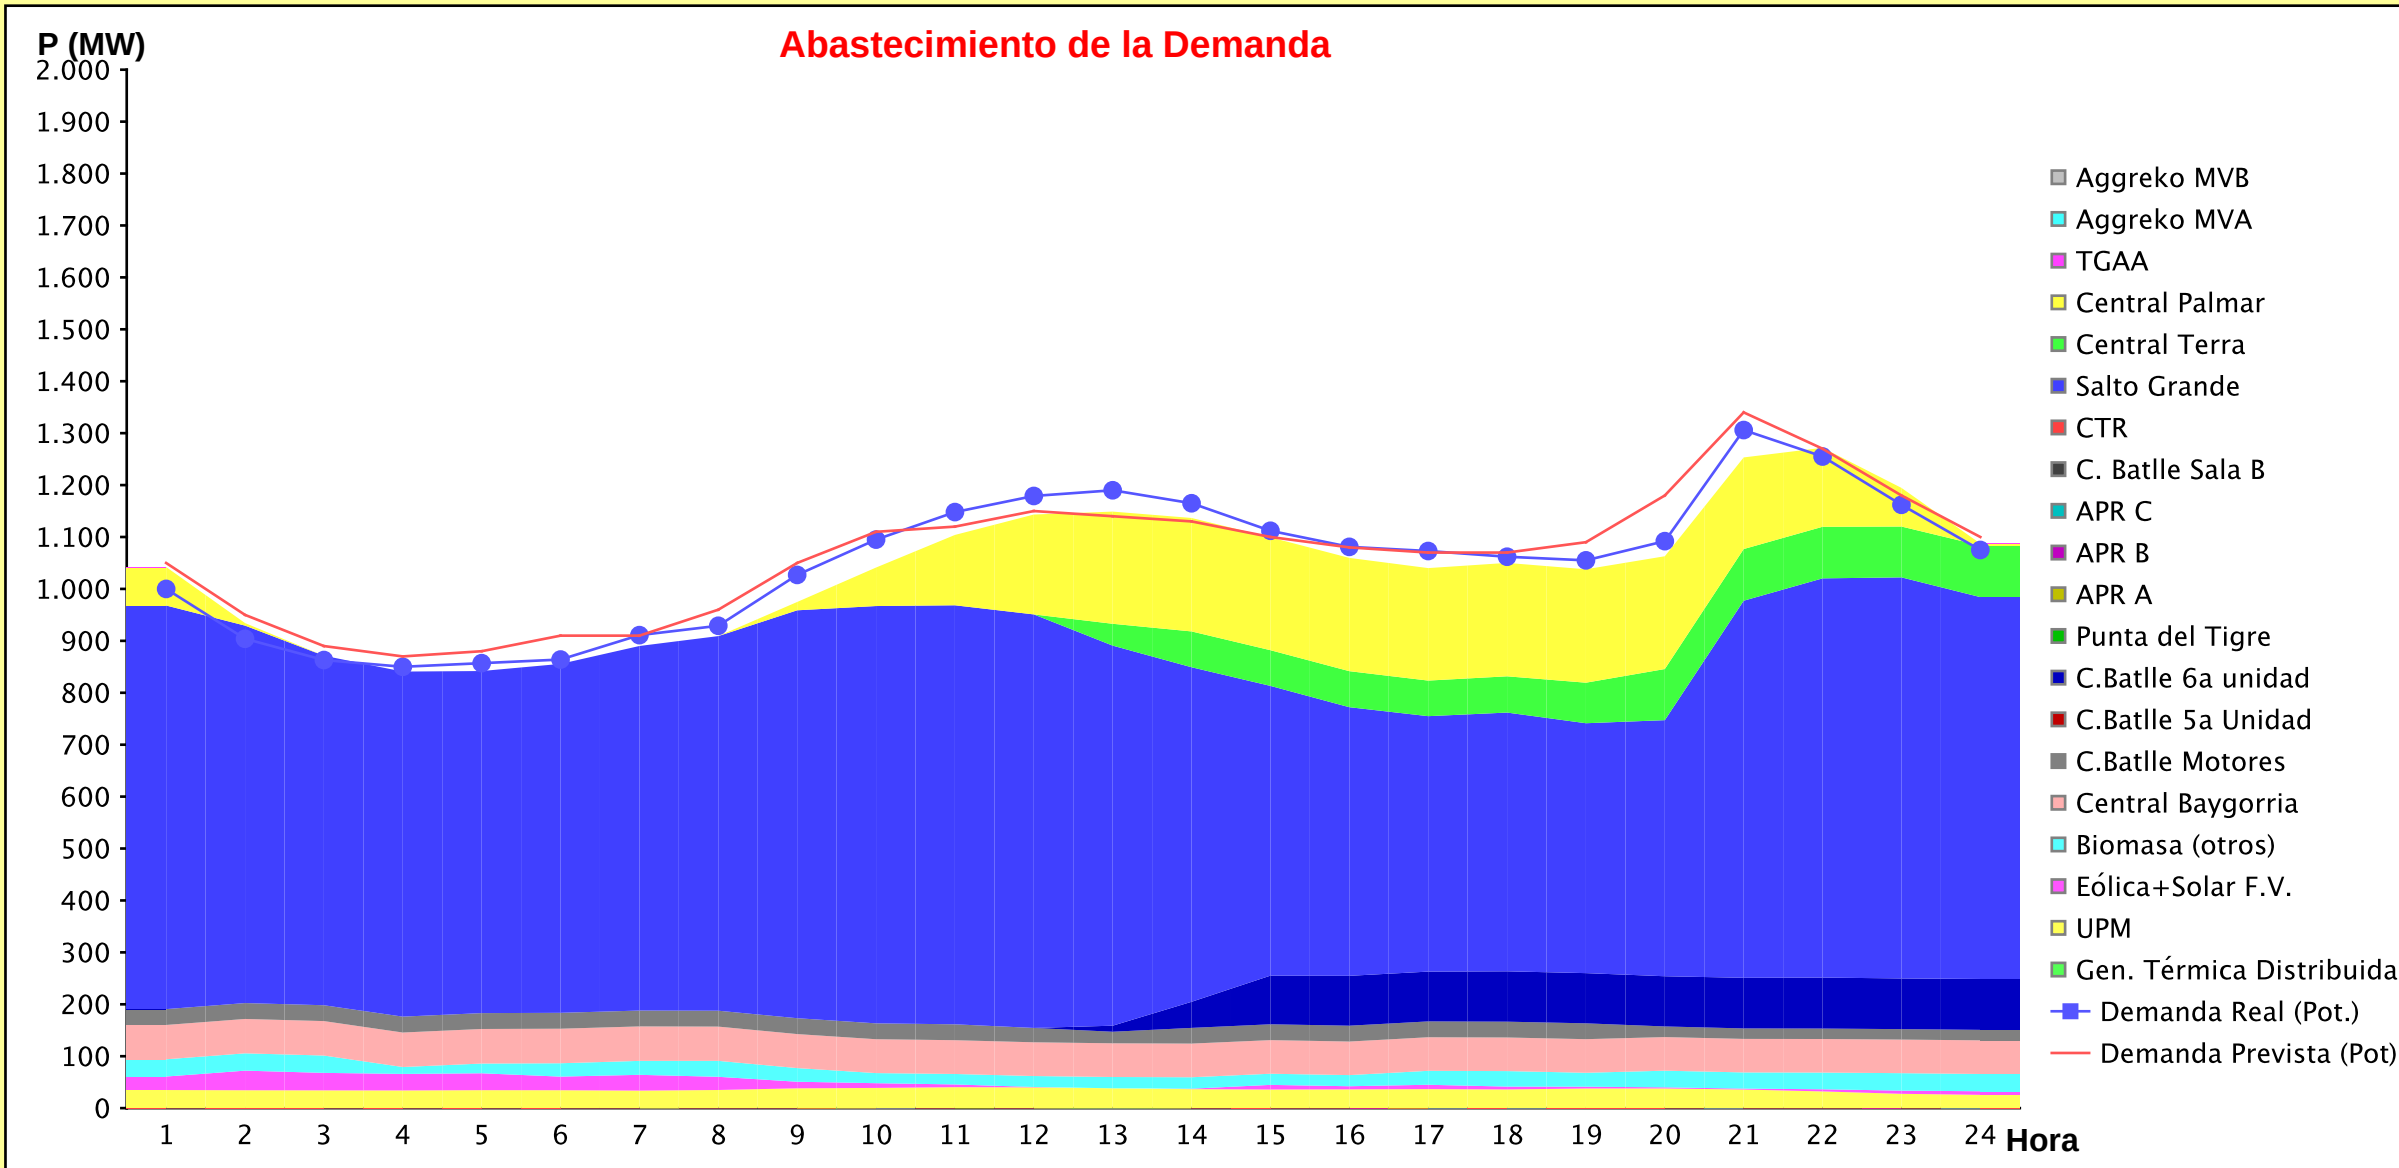



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1232,18 Hora 12:50
Potencia mínima:	819,2 Hora 03:17
Pico noche:	1307,38 Hora 20:54

Generación Media (MW)	
Eólica	13,8
Biomasa	68,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

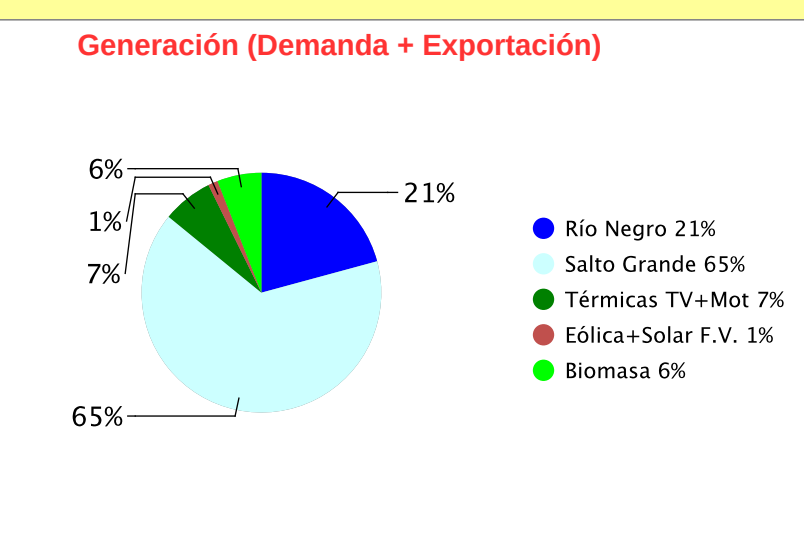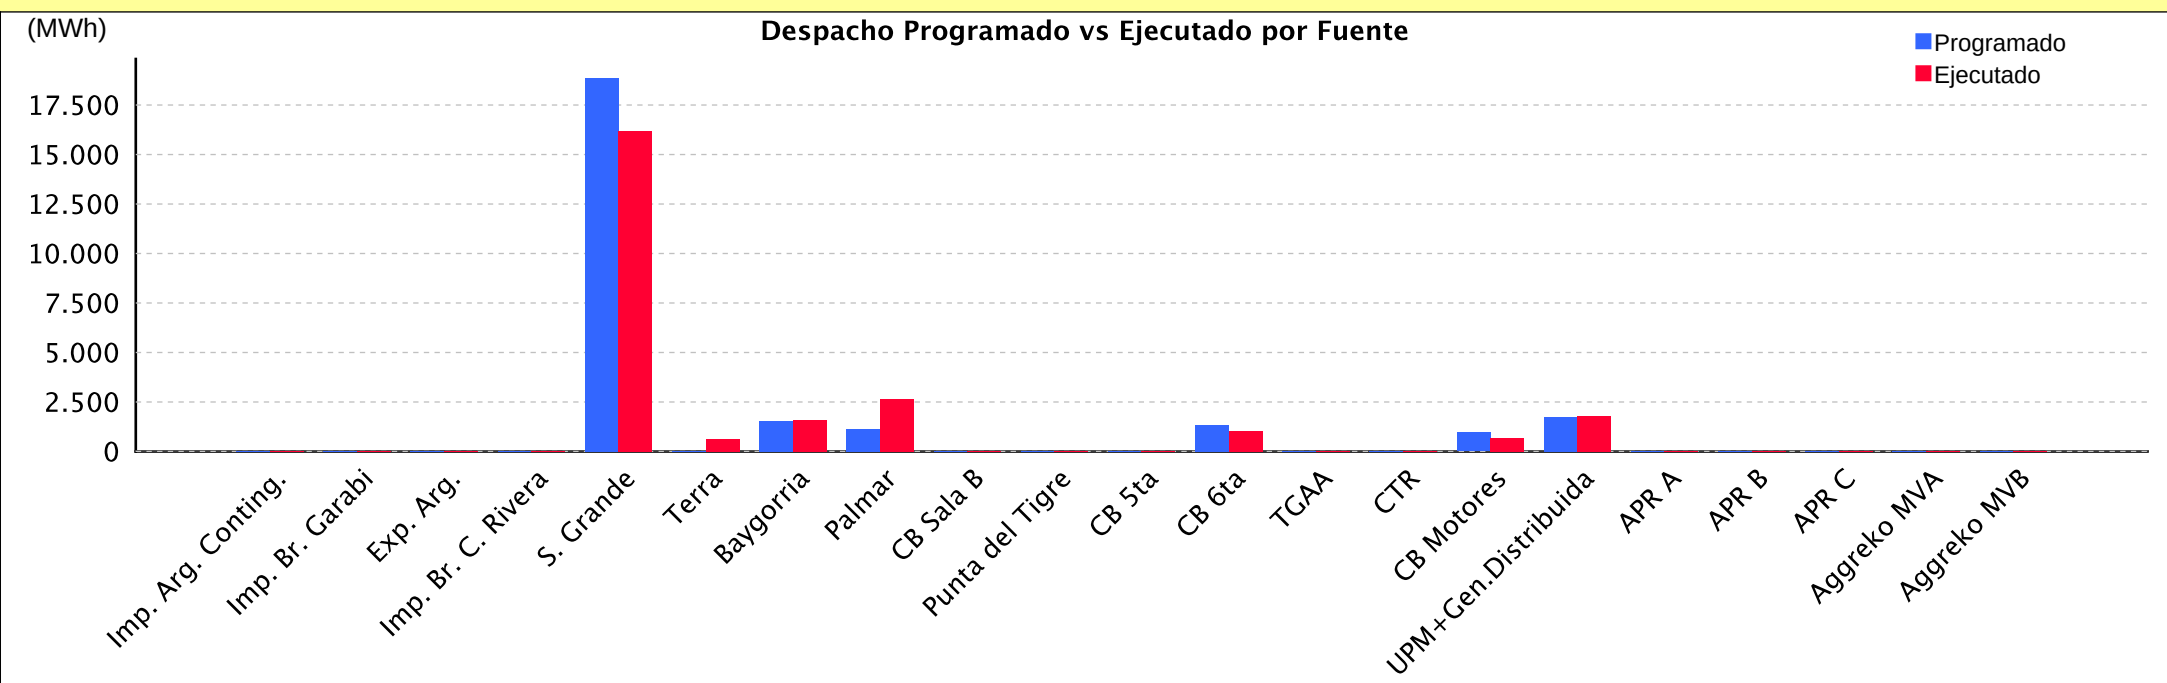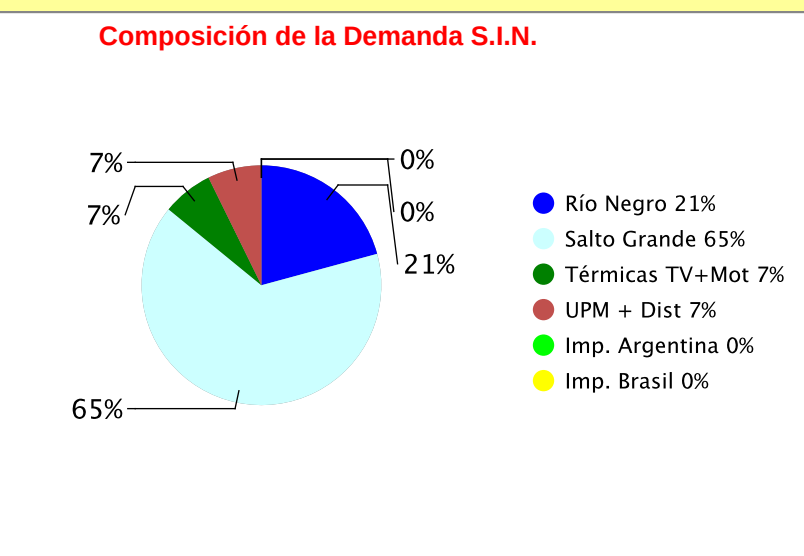



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

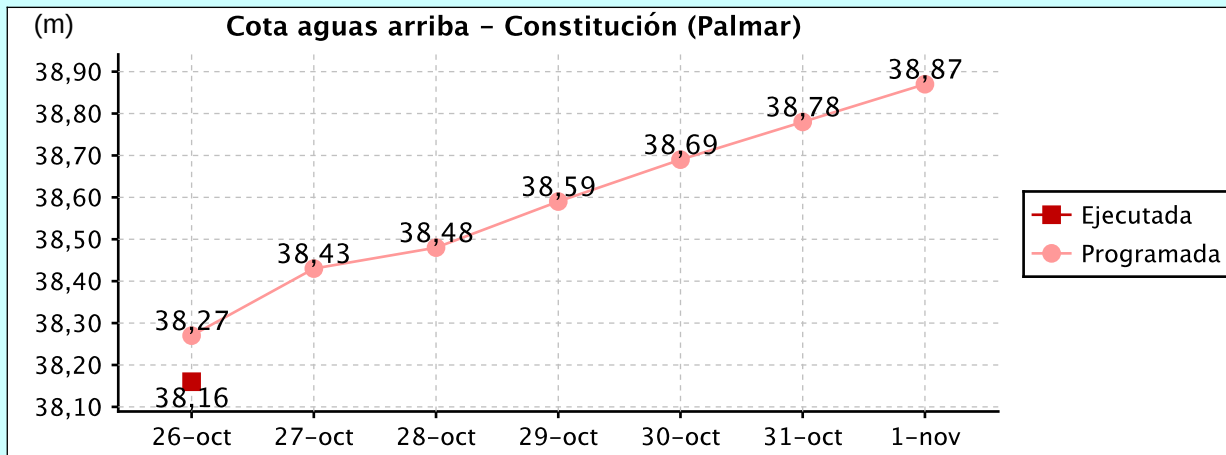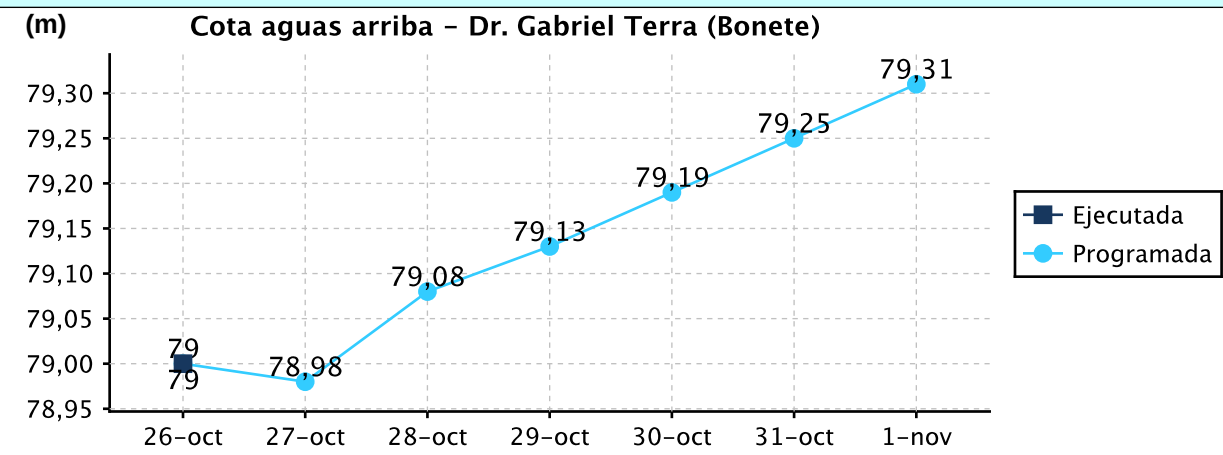


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,00	79
Baygorria	53,45	53,56
Palmar	38,27	38,16
SGU	32,33	32,83

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

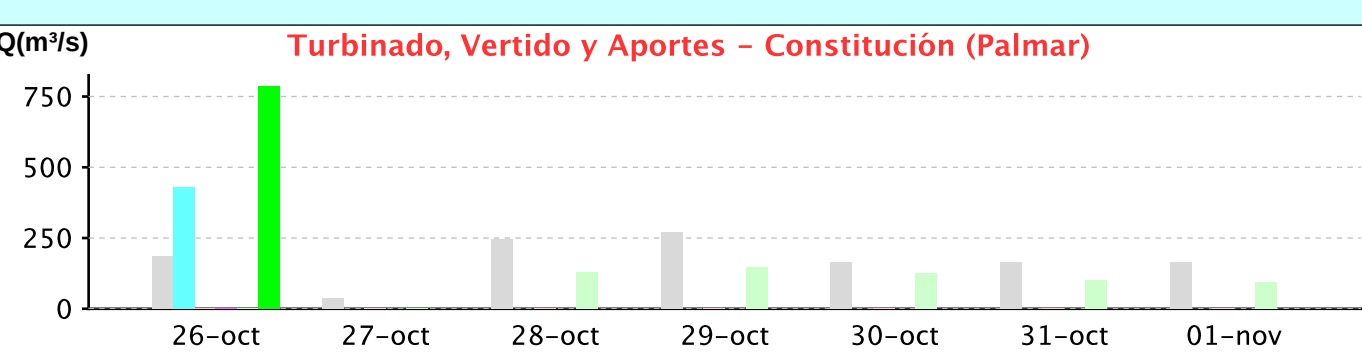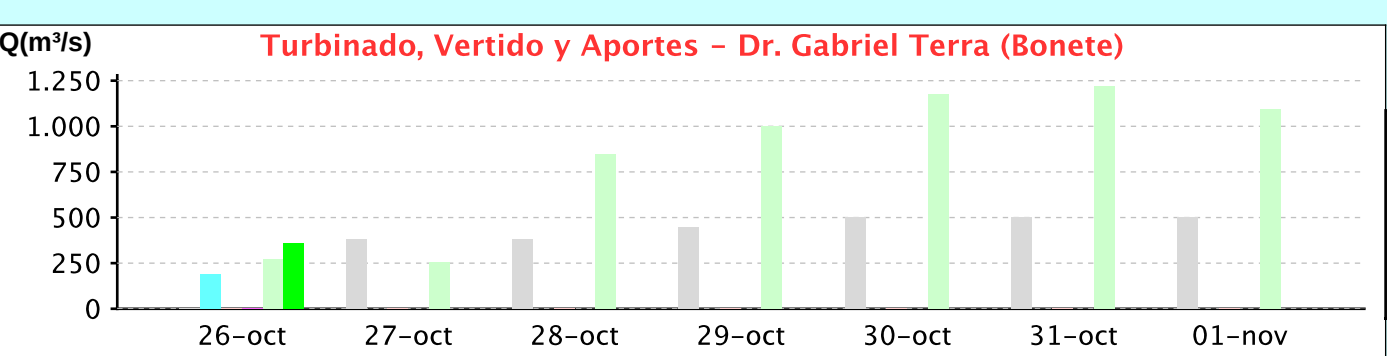


Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

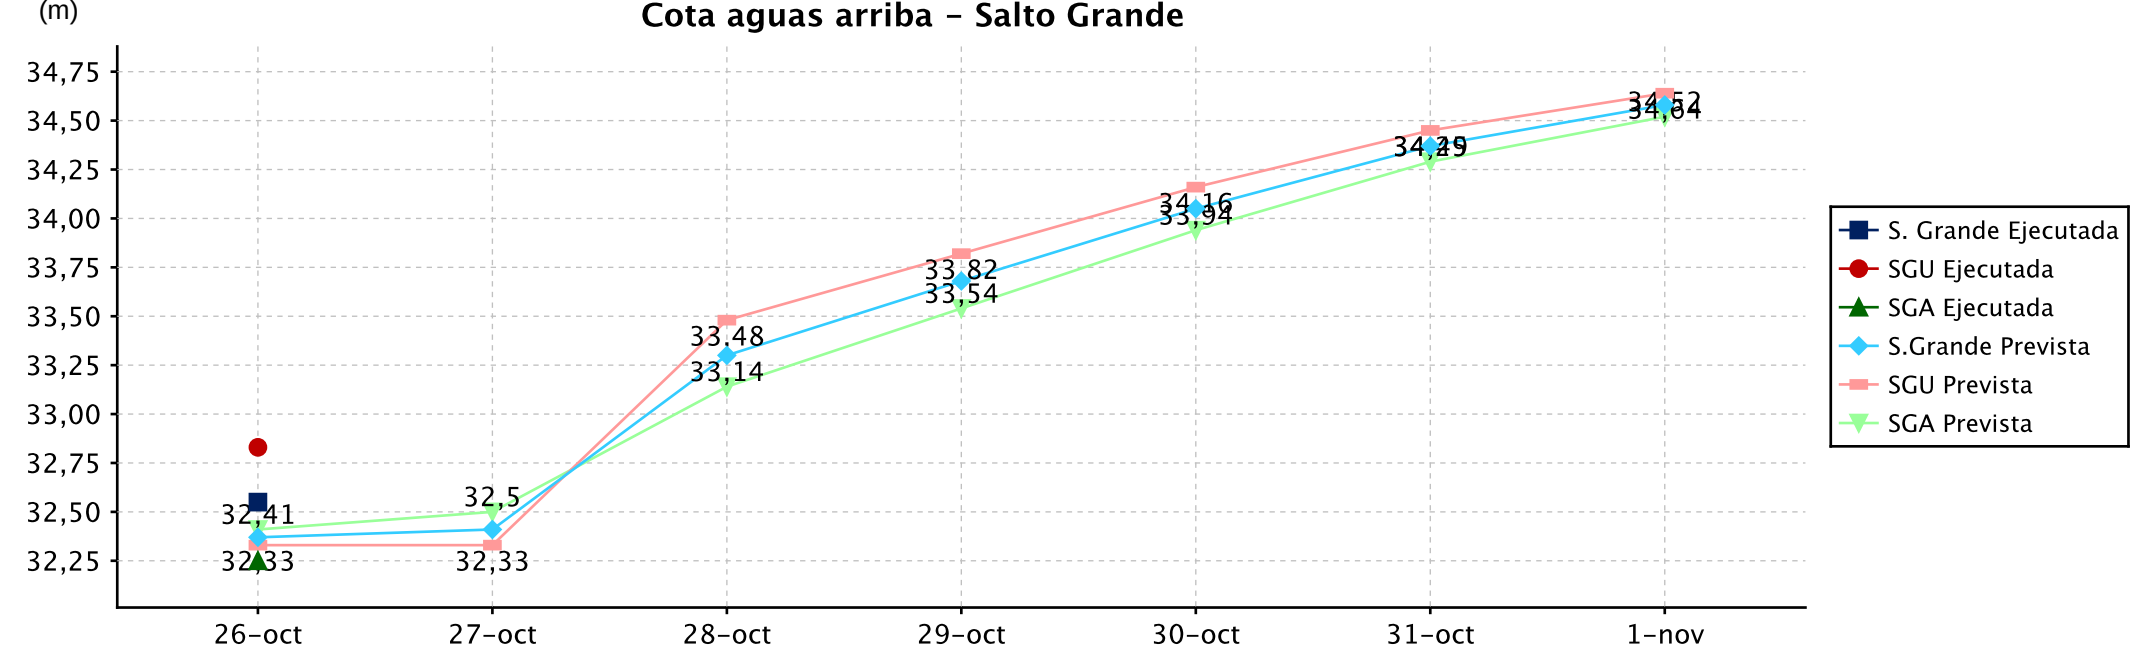

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	188
Baygorria	516	496
Palmar	187	430
SGU	4.038	3.378

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	271	361
Baygorria	0	217
Palmar	0	786
SGU	2.175	2.491

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

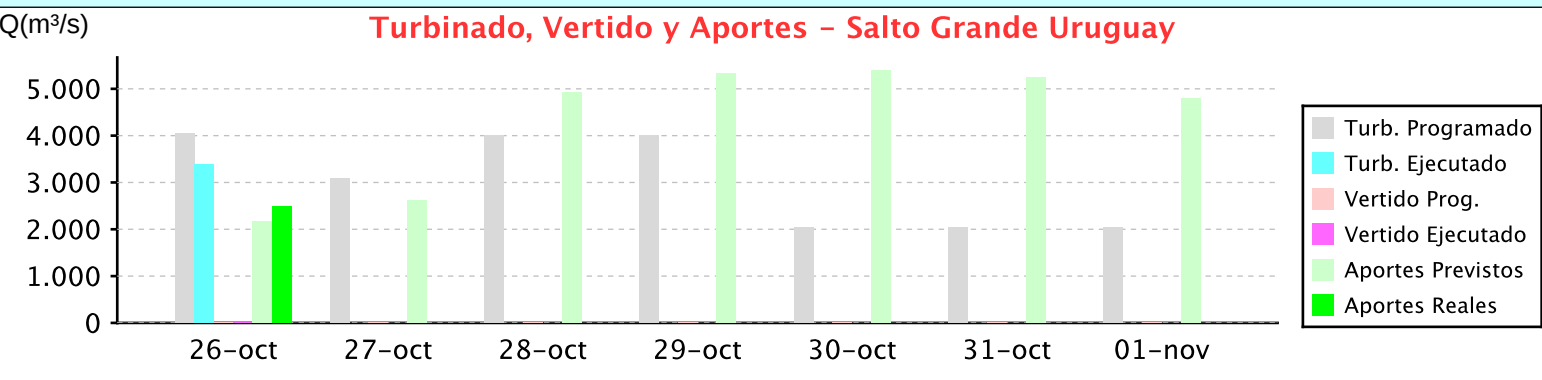

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	32,83
Cota Vista Arg	32,25
Cota real	32,55

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	9.616
------------------------------------	-------

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
