



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



domingo 27 de octubre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	2.012
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	1.697
Motores	319
Central La Tablada	-100
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-4
APR C	-2
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.898
C. Baygorria	1.149
C. Palmar	276
C. Salto Grande	14.764
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	2.050
TOTAL Generación	22.032

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	22.032
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	22.850
Diferencia (MWh)	-818
Ejecutada - Programada	-3,58 %

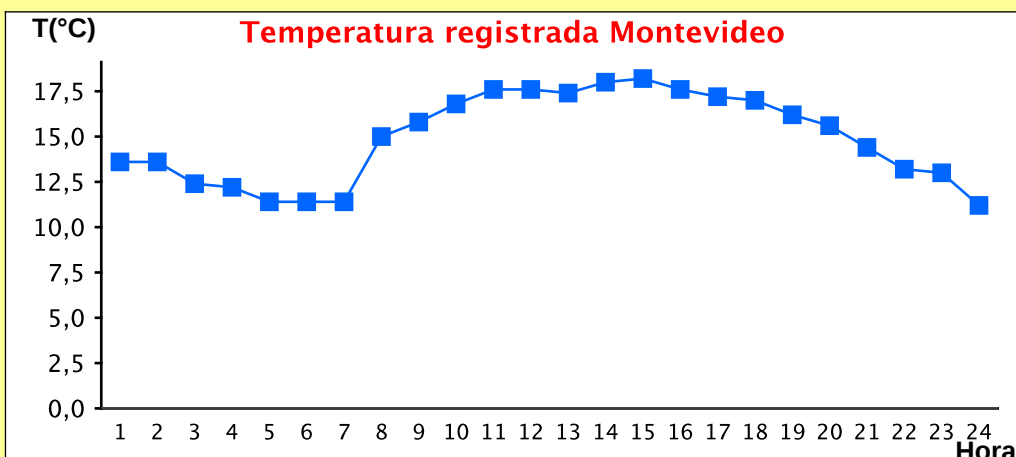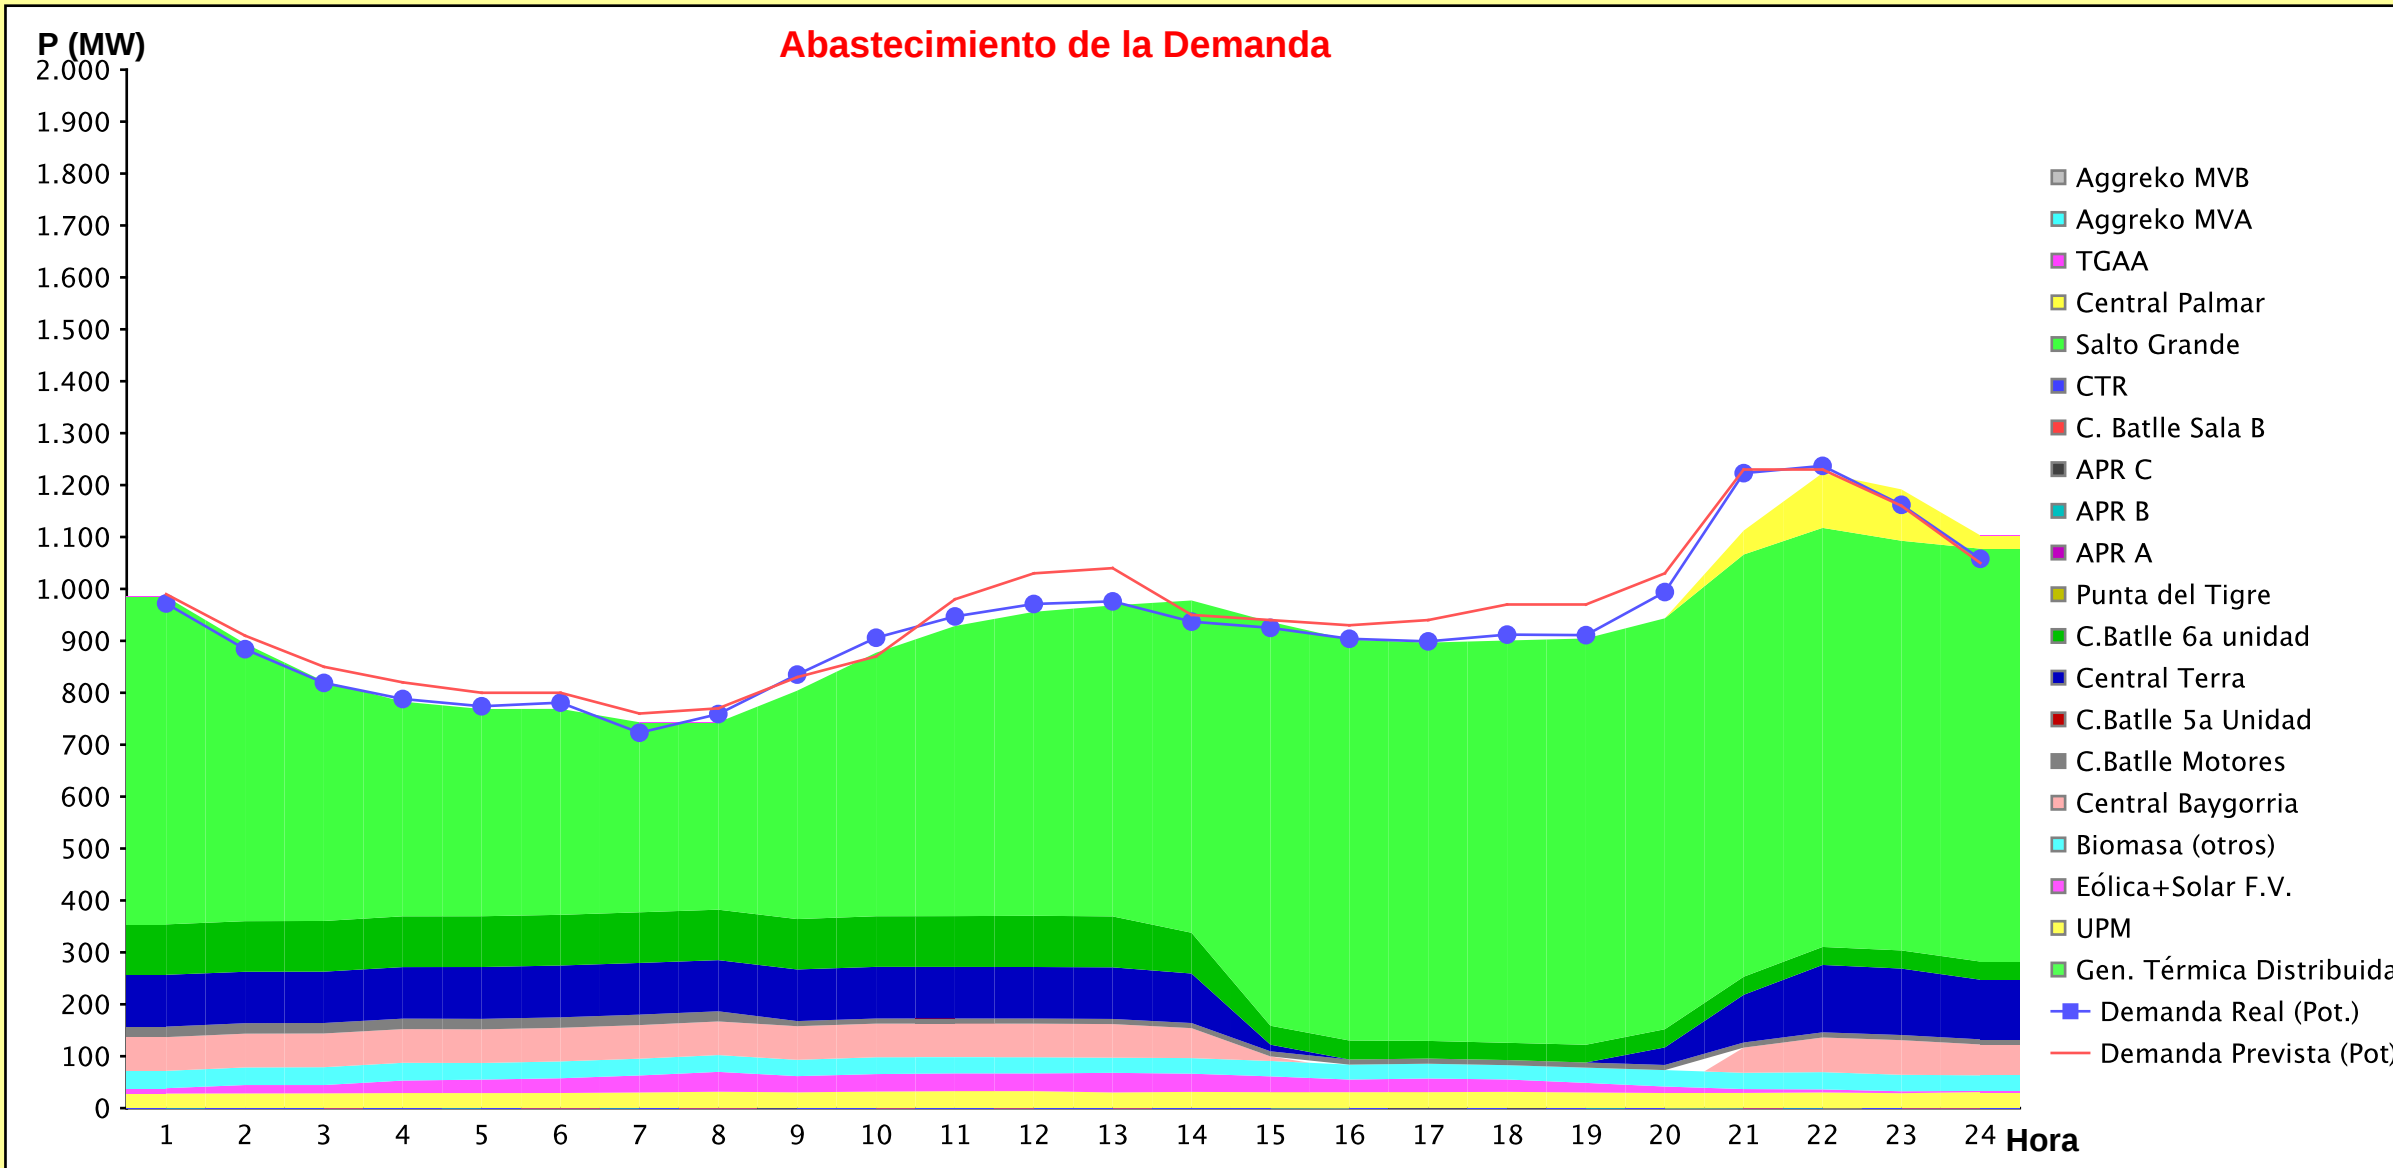



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	991,92 Hora 12:56
Potencia mínima:	705,2 Hora 06:56
Pico noche:	1277,72 Hora 21:50

Generación Media (MW)	
Eólica	23,0
Biomasa	65,9
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

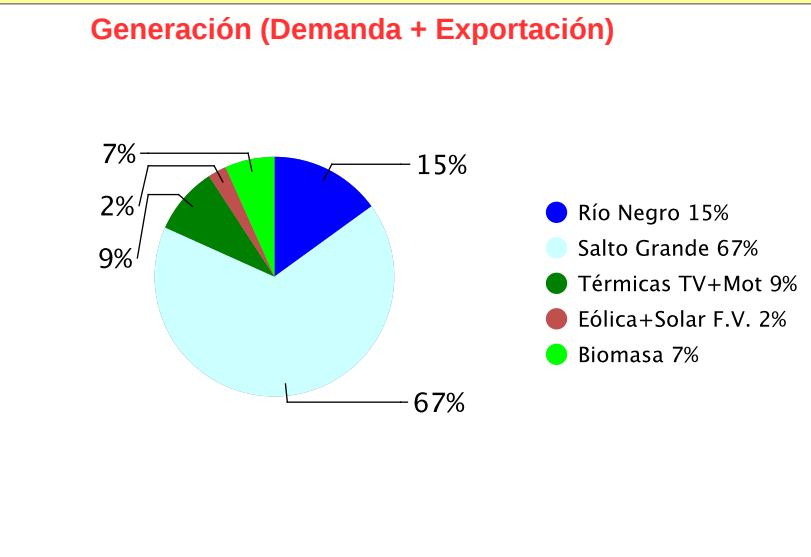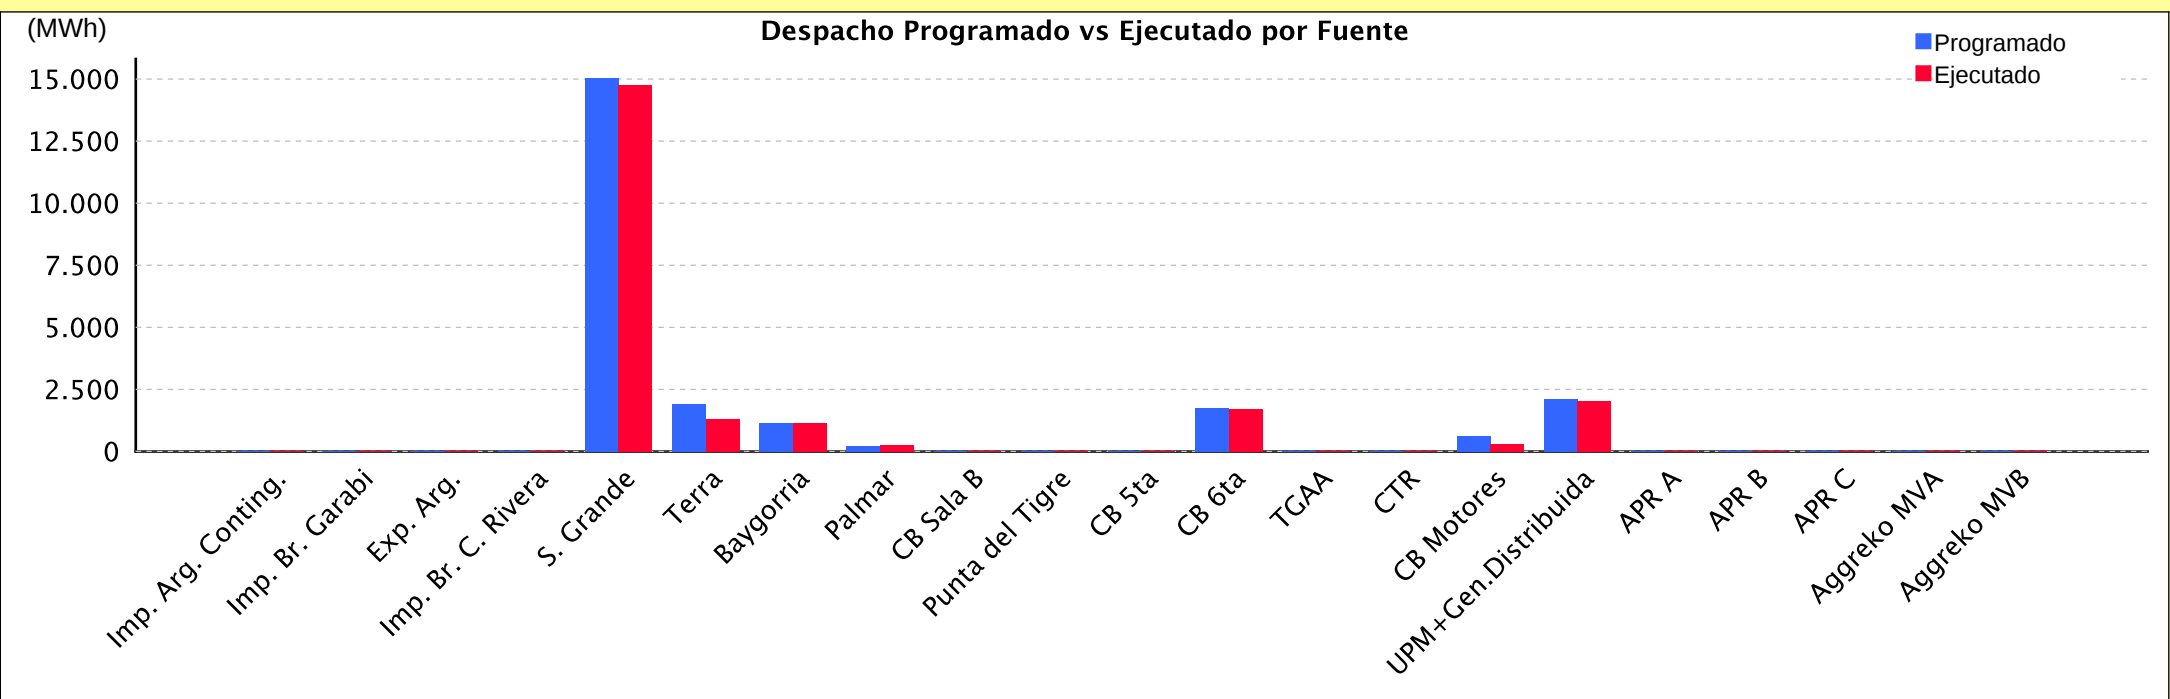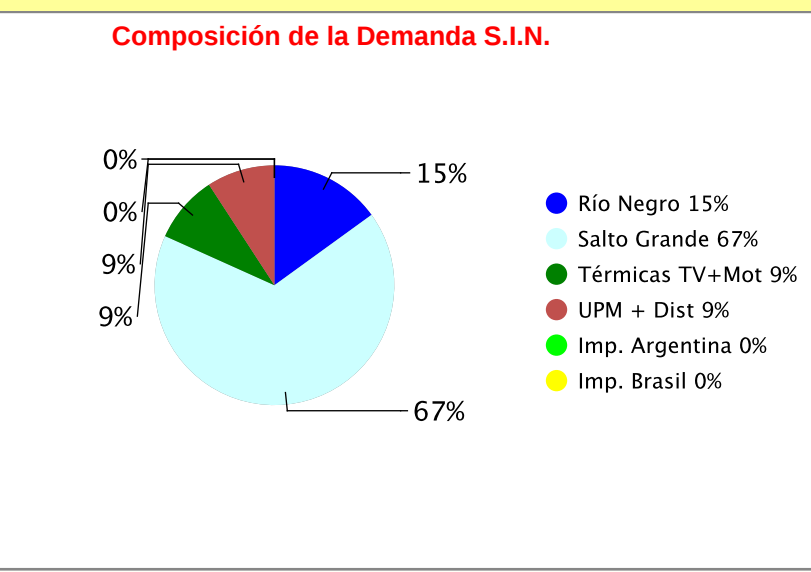



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

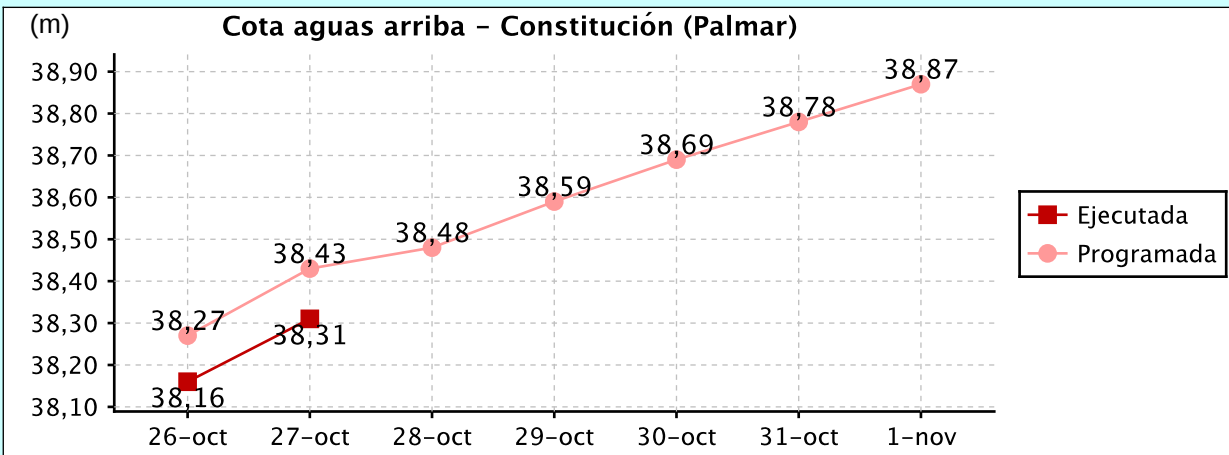
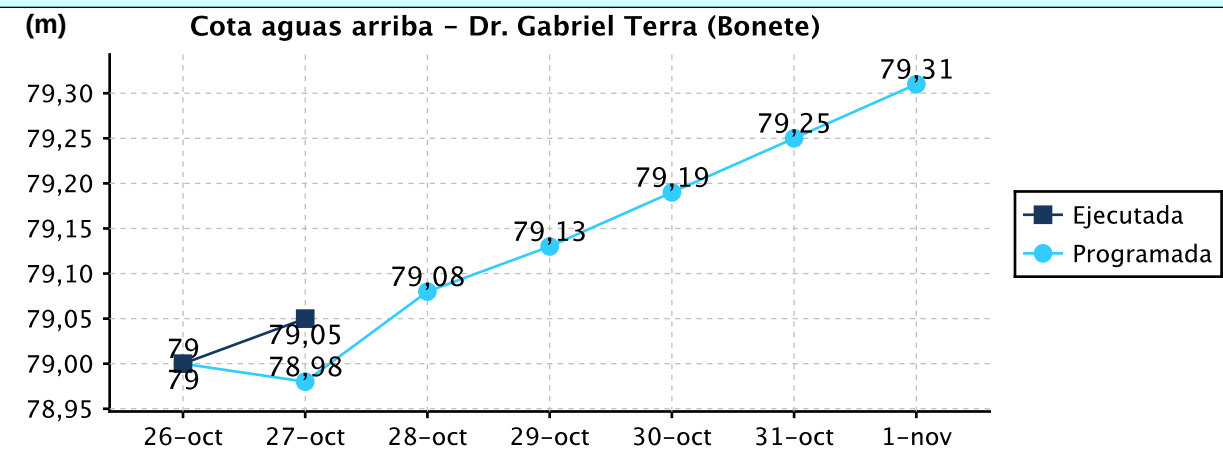


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,98	79,05
Baygorria	53,43	53,66
Palmar	38,43	38,31
SGU	32,33	33,23

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

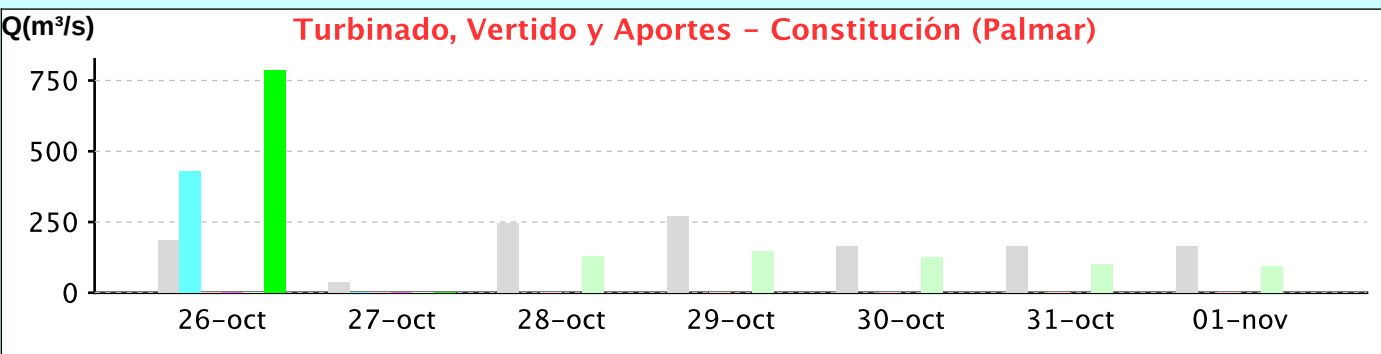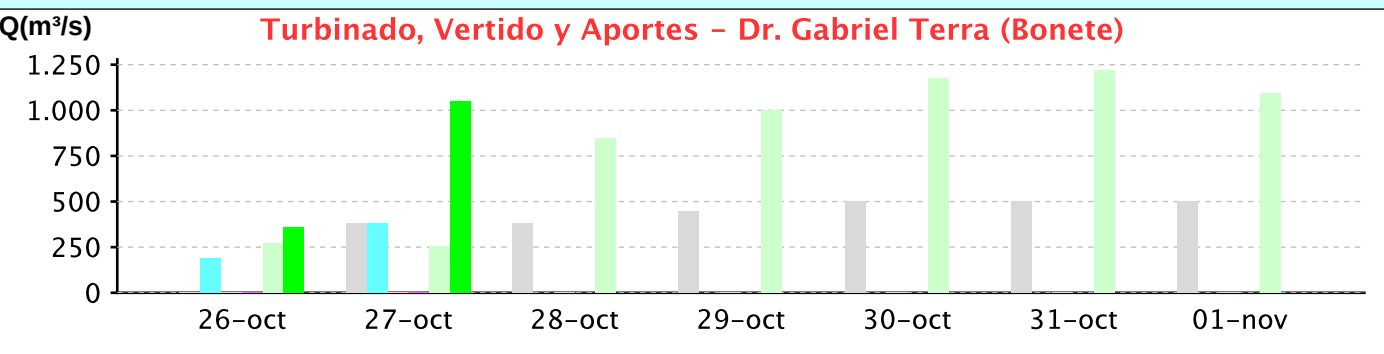

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

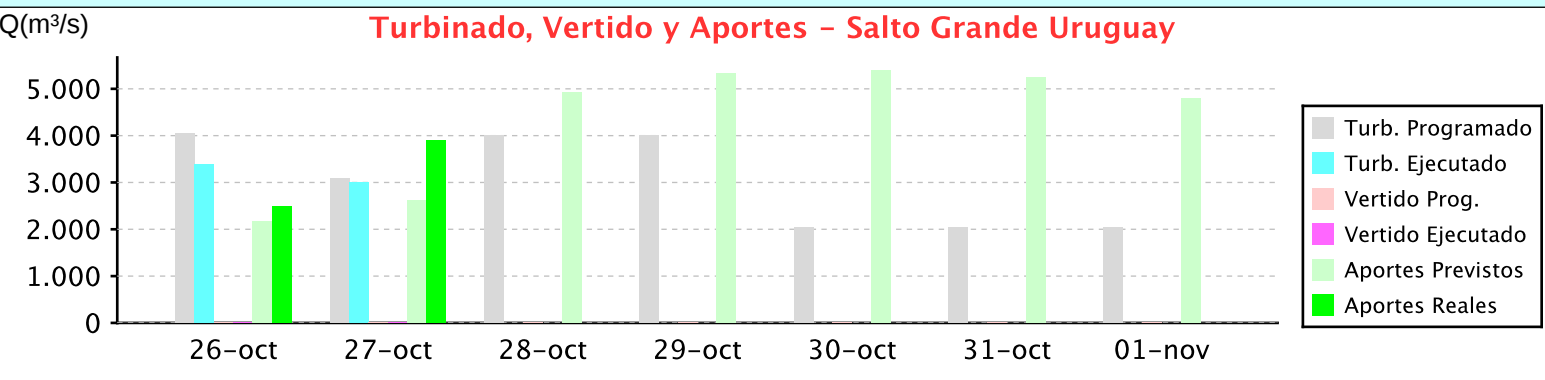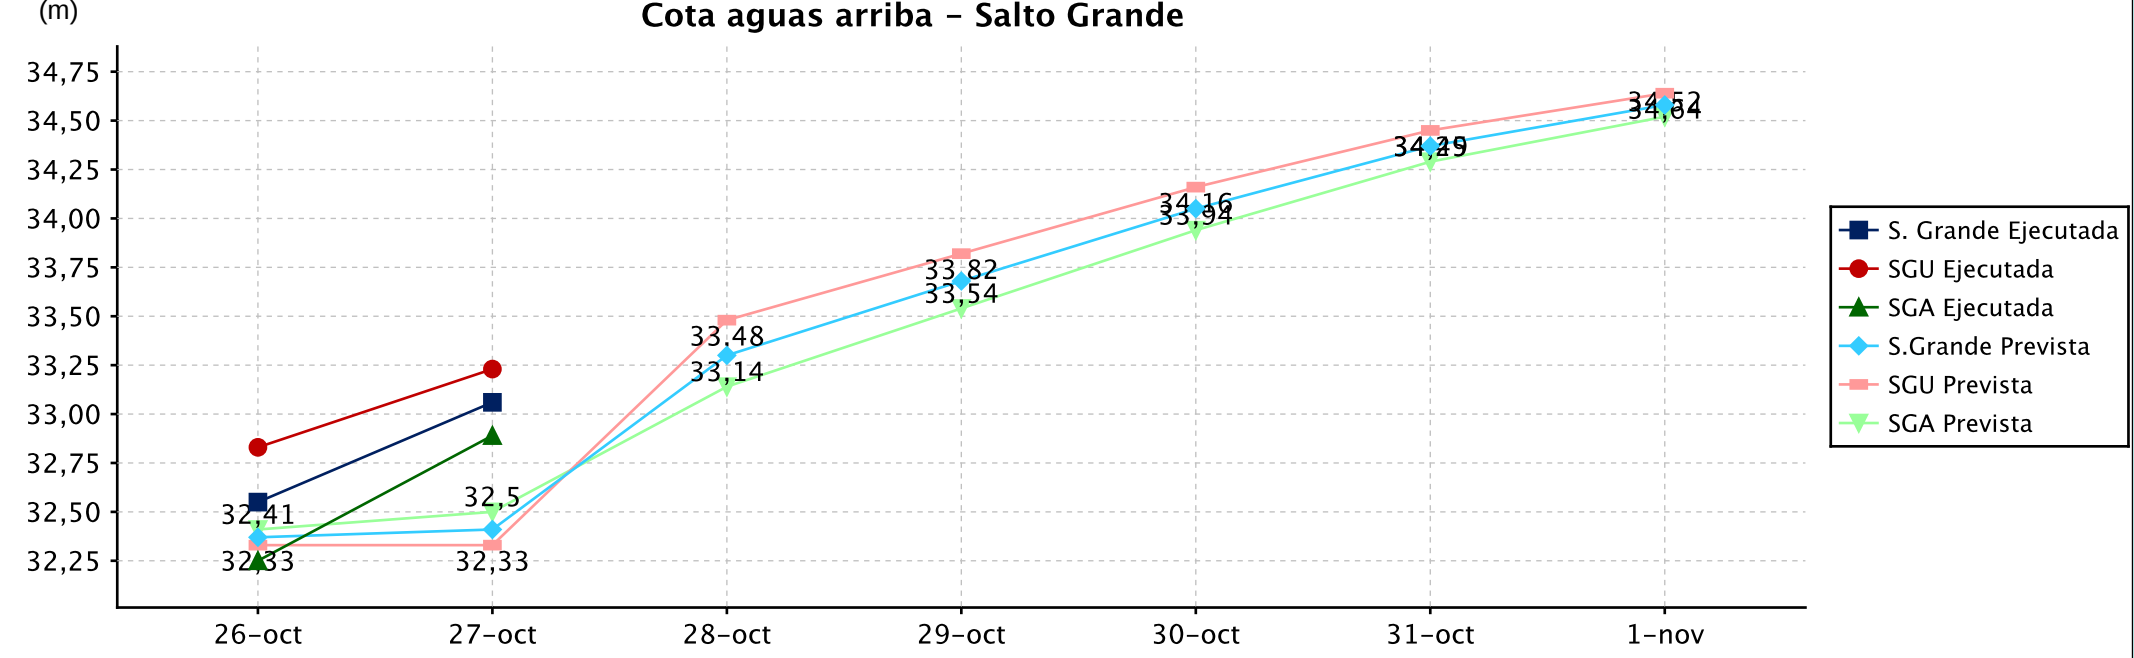

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,23
Cota Vista Arg	32,89
Cota real	33,06

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	6.112
------------------------------------	-------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	379	382
Baygorria	380	370
Palmar	37	0
SGU	3.091	2.997

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	256	1.052
Baygorria	0	495
Palmar	0	0
SGU	2.625	3.904

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
