



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



lunes 28 de octubre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	682
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	515
Motores	171
Central La Tablada	-90
Central P. del Tigre	-10
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-2
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.925
C. Baygorria	1.107
C. Palmar	1.599
C. Salto Grande	19.003
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.467
TOTAL Generación	25.676

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.676
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.350
Diferencia (MWh)	-674
Ejecutada - Programada	-2,56 %

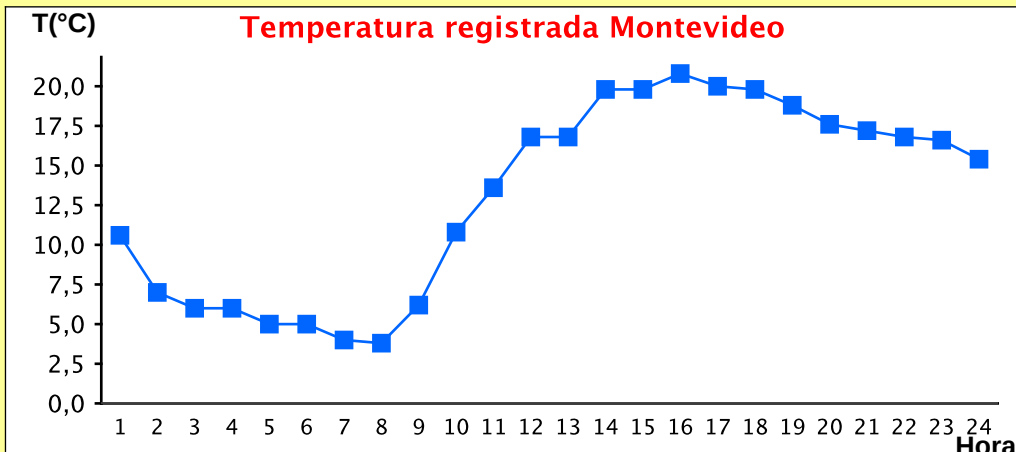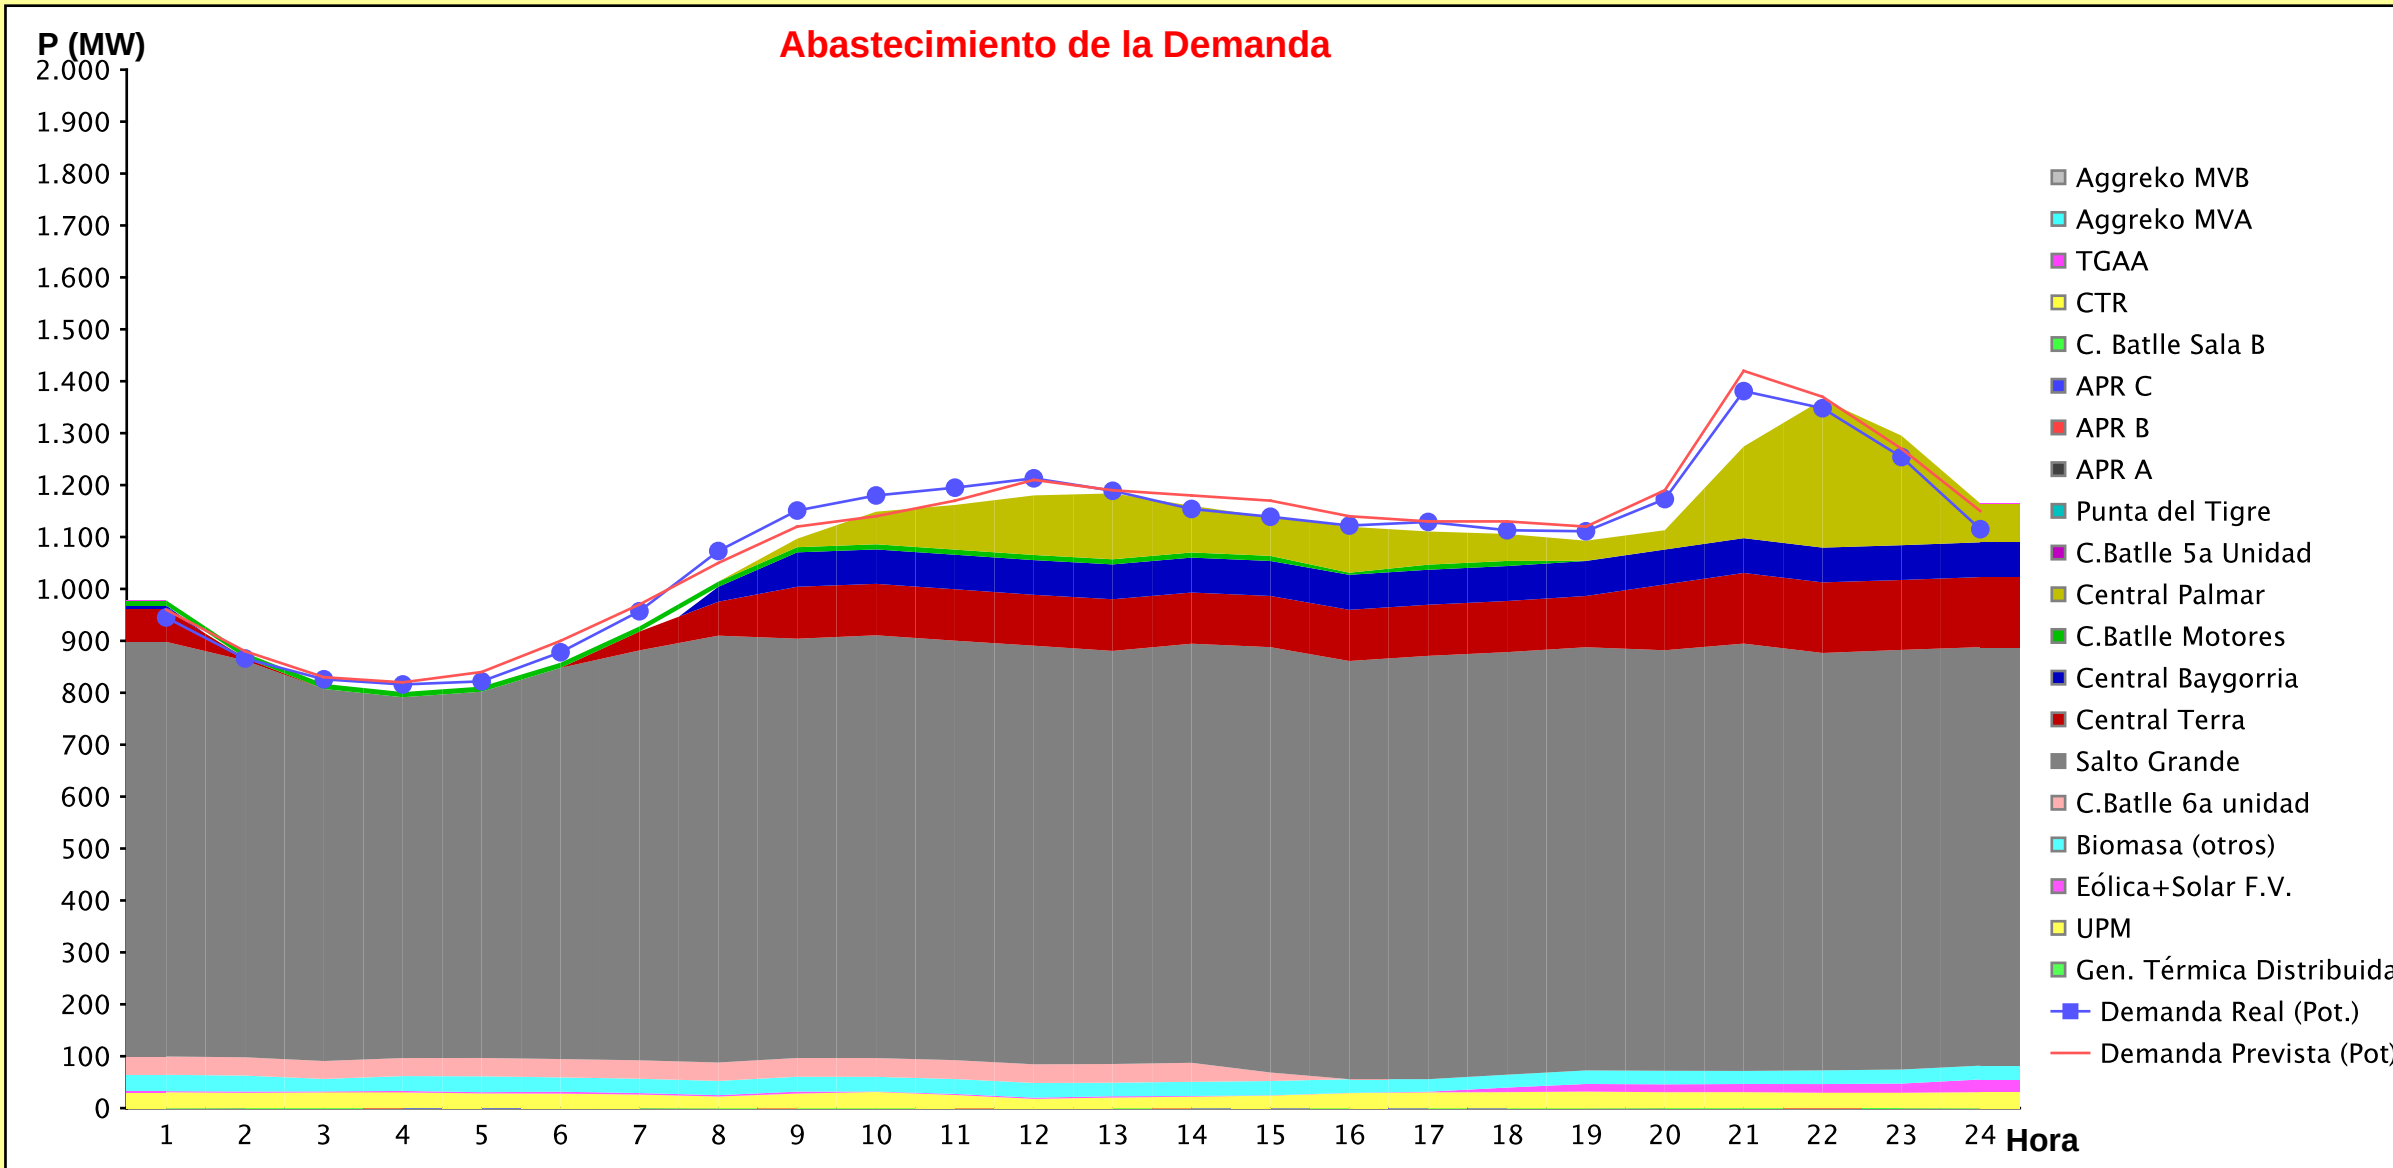



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1221,47 Hora 11:47
Potencia mínima:	820 Hora 03:51
Pico noche:	1385,31 Hora 21:11

Generación Media (MW)	
Eólica	6,6
Biomasa	60,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

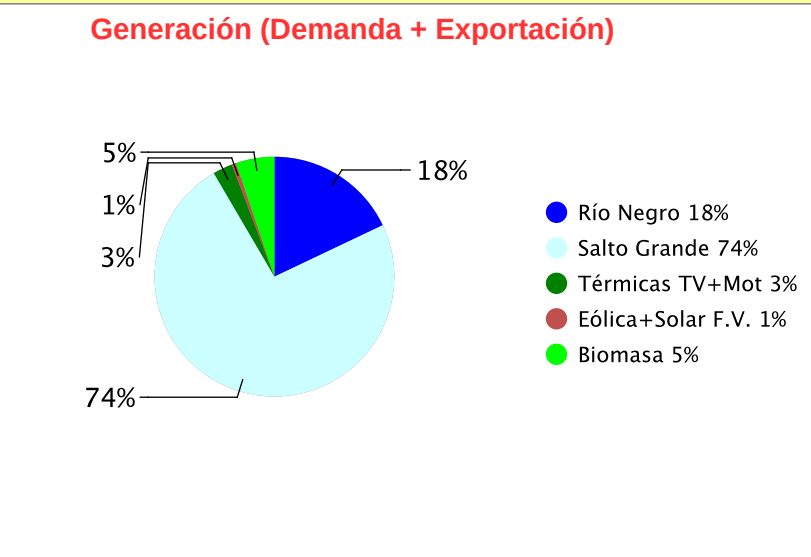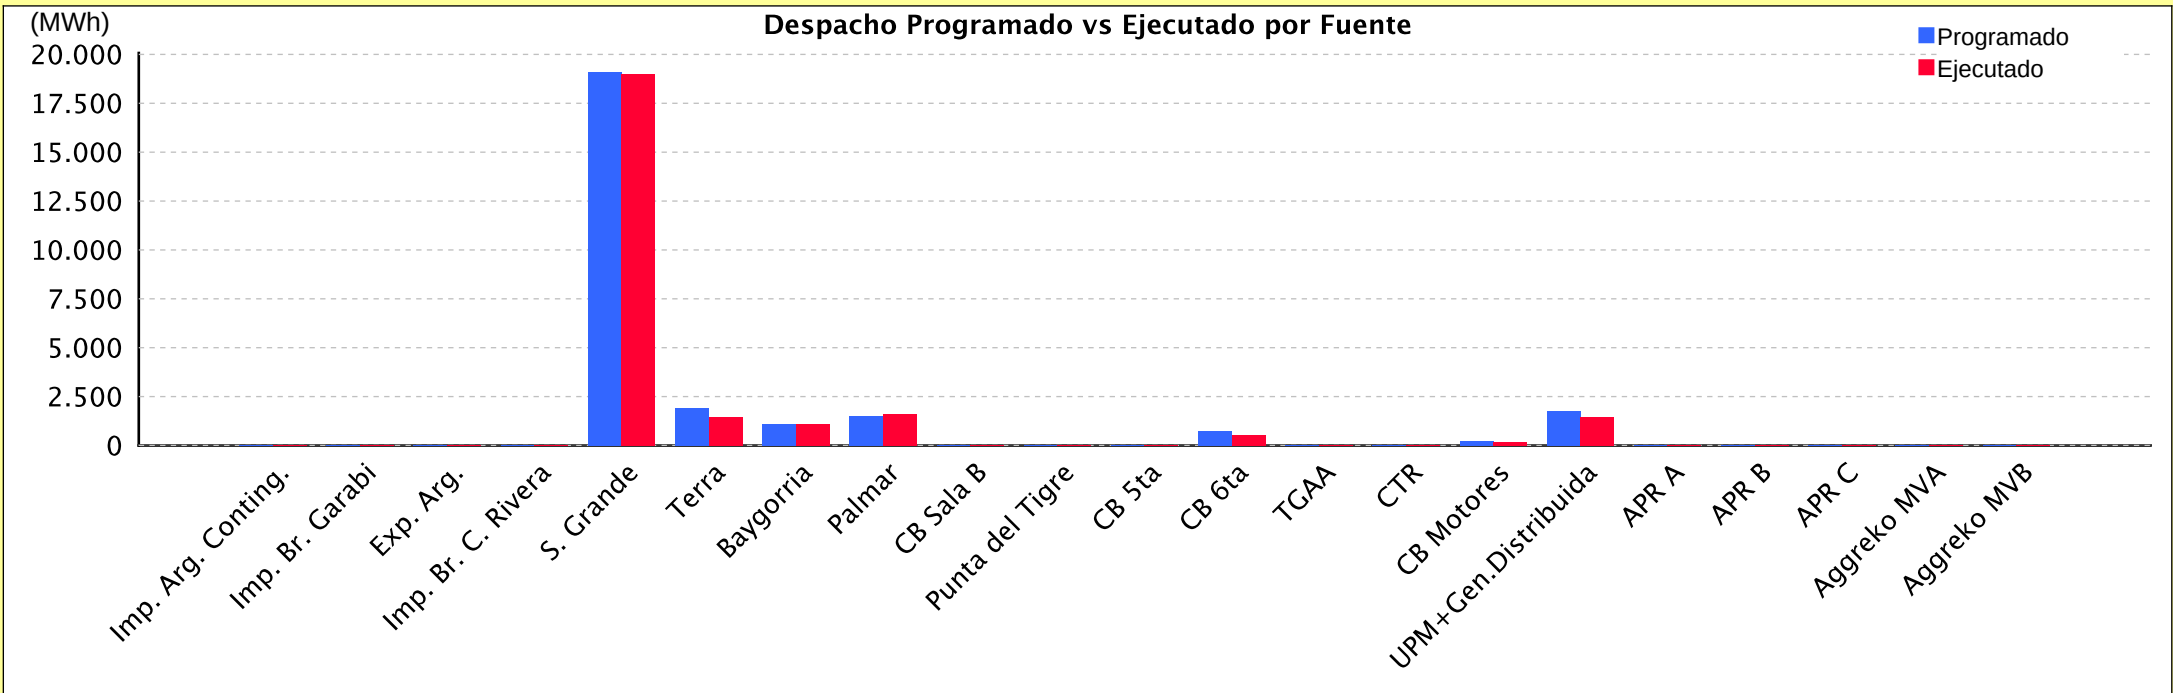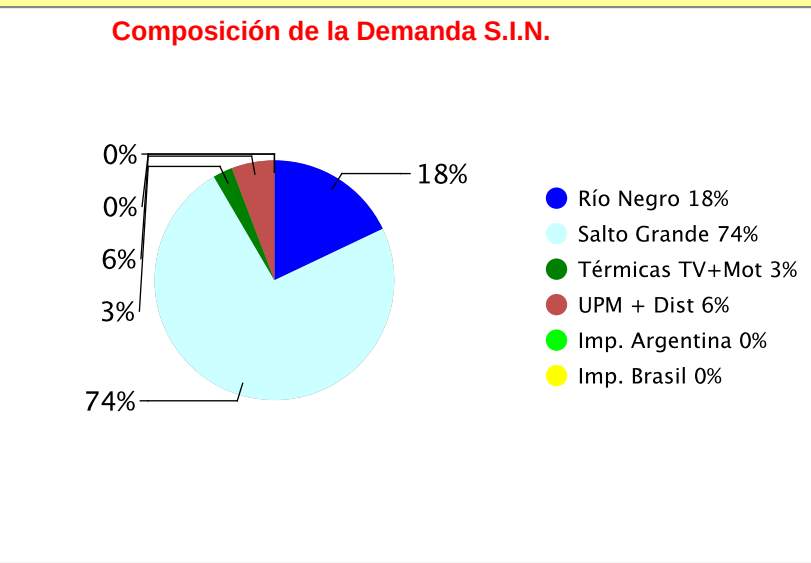



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

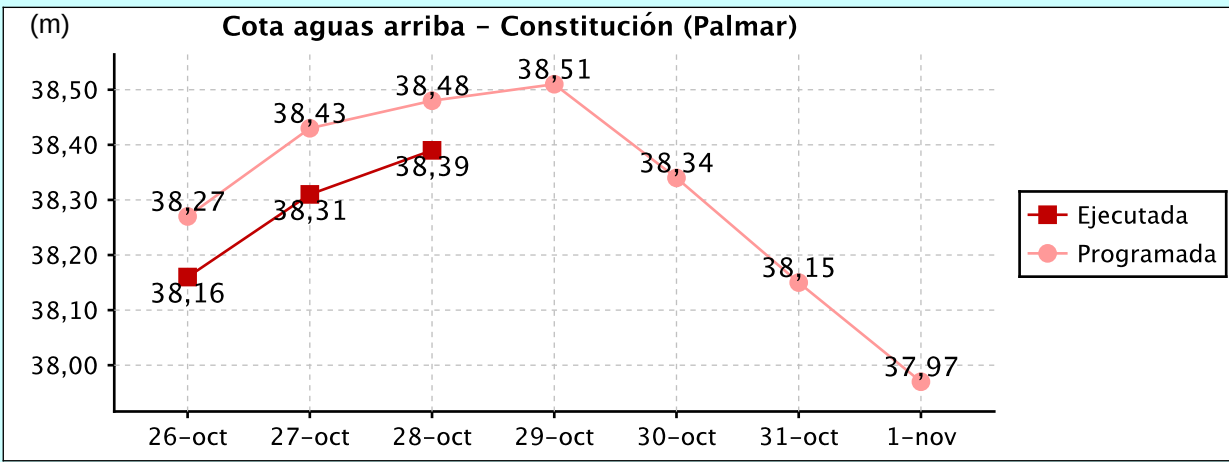
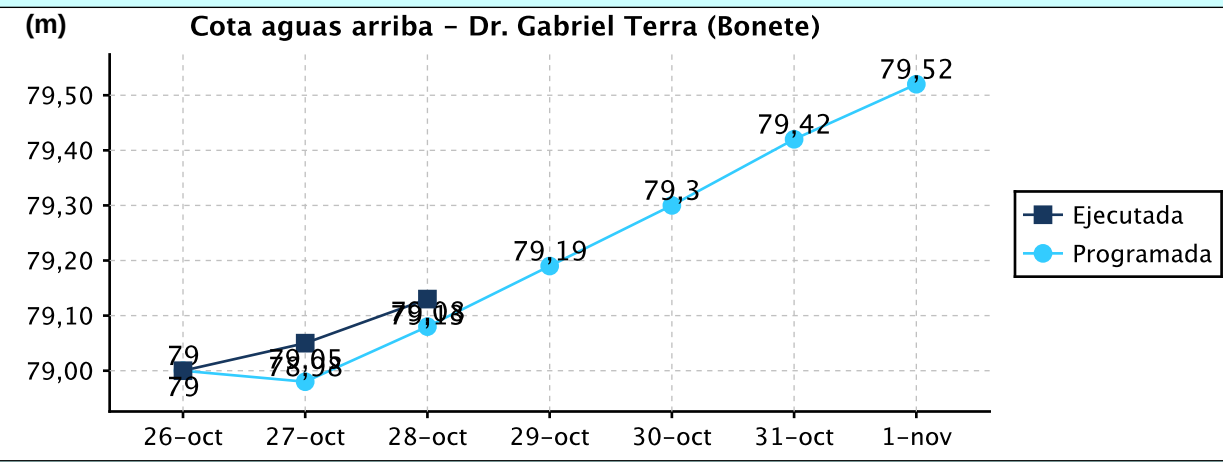


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,08	79,13
Baygorria	53,69	53,74
Palmar	38,48	38,39
SGU	33,48	33,54

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

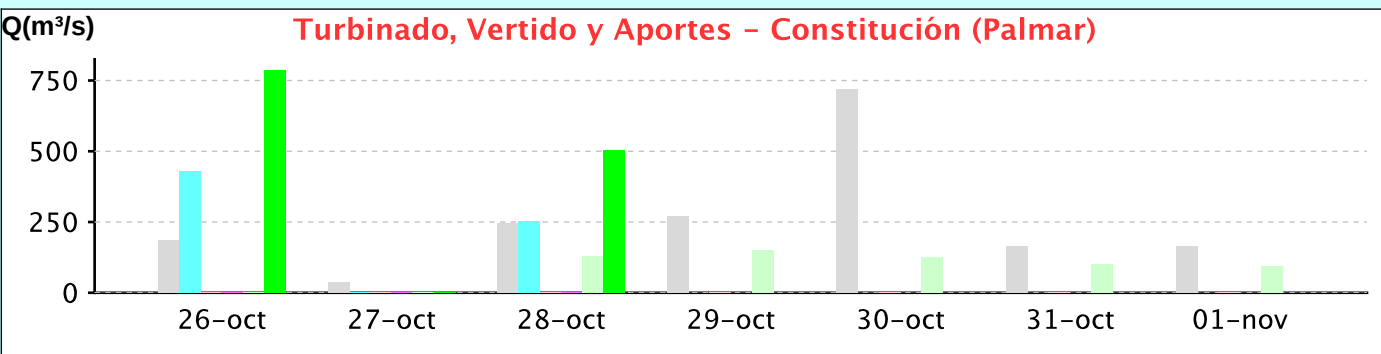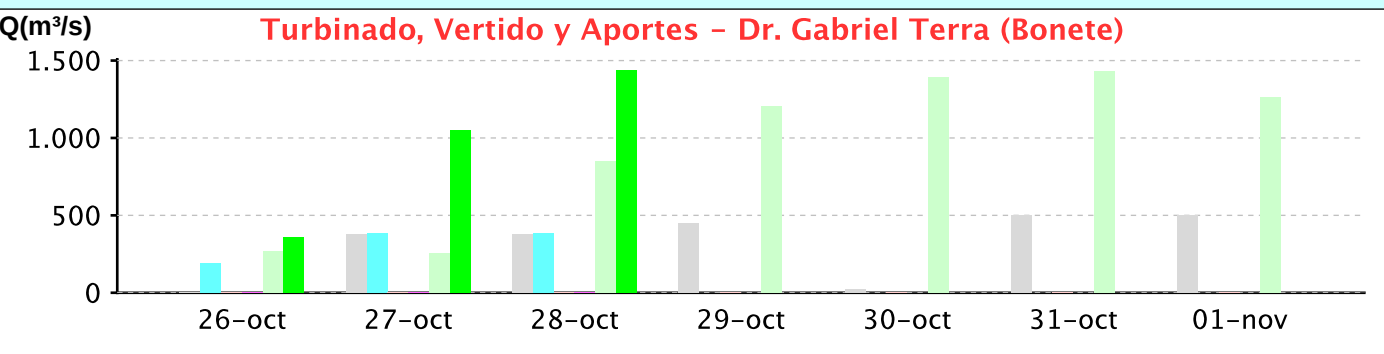

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

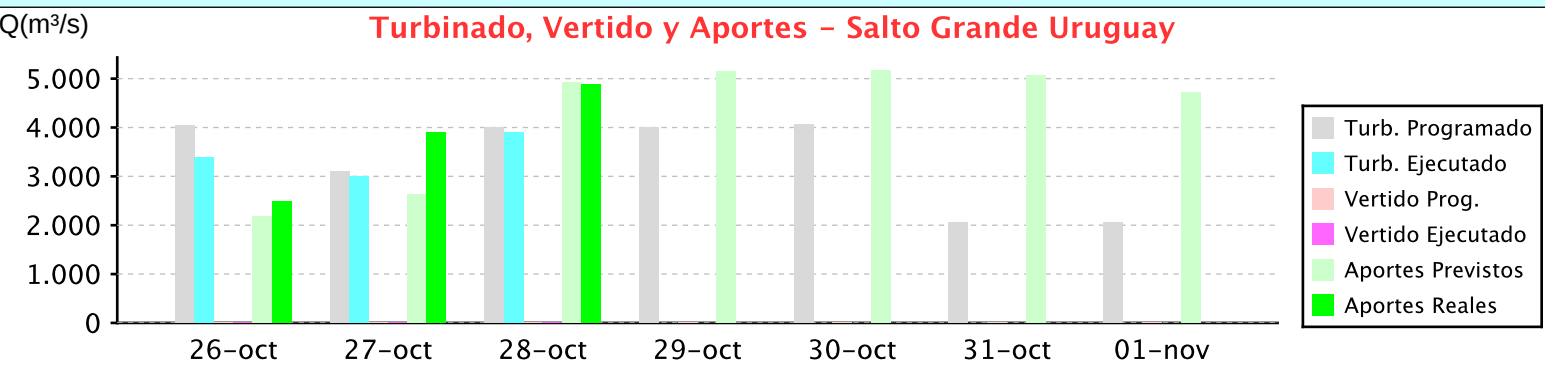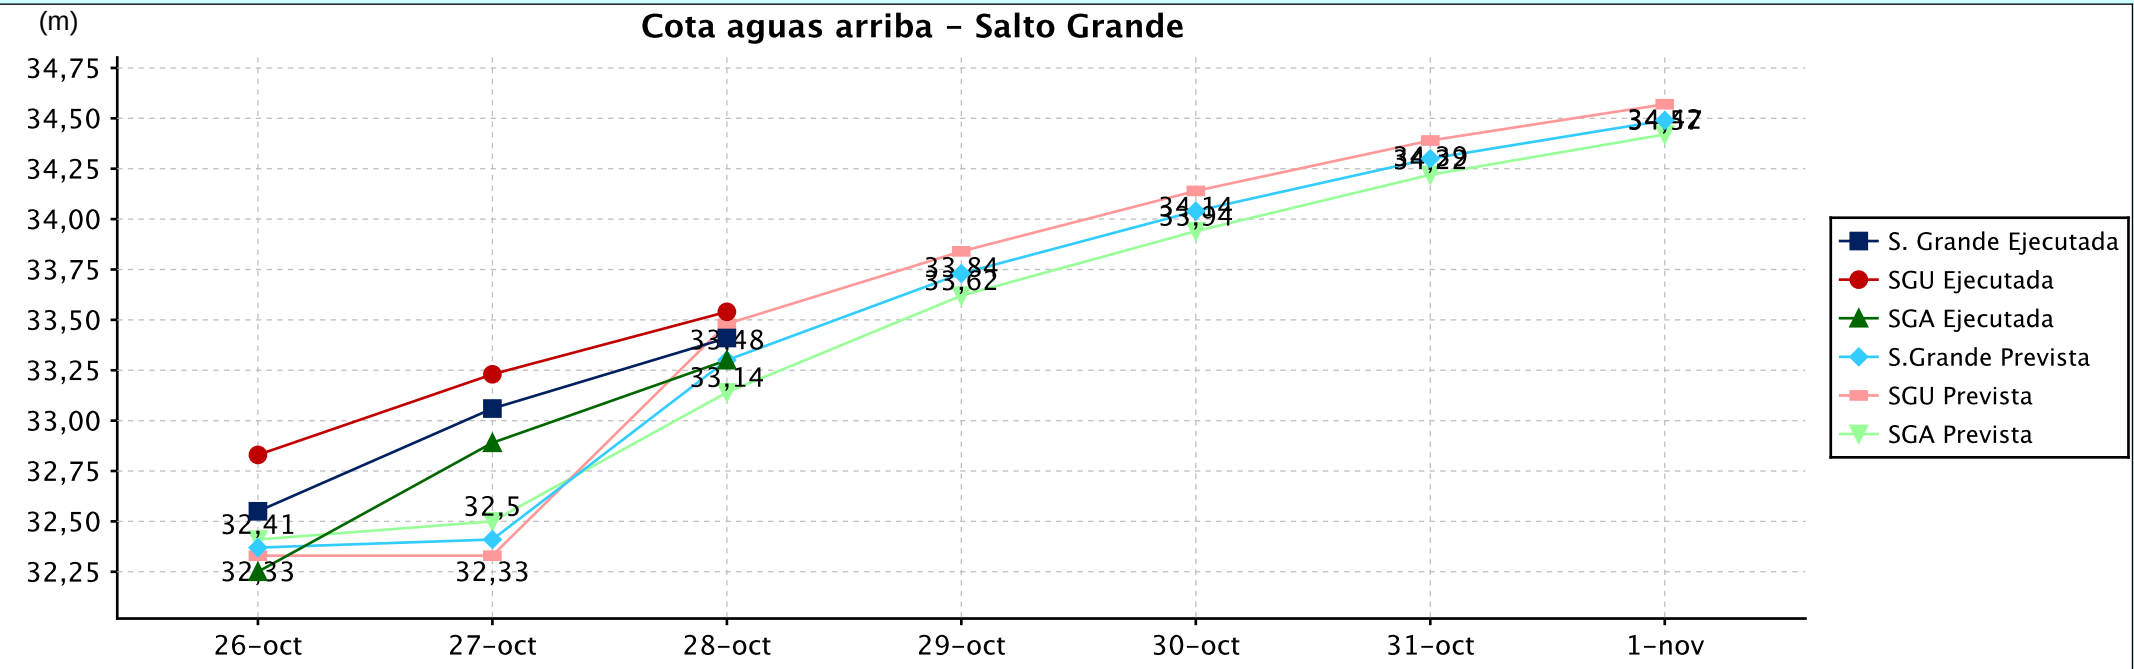

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,54
Cota Vista Arg	33,30
Cota real	33,41

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	4.590
------------------------------------	-------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	381	384
Baygorria	365	358
Palmar	245	253
SGU	4.005	3.903

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	848	1.436
Baygorria	23	460
Palmar	128	504
SGU	4.925	4.872

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
