



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



martes 29 de octubre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-1
Central La Tablada	-90
Central P. del Tigre	-10
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-1
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	-0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.456
C. Baygorria	1.106
C. Palmar	2.336
C. Salto Grande	19.444
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.825
TOTAL Generación	26.053

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.053
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.740
Diferencia (MWh)	-687
Ejecutada - Programada	-2,57 %

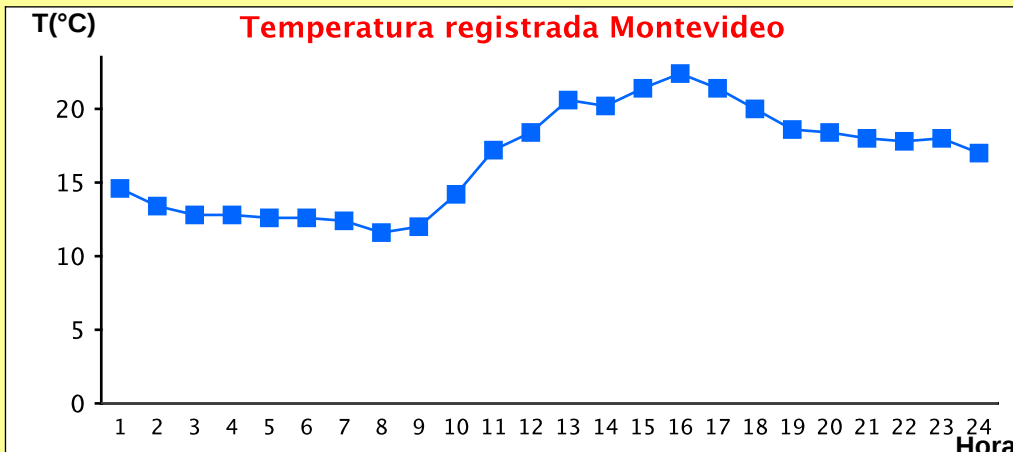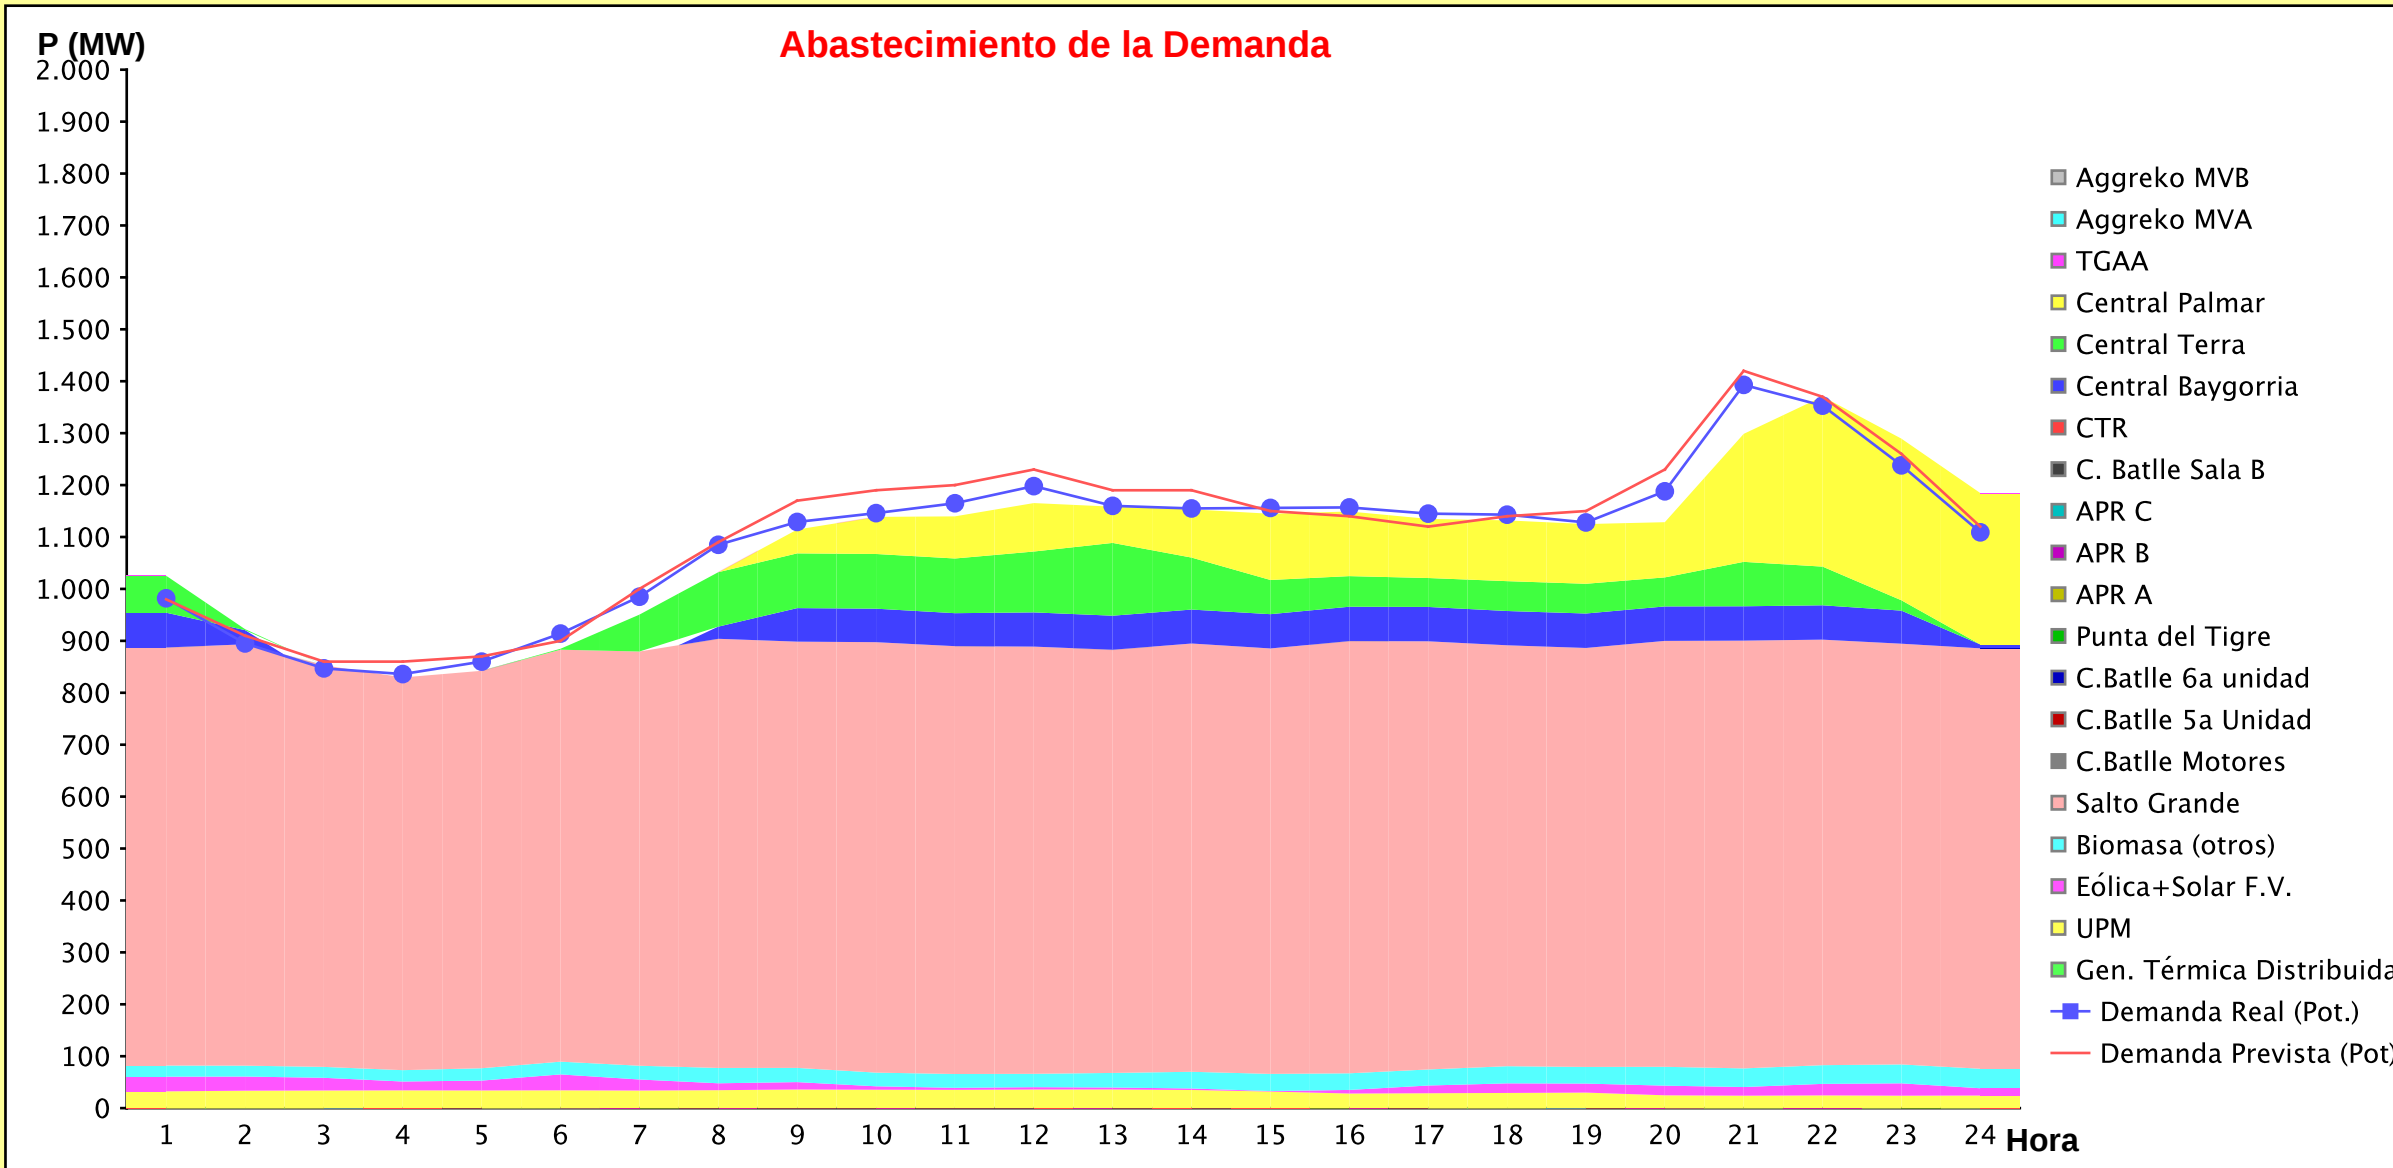



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1205,74 Hora 11:56
Potencia mínima:	829,29 Hora 03:42
Pico noche:	1401,37 Hora 21:00

Generación Media (MW)	
Eólica	15,6
Biomasa	65,4
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

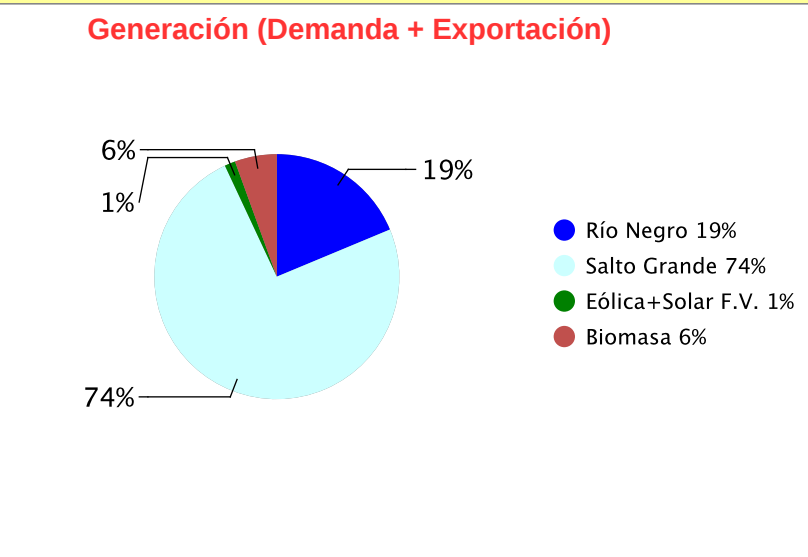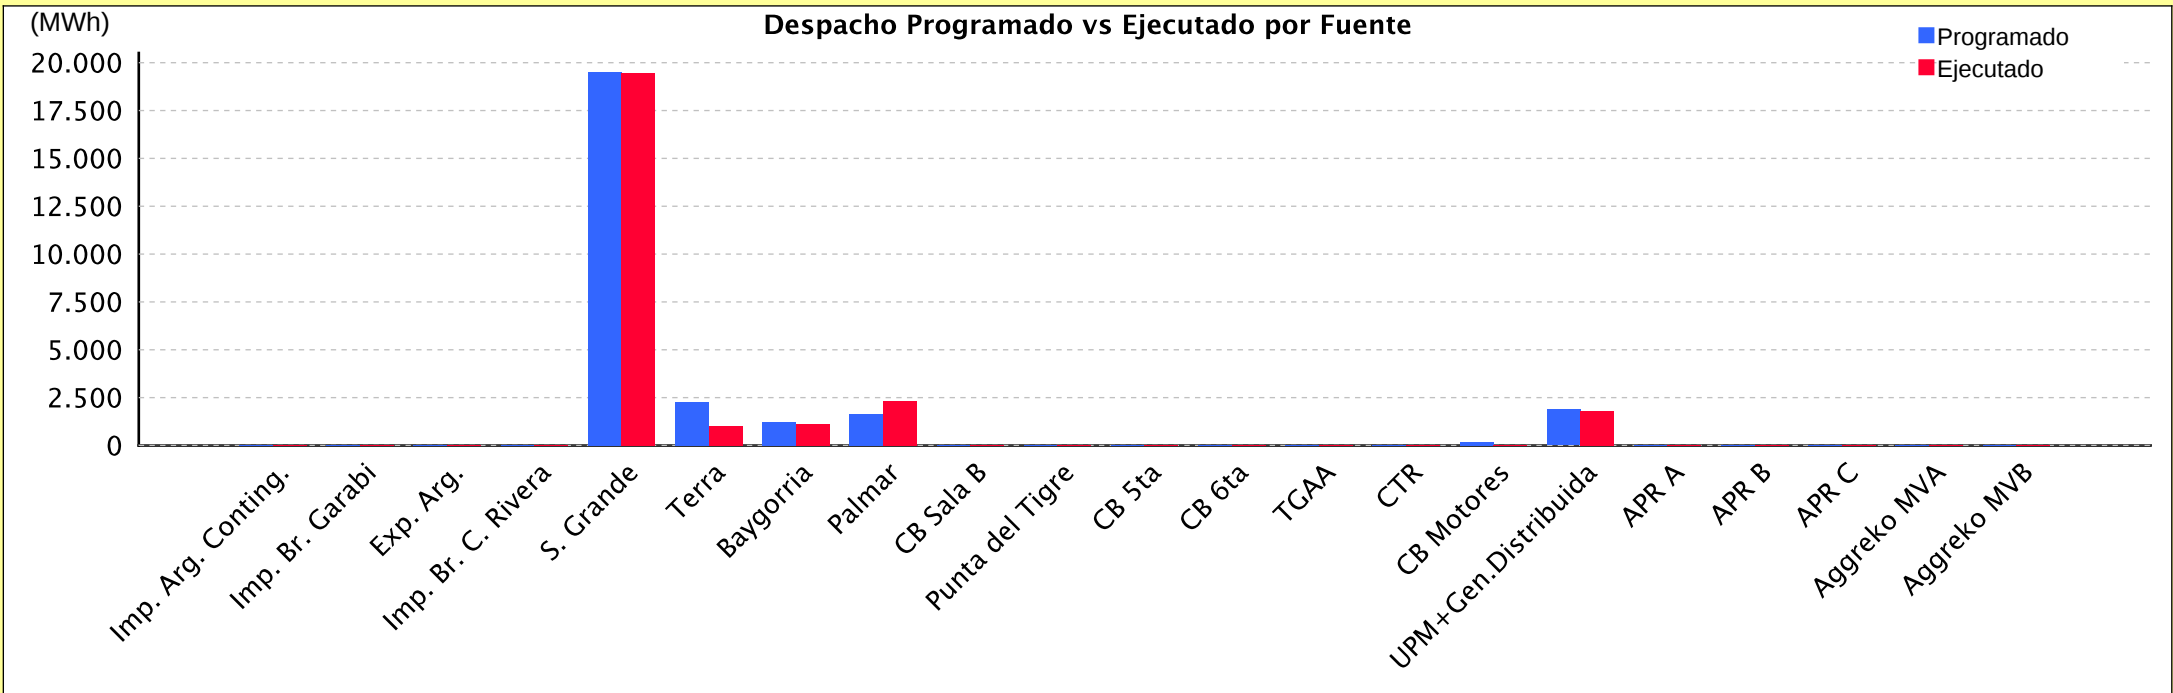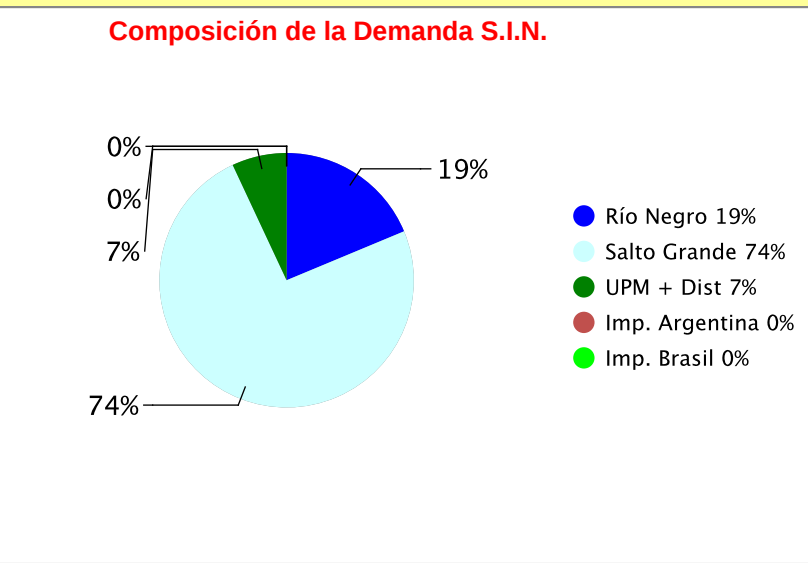



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

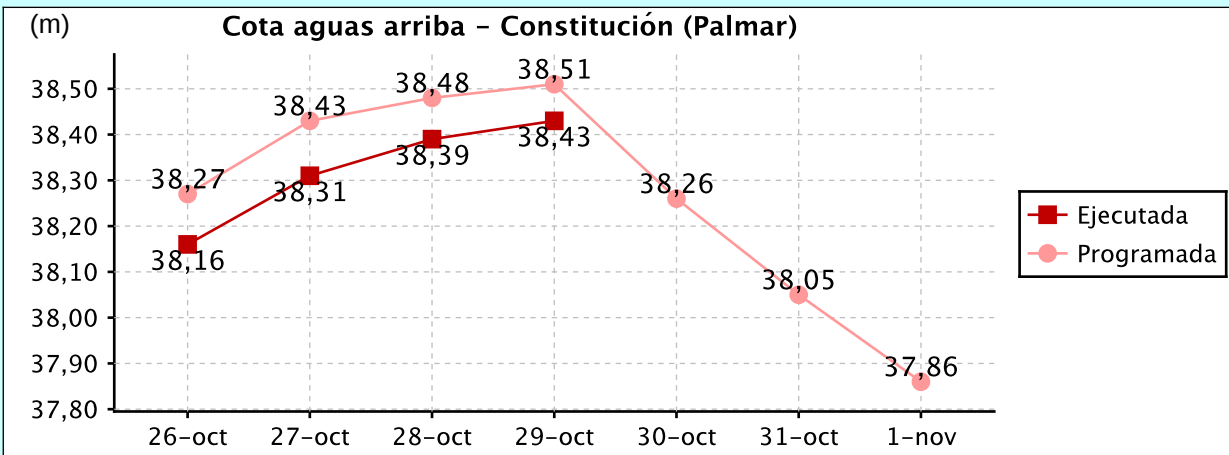
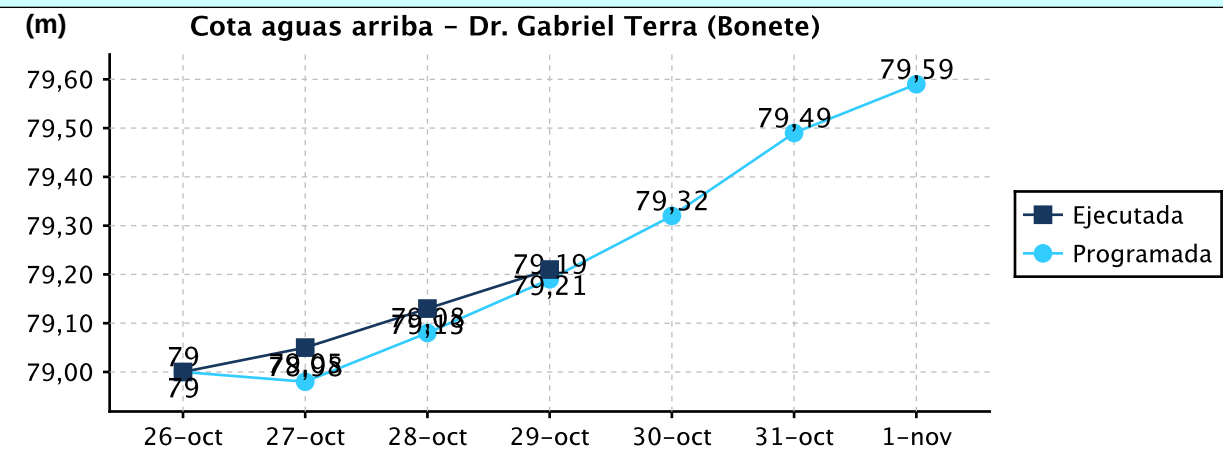


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,19	79,21
Baygorria	53,79	53,75
Palmar	38,51	38,43
SGU	33,84	33,78

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

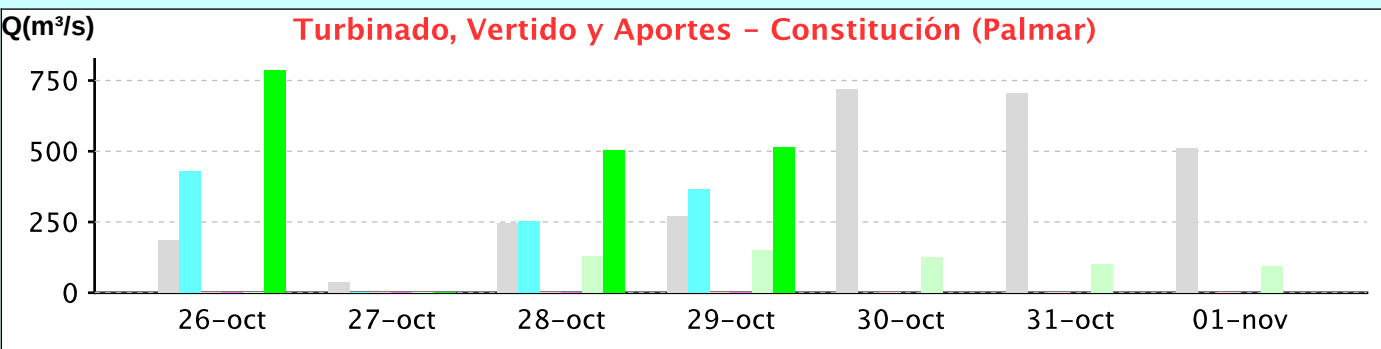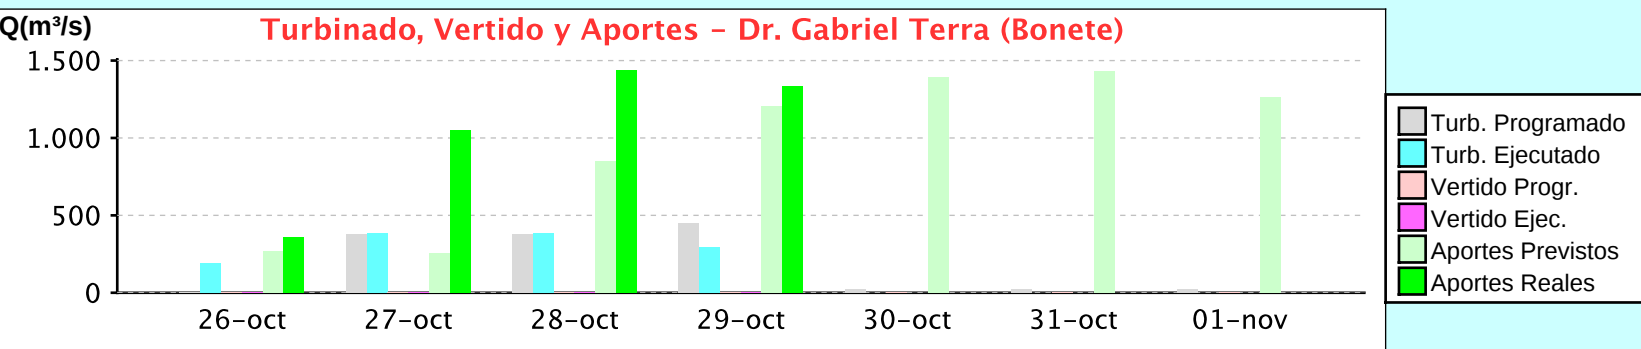

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

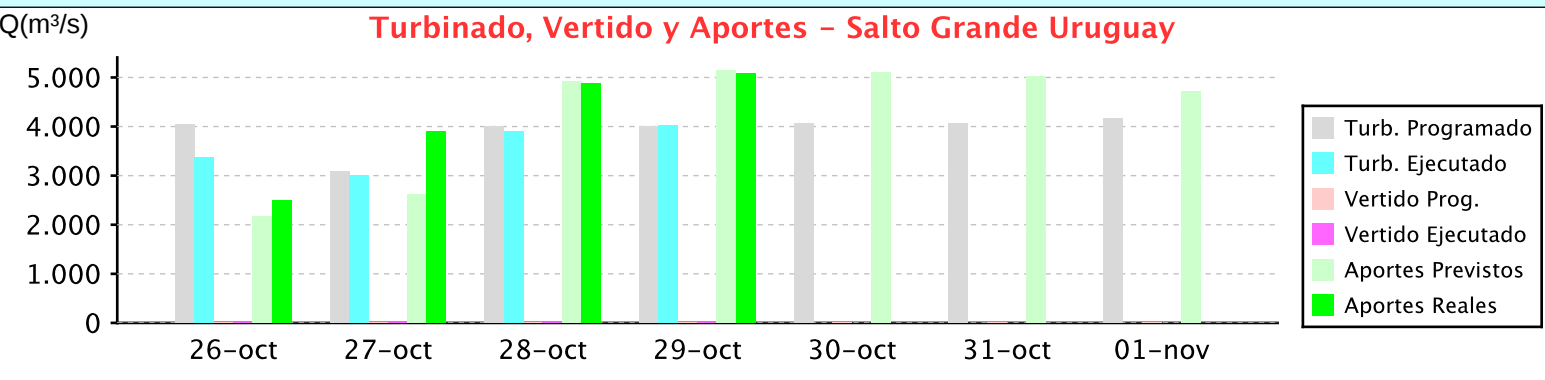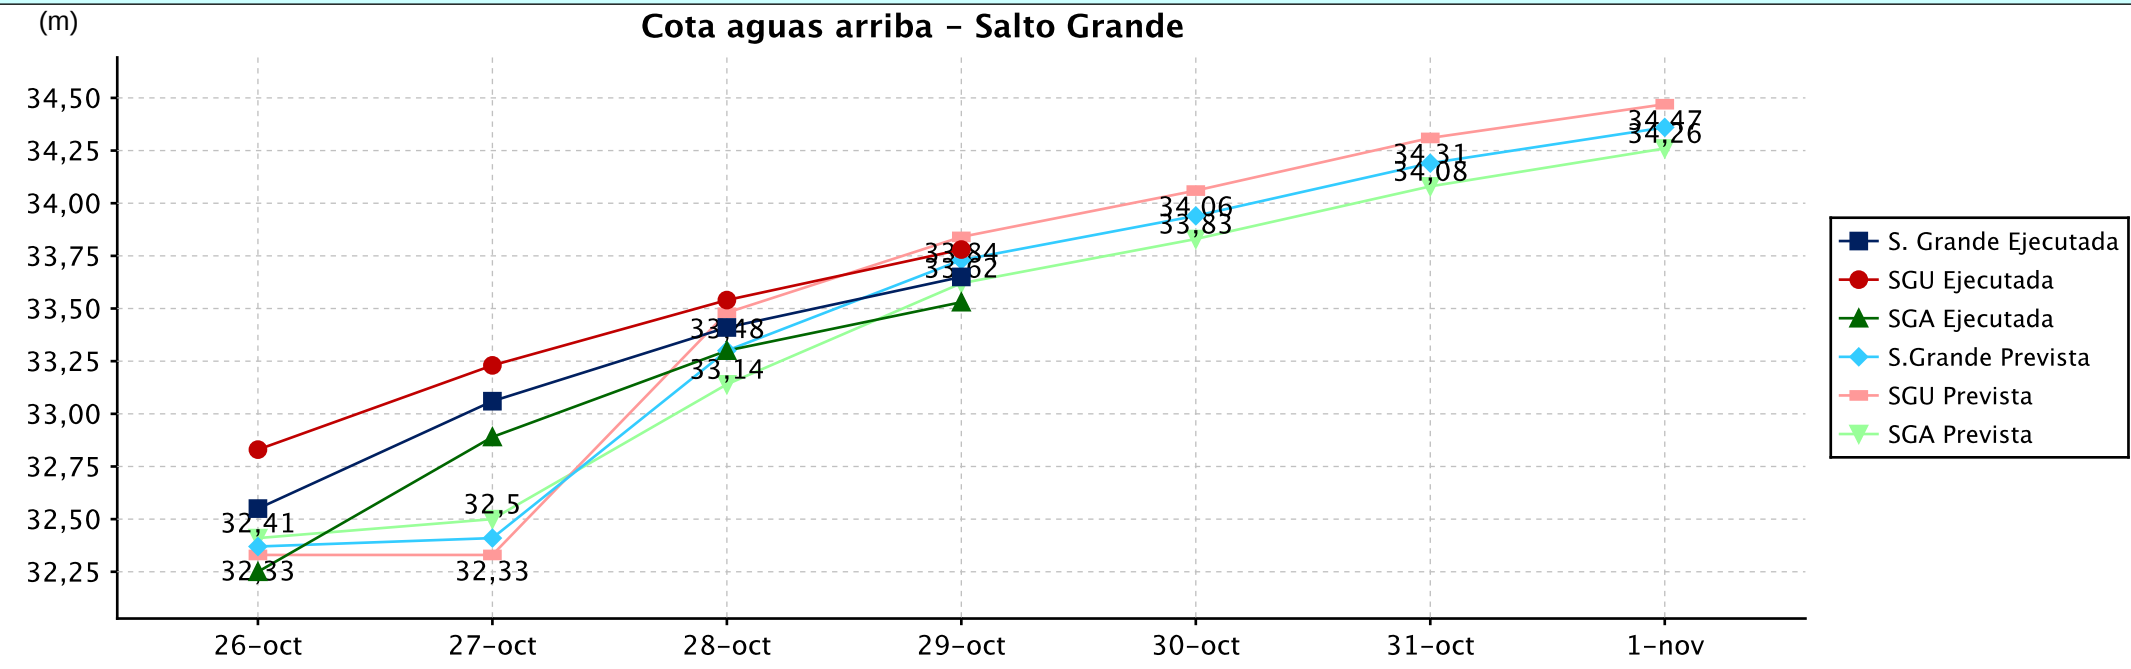

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,78
Cota Vista Arg	33,53
Cota real	33,65

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	5.020
------------------------------------	-------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	448	292
Baygorria	393	360
Palmar	270	368
SGU	3.997	4.013

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.205	1.334
Baygorria	8	381
Palmar	149	515
SGU	5.150	5.092

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
