



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



sábado 02 de noviembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-98
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-3
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	0
C. Baygorria	219
C. Palmar	2.818
C. Salto Grande	19.821
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.695
TOTAL Generación	24.433

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	24.433
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	25.480
Diferencia (MWh)	-1.047
Ejecutada - Programada	-4,11 %

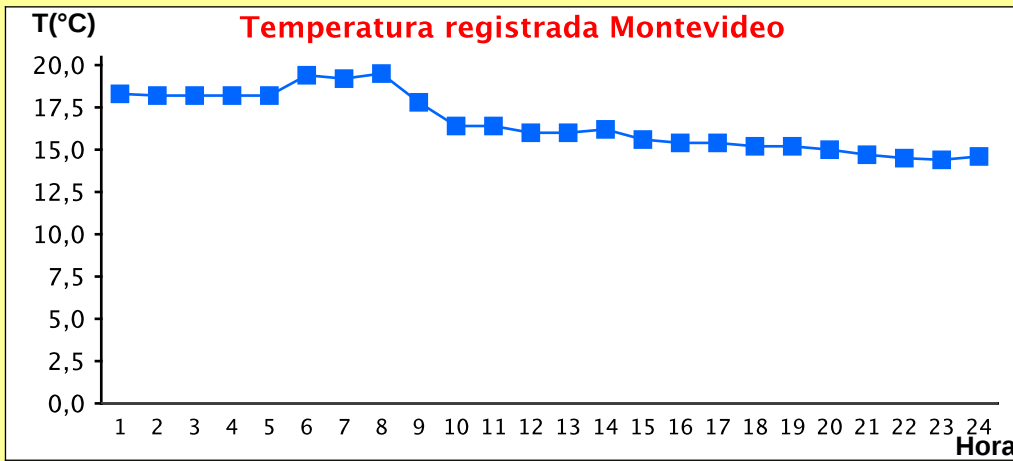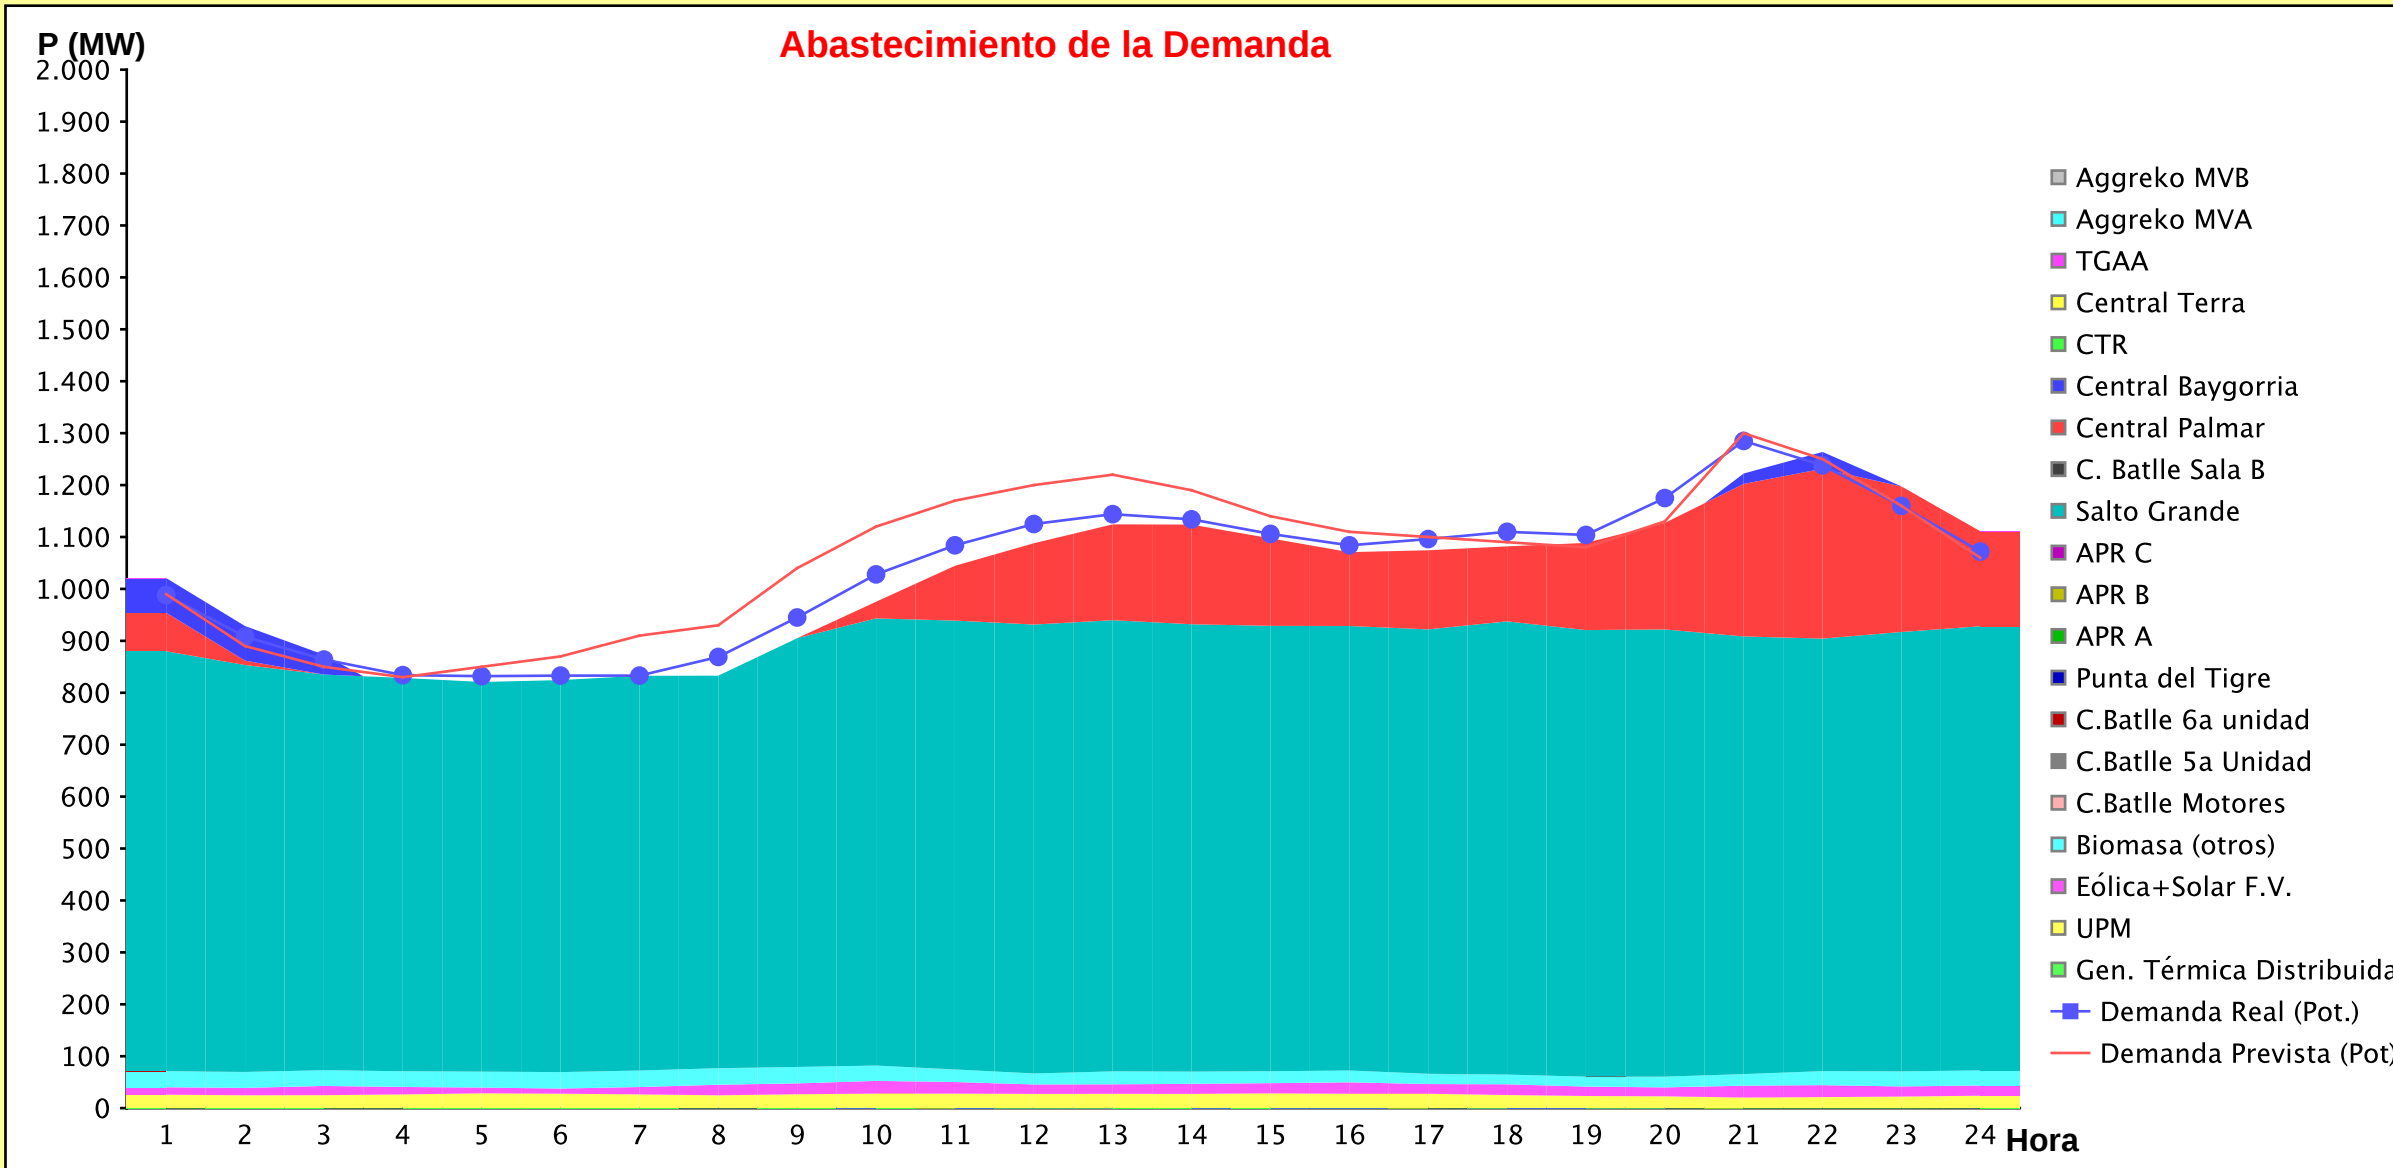



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1149,44 Hora 12:59
Potencia mínima:	884,32 Hora 04:24
Pico noche:	1286,1 Hora 20:53

Generación Media (MW)	
Eólica	18,7
Biomasa	60,5
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

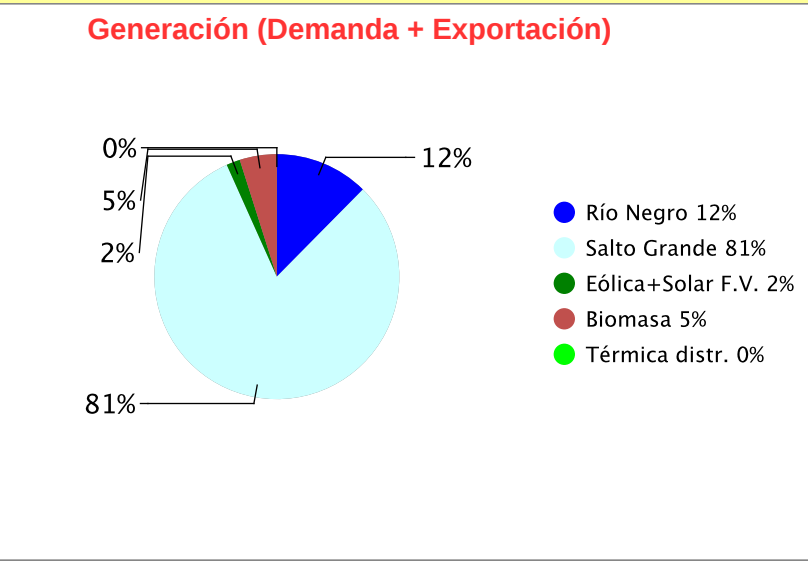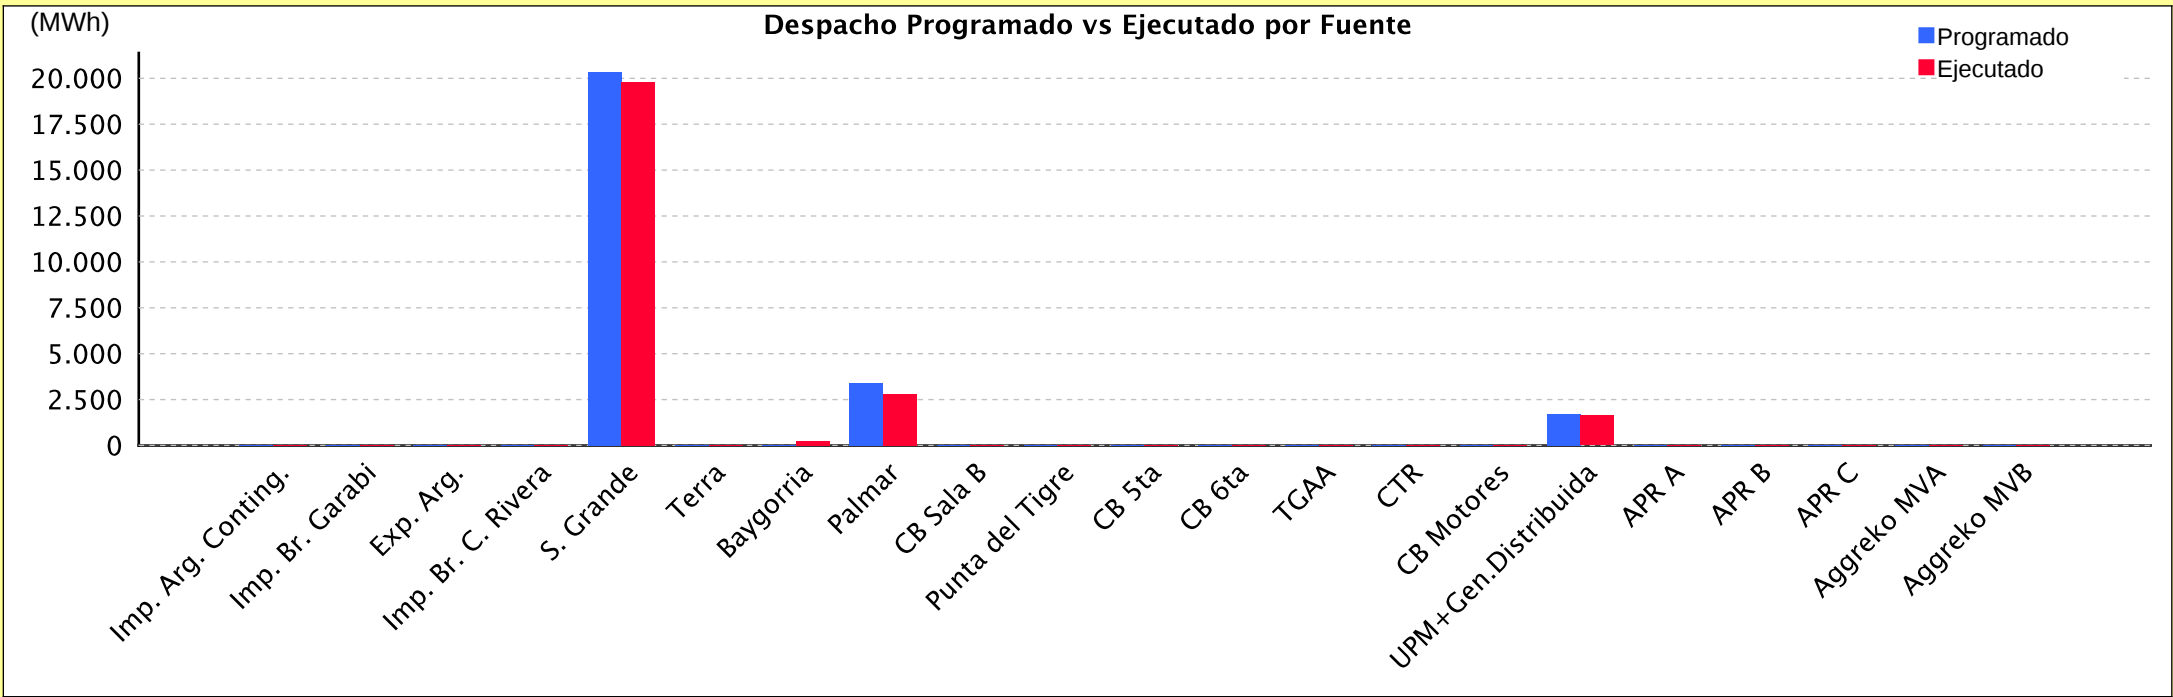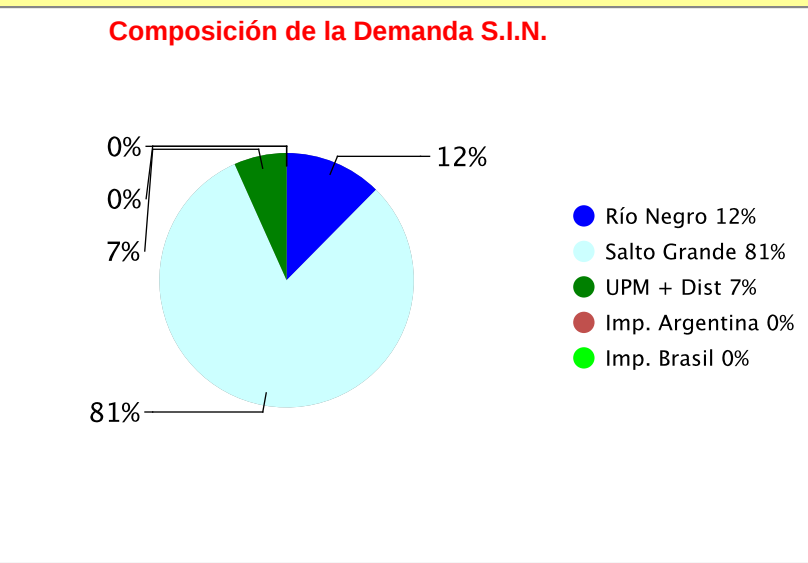



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

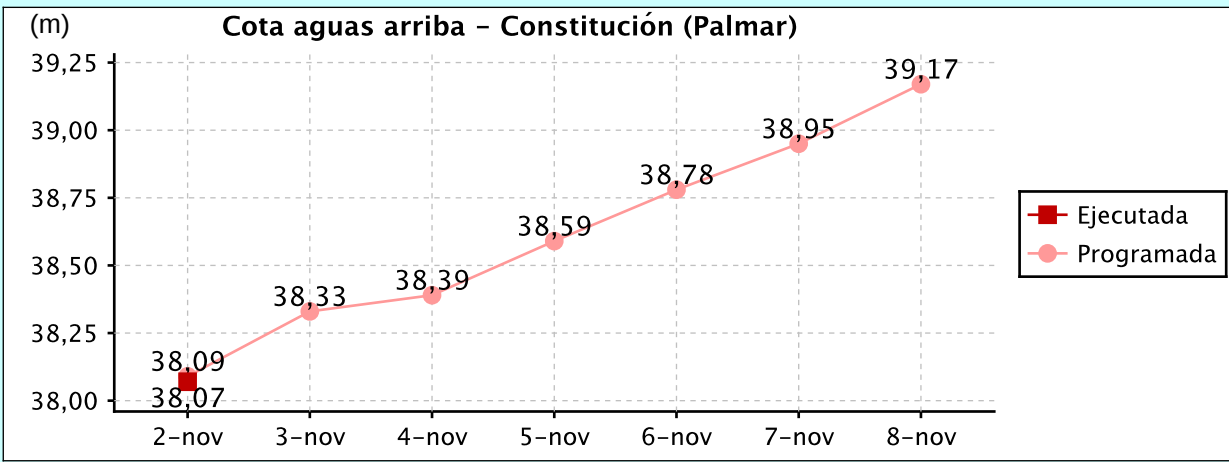
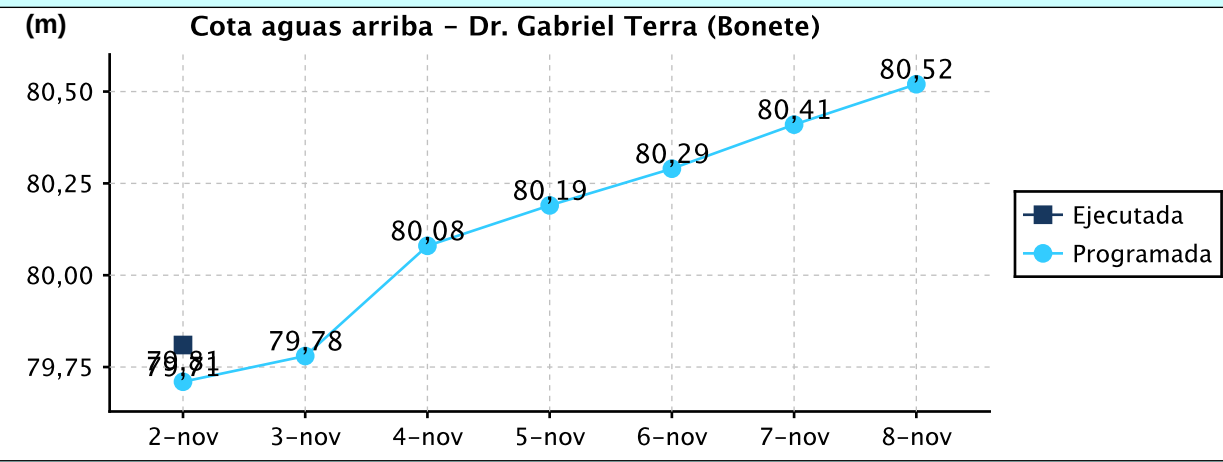


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,71	79,81
Baygorria	53,73	53,57
Palmar	38,09	38,07
SGU	34,60	34,64

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

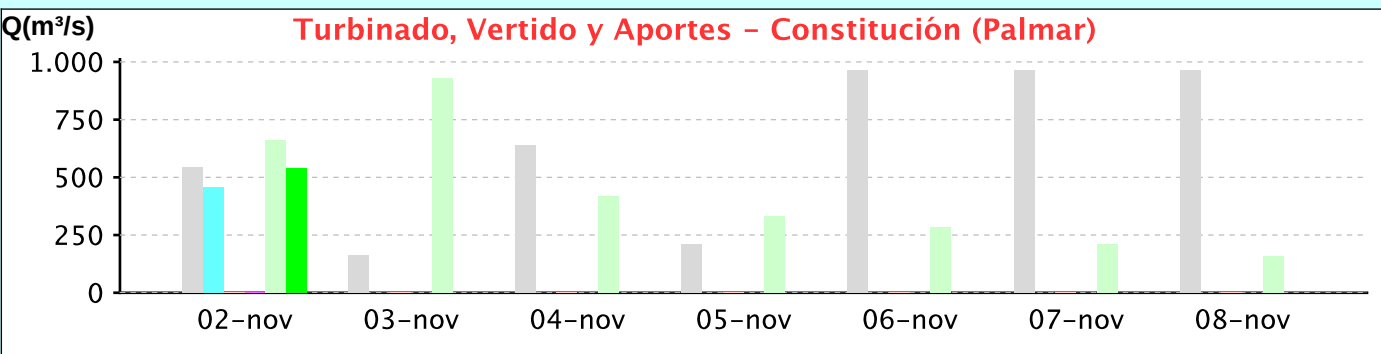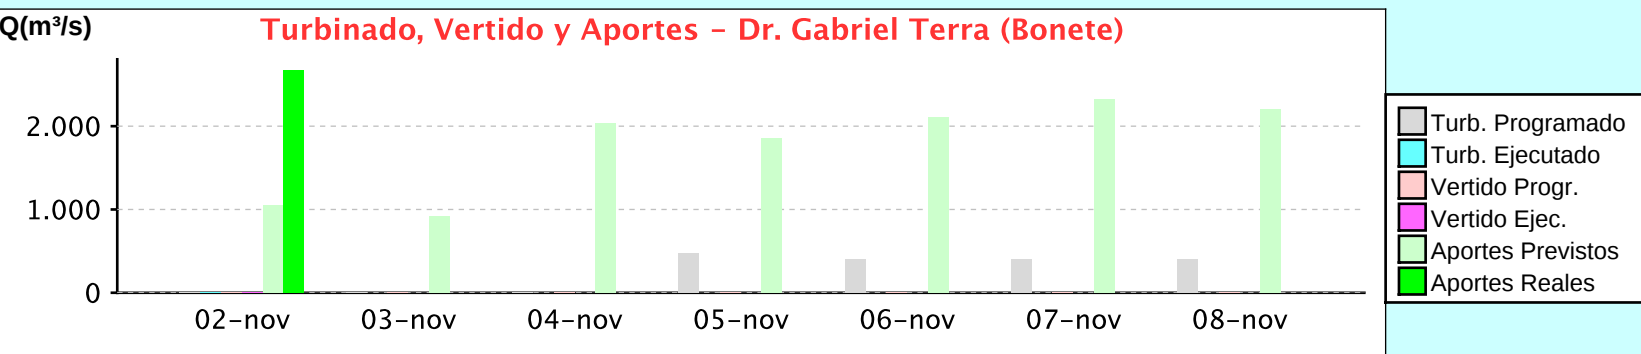

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

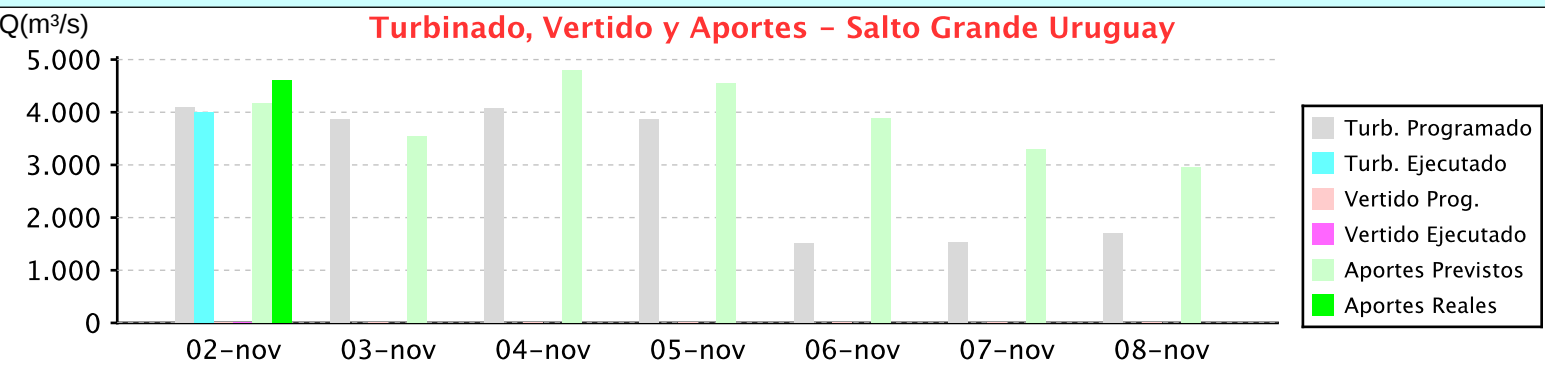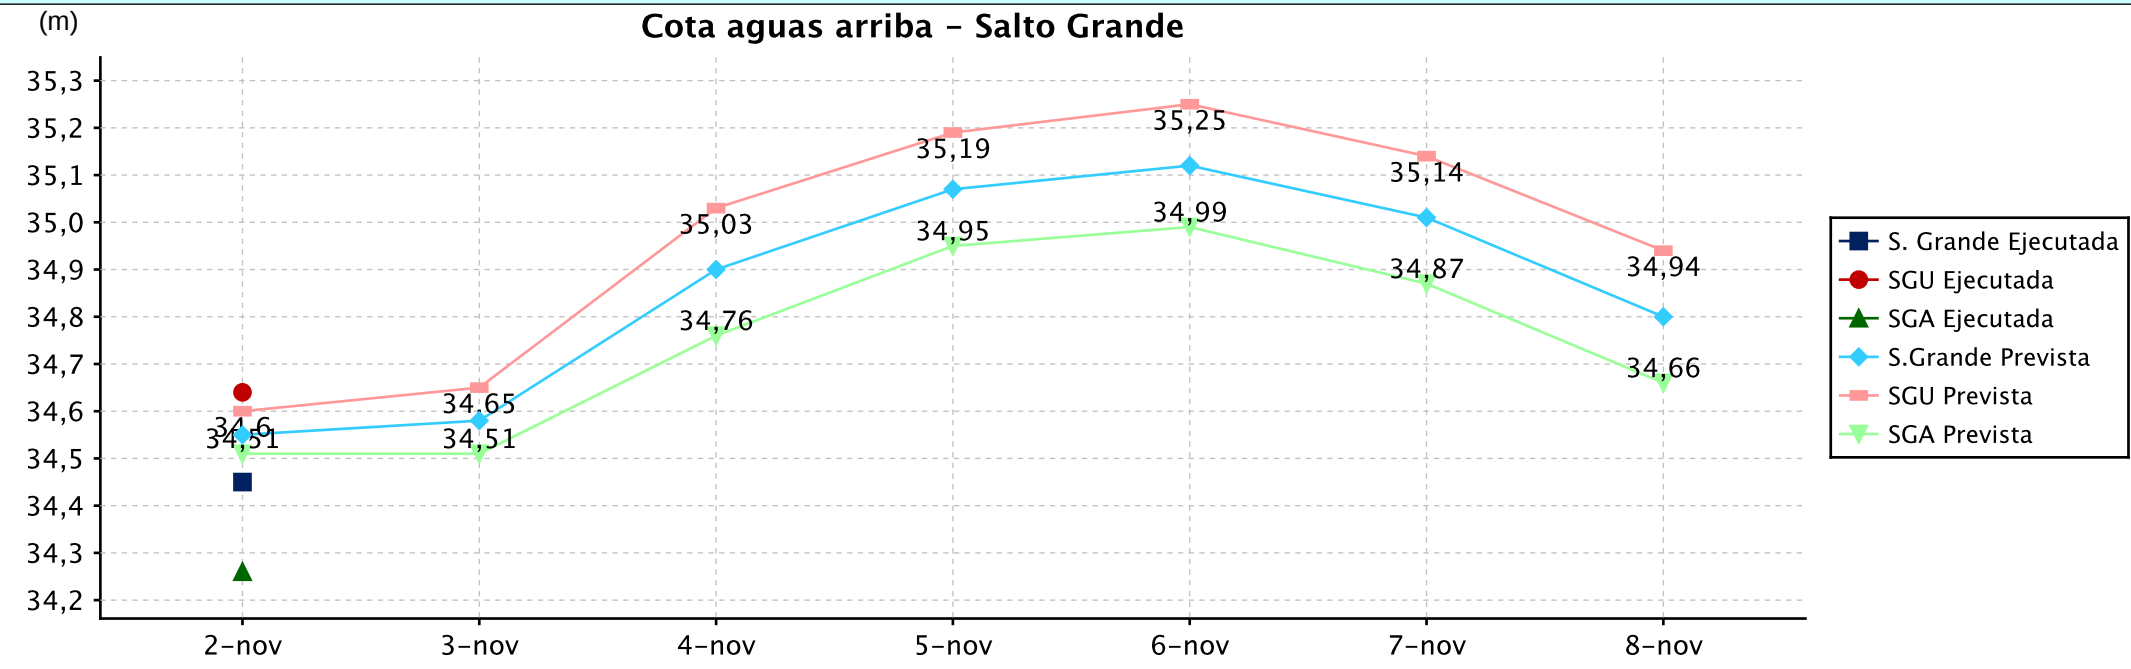

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,64
Cota Vista Arg	34,26
Cota real	34,45
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	8.384

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	11	71
Palmar	544	459
SGU	4.099	3.989

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.055	2.670
Baygorria	498	290
Palmar	662	540
SGU	4.175	4.603

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	200	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
