



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



lunes 04 de noviembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	-7
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-3
Central La Tablada	-90
Central P. del Tigre	-10
APR A	-2
APR B	95
APR C	-3
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.446
C. Baygorria	1.066
C. Palmar	1.679
C. Salto Grande	20.259
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.299
TOTAL Generación	25.731

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.731
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.930
Diferencia (MWh)	-1.199
Ejecutada - Programada	-4,45 %

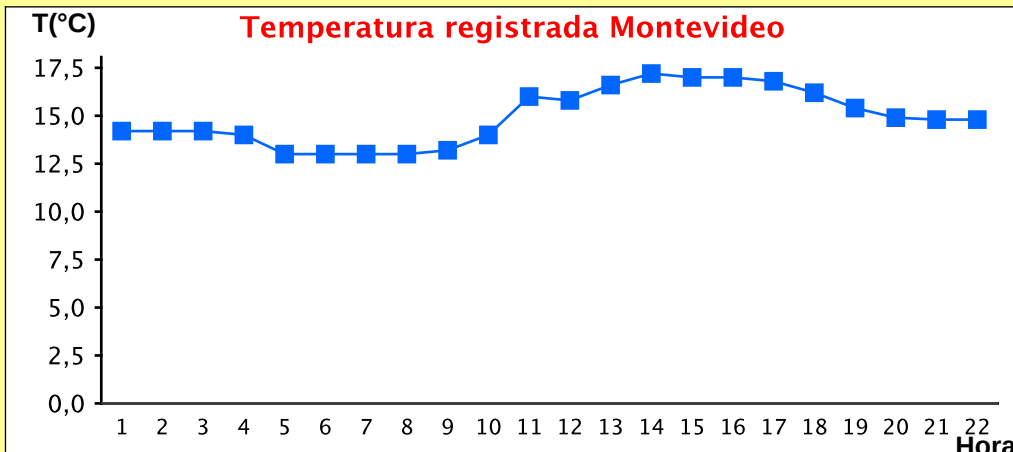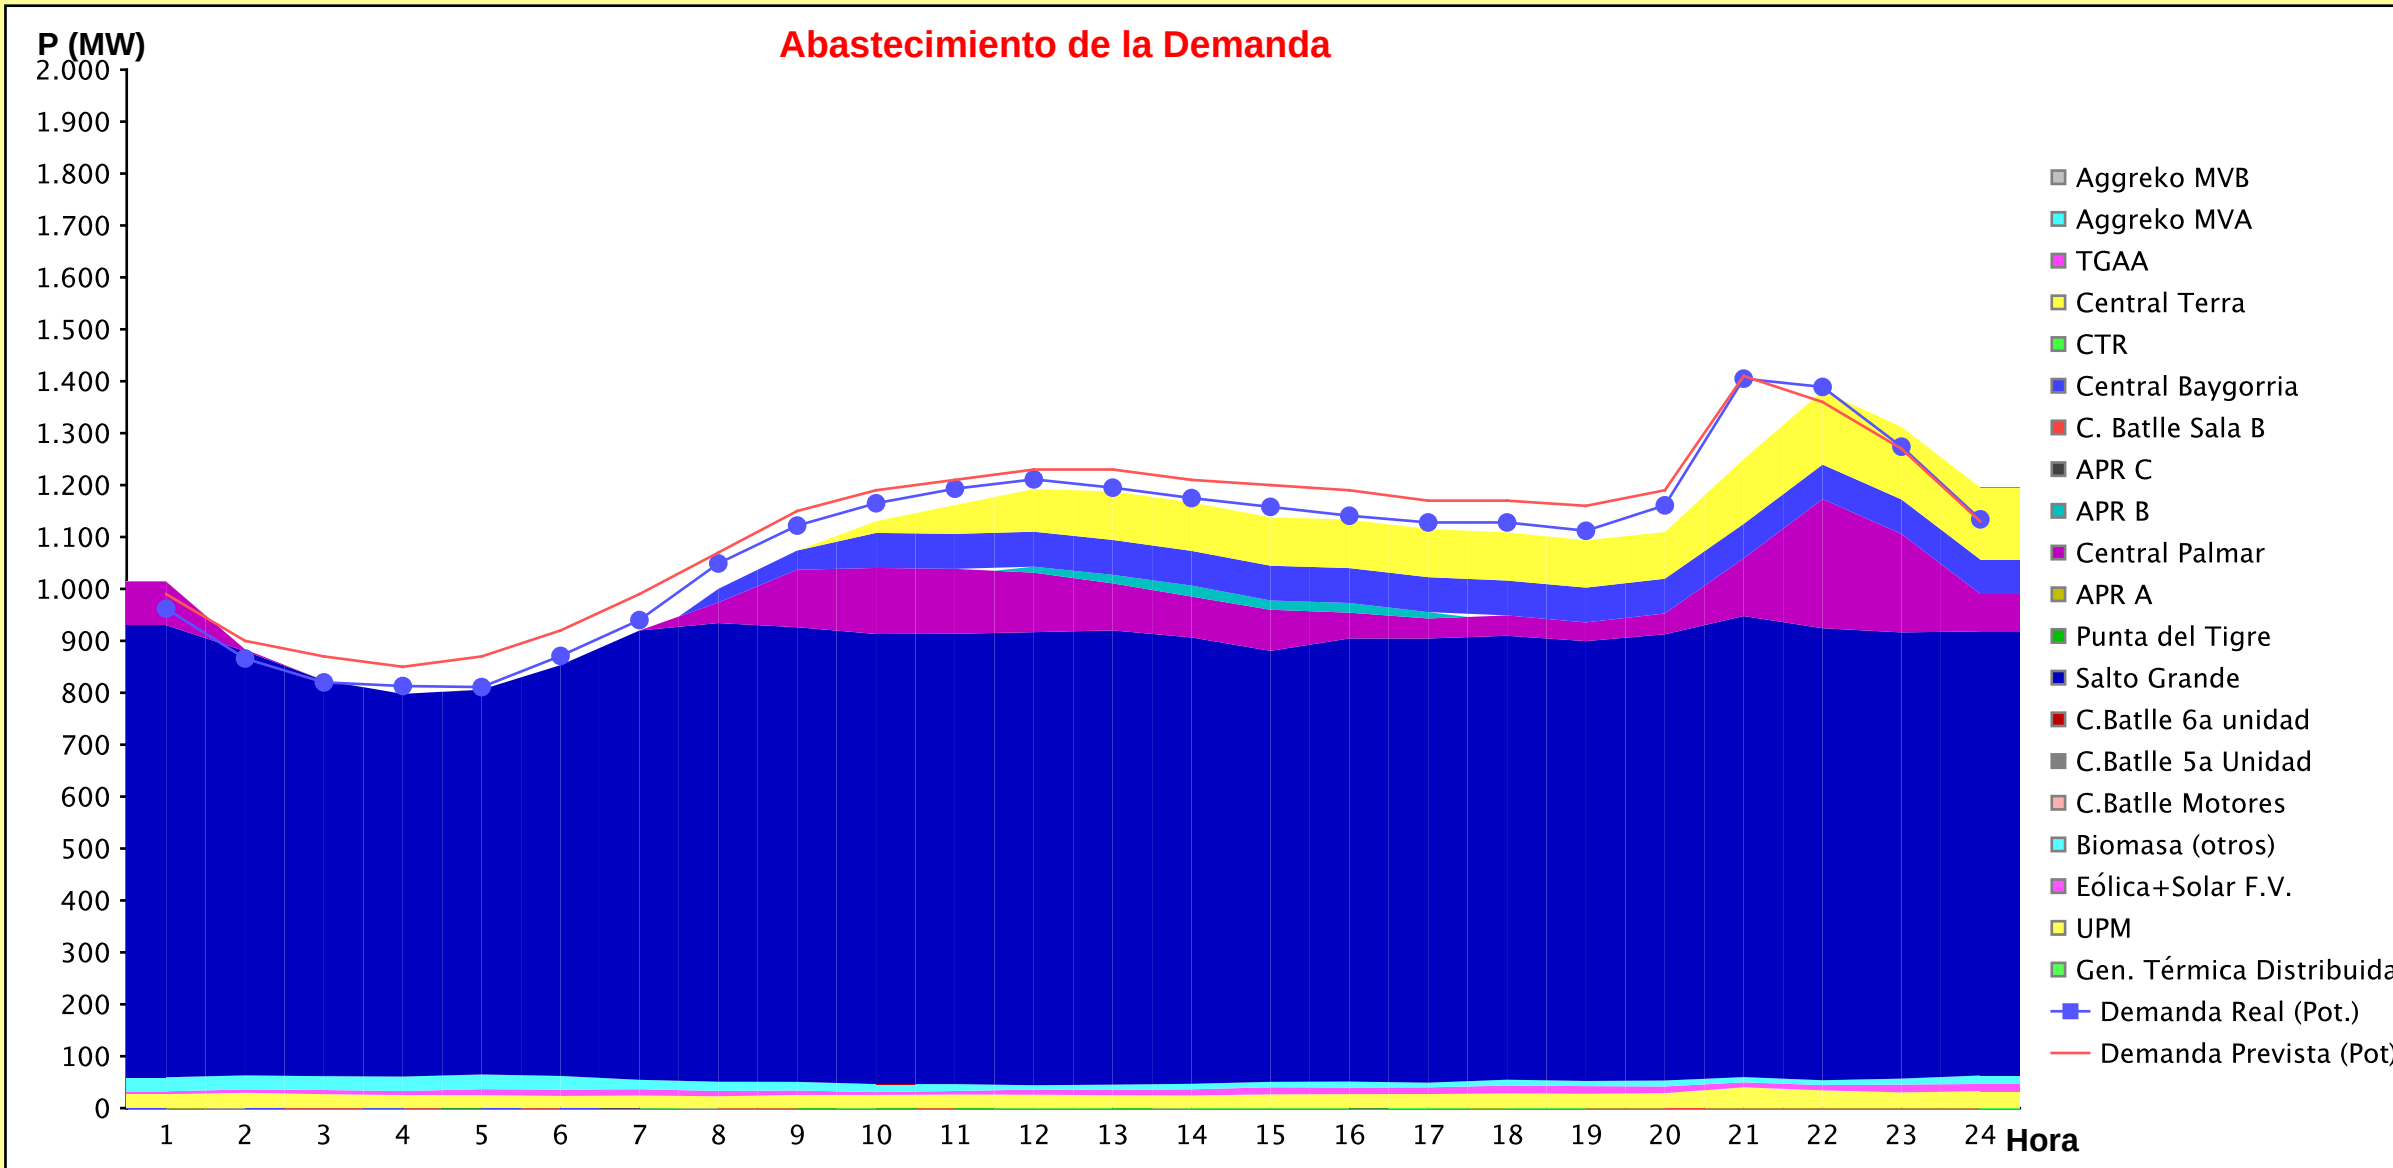



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1201,32 Hora 11:26
Potencia mínima:	776,34 Hora 03:40
Pico noche:	1411,85 Hora 21:20

Generación Media (MW)	
Eólica	11,0
Biomasa	52,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

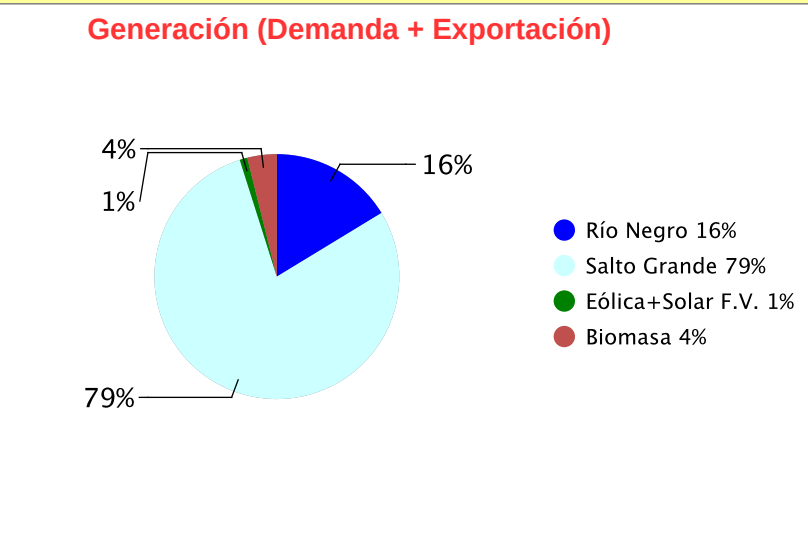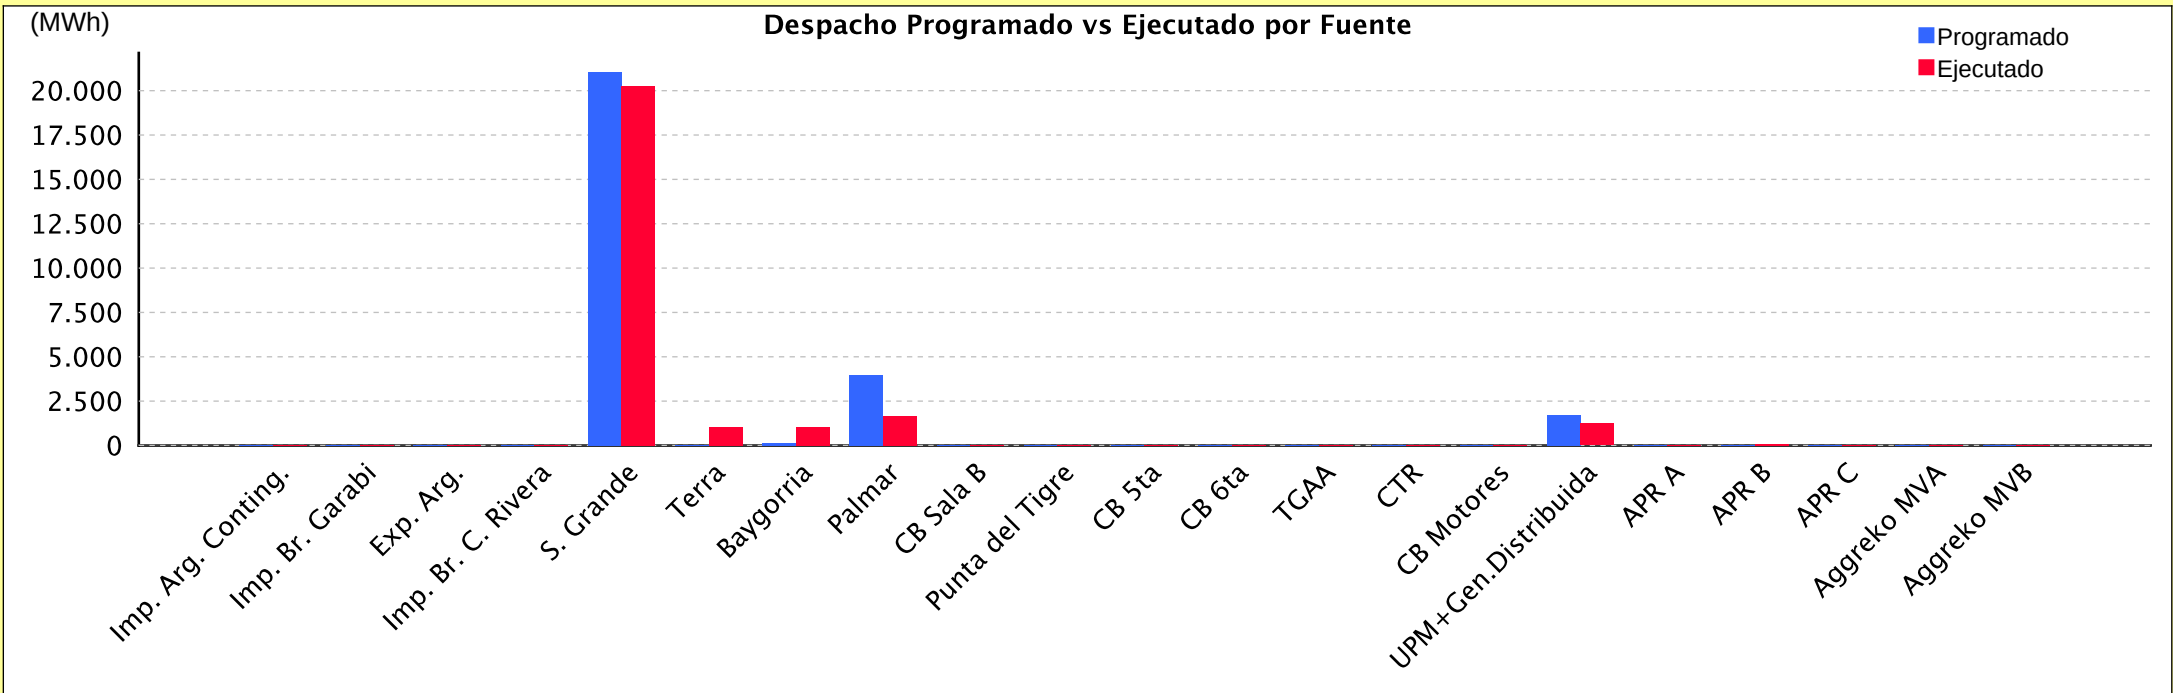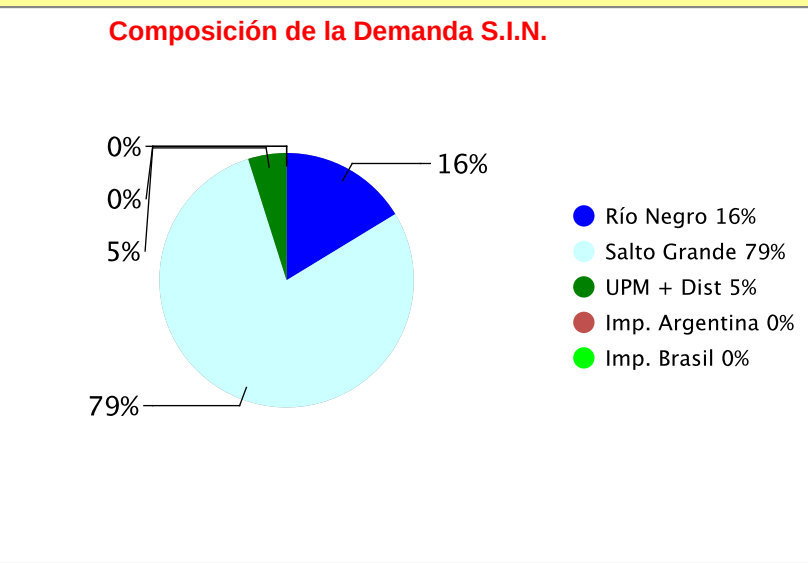



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

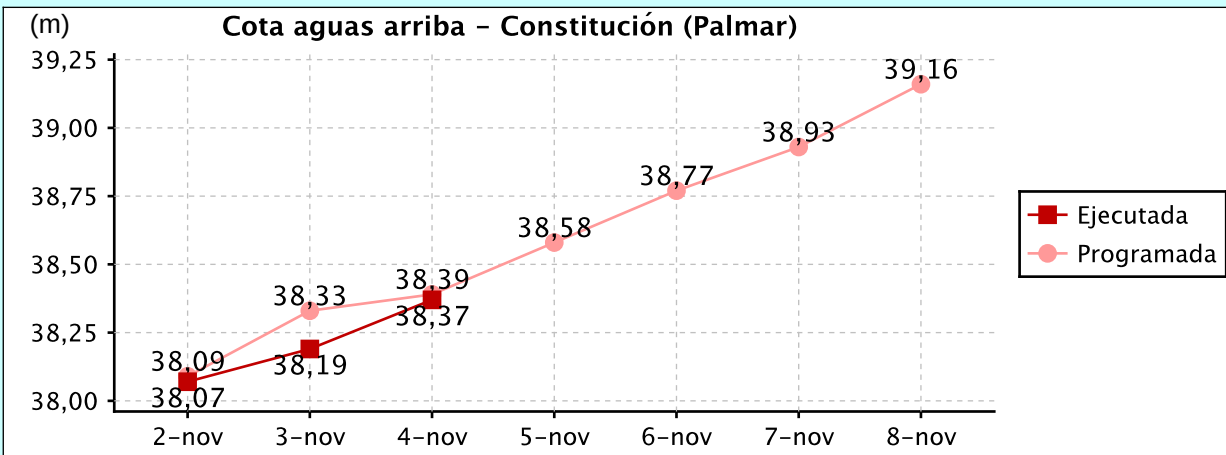
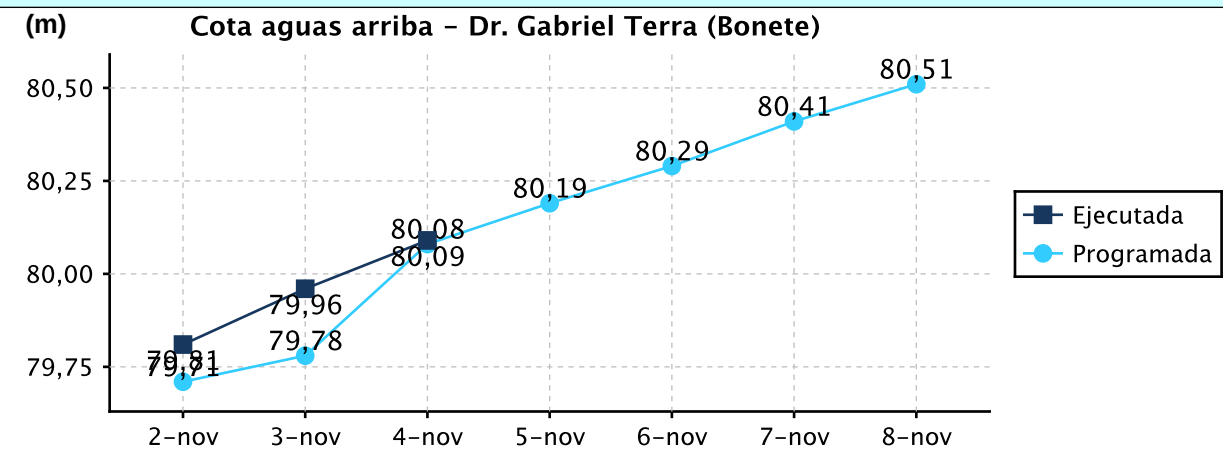


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,08	80,09
Baygorria	54,06	53,86
Palmar	38,39	38,37
SGU	35,03	34,94

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

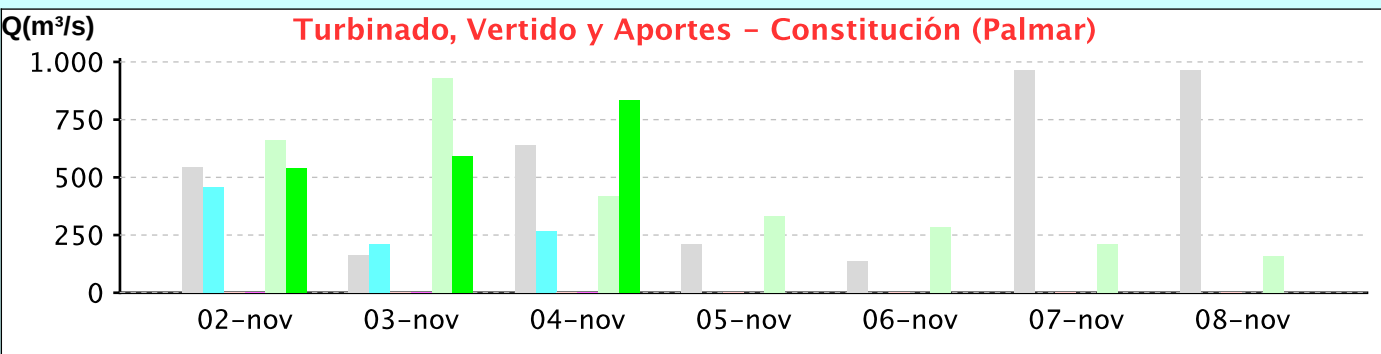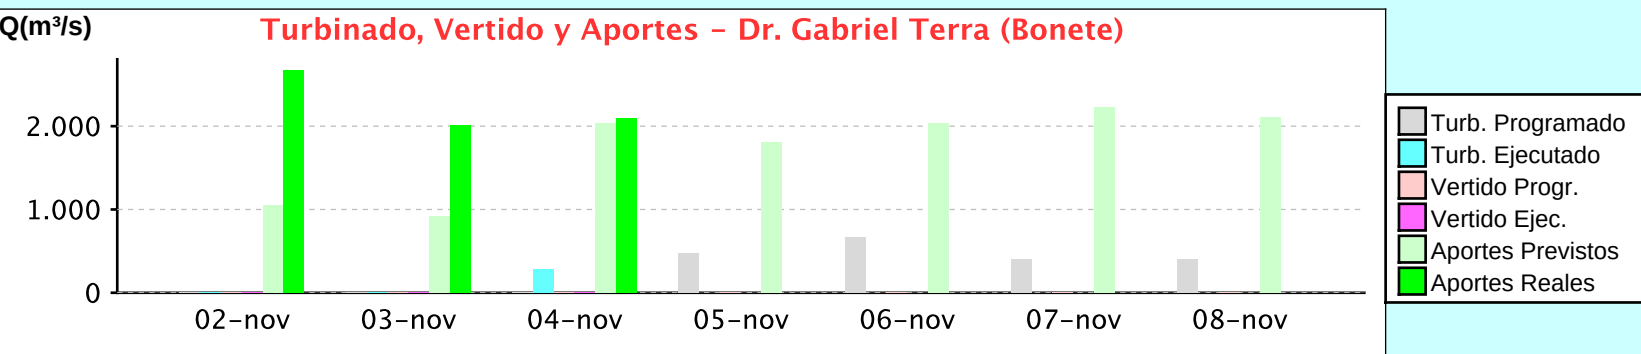

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

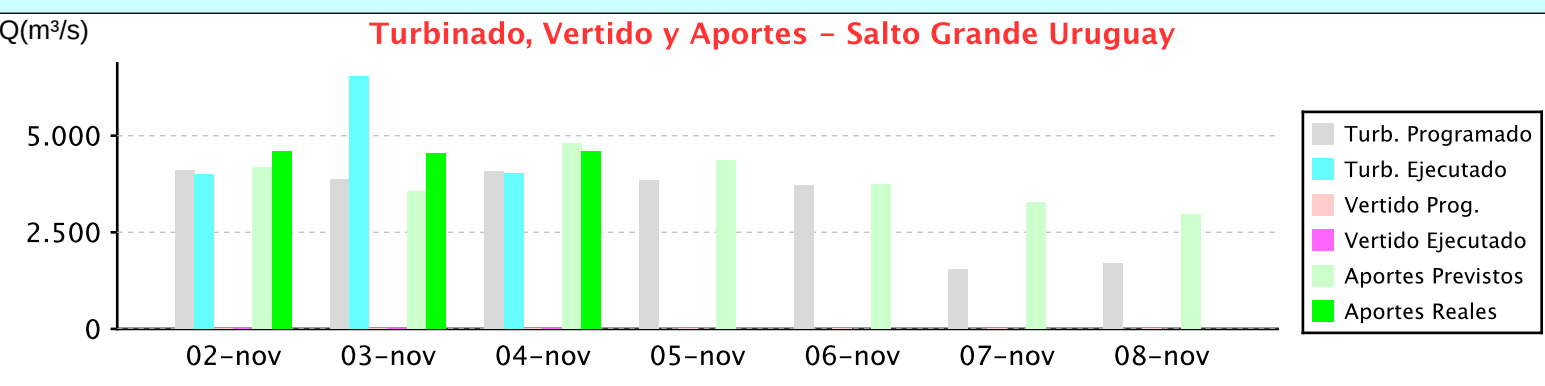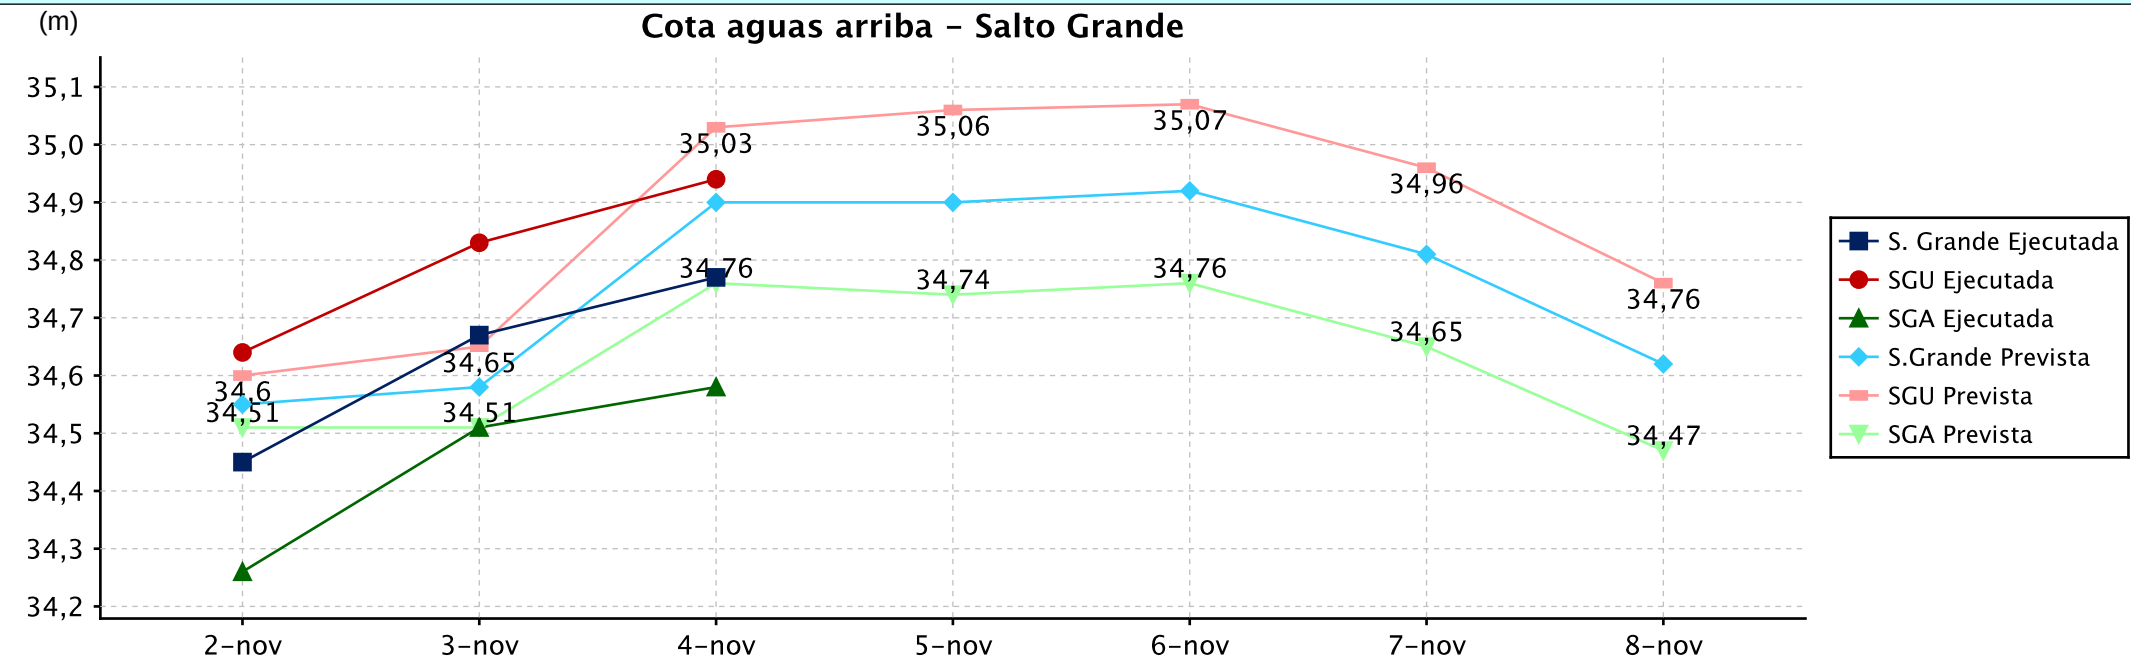

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,94
Cota Vista Arg	34,58
Cota real	34,77

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	8.320
------------------------------------	-------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	10	279
Baygorria	40	347
Palmar	640	266
SGU	4.082	4.014

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	2.036	2.094
Baygorria	75	334
Palmar	417	834
SGU	4.800	4.600

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	200	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

APR B generó por pruebas de 12 a 17 hs.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

05/11/2013 15:32
