



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



martes 05 de noviembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-85
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-3
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.438
C. Baygorria	1.579
C. Palmar	1.300
C. Salto Grande	20.258
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	987
TOTAL Generación	26.454

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.454
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.450
Diferencia (MWh)	4
Ejecutada - Programada	0,02 %

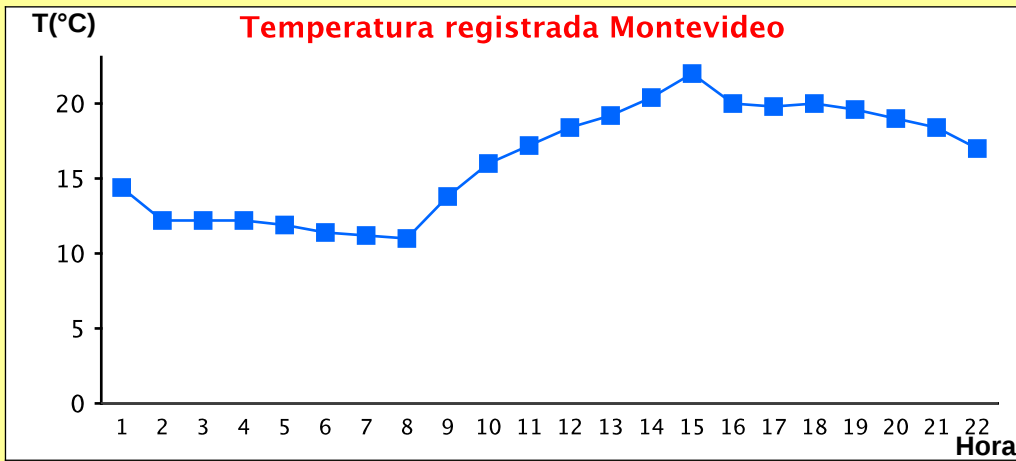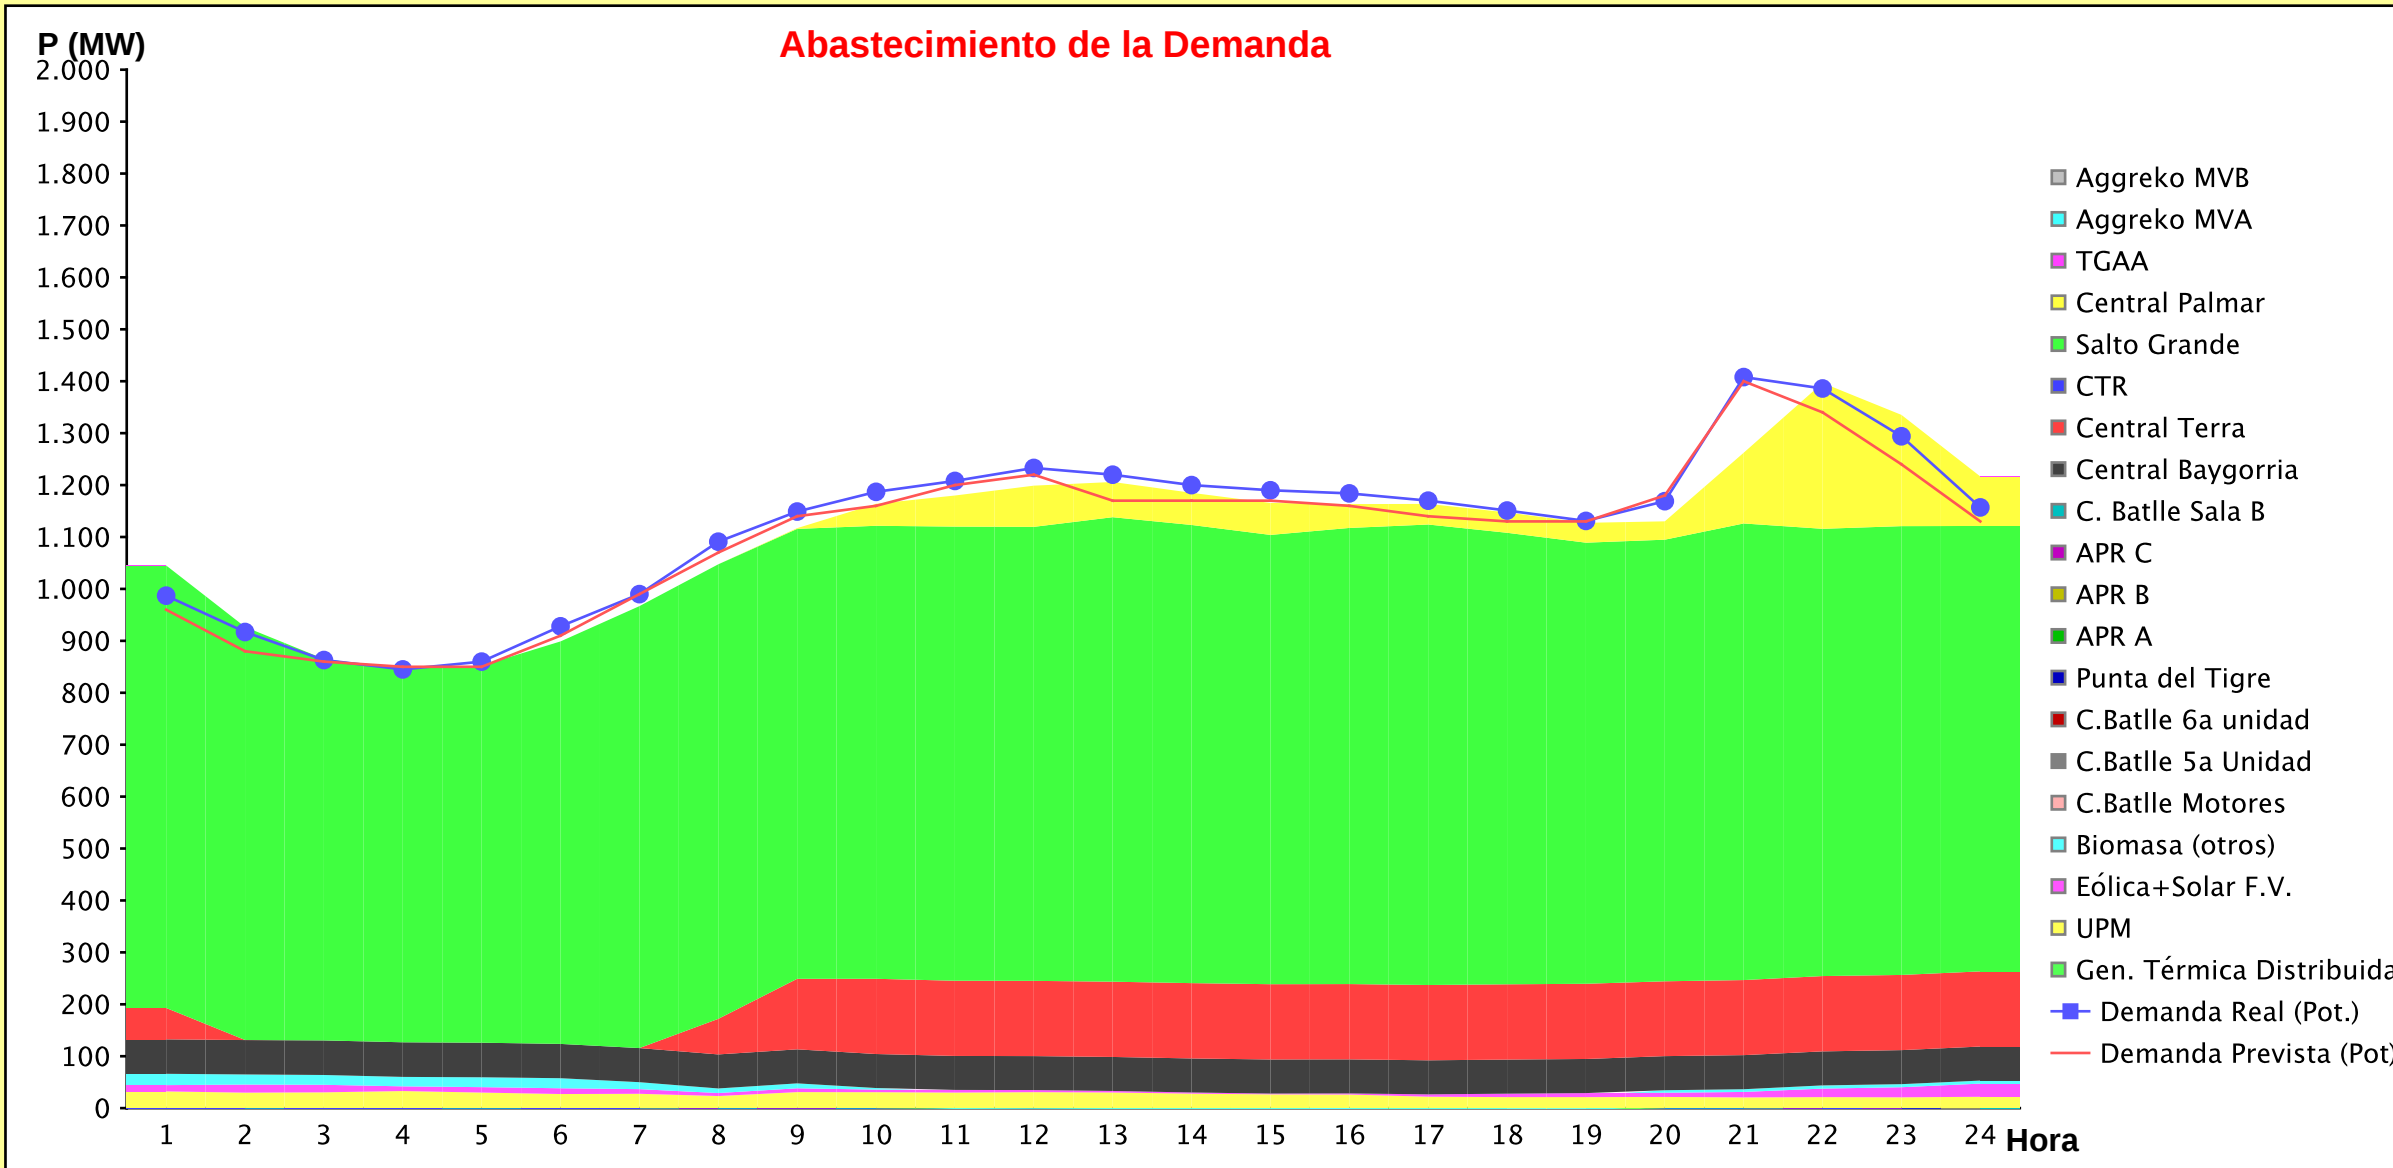



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	0 Hora 00:00
Potencia mínima:	0 Hora 00:00
Pico noche:	0 Hora 00:00

Generación Media (MW)	
Eólica	9,2
Biomasa	40,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

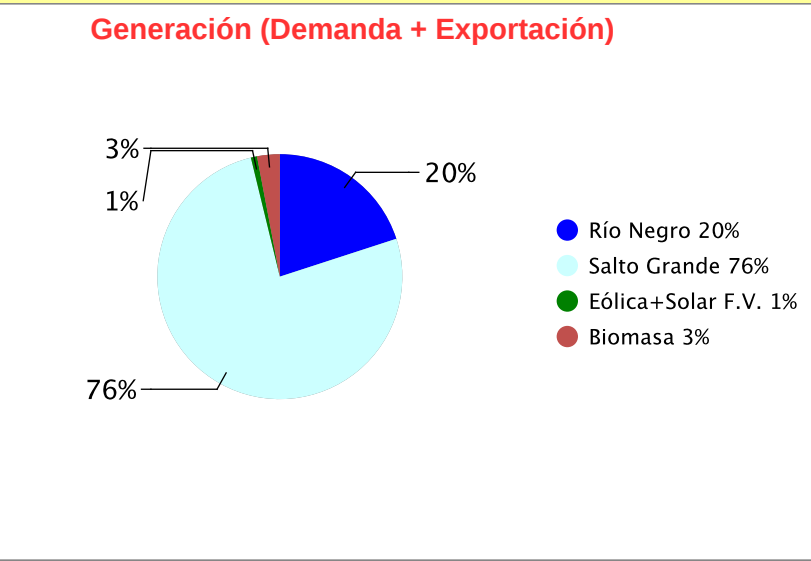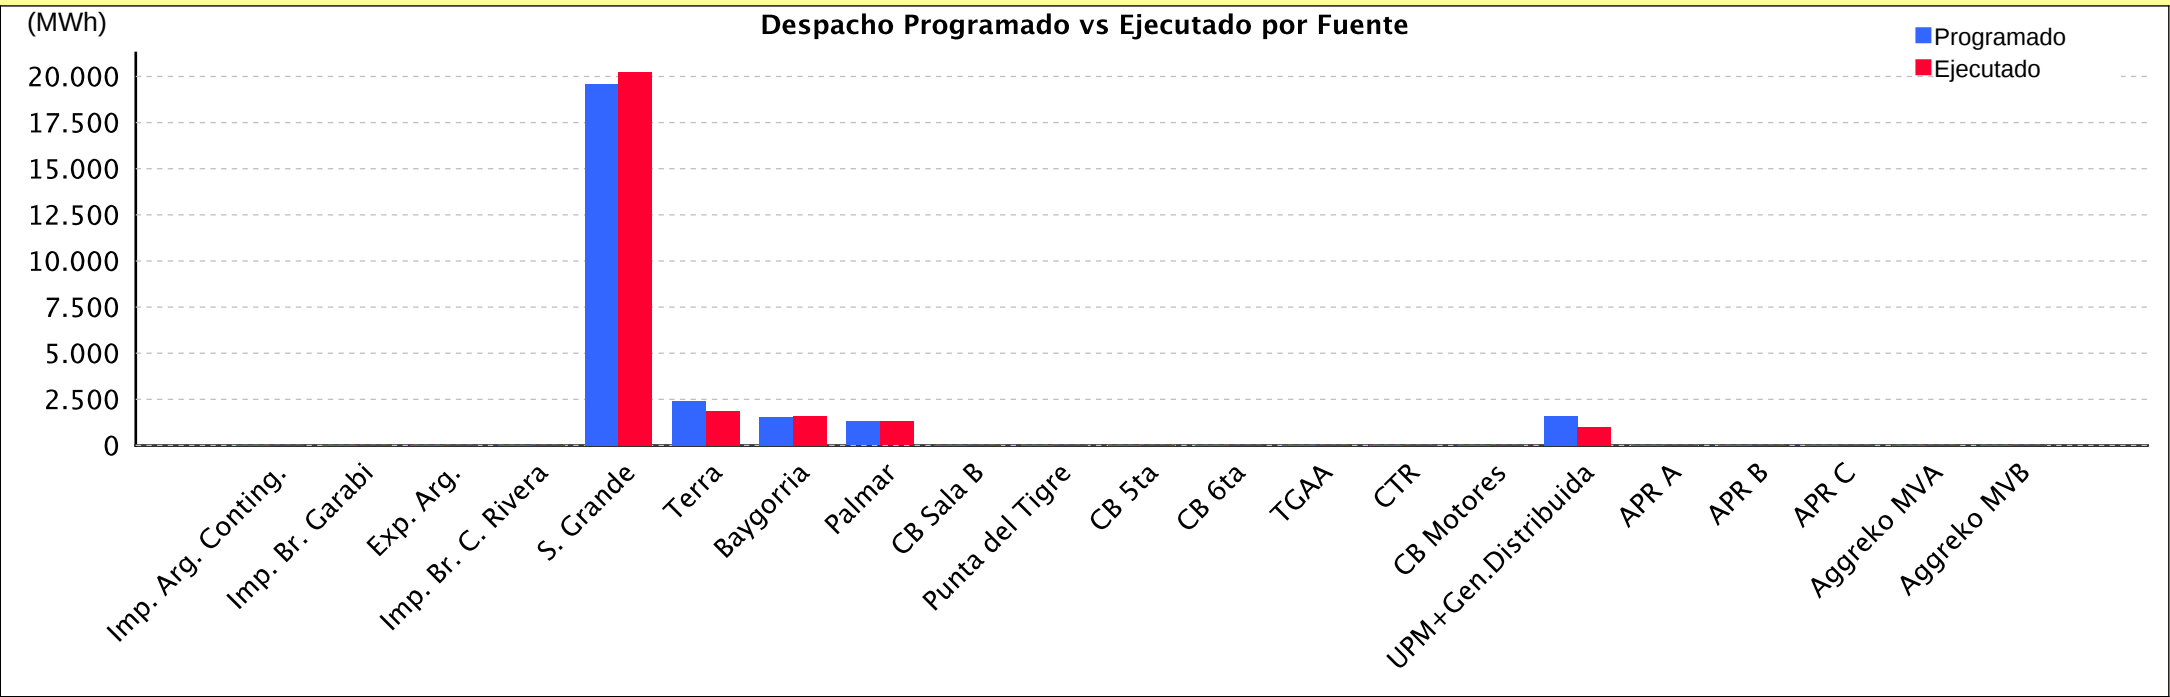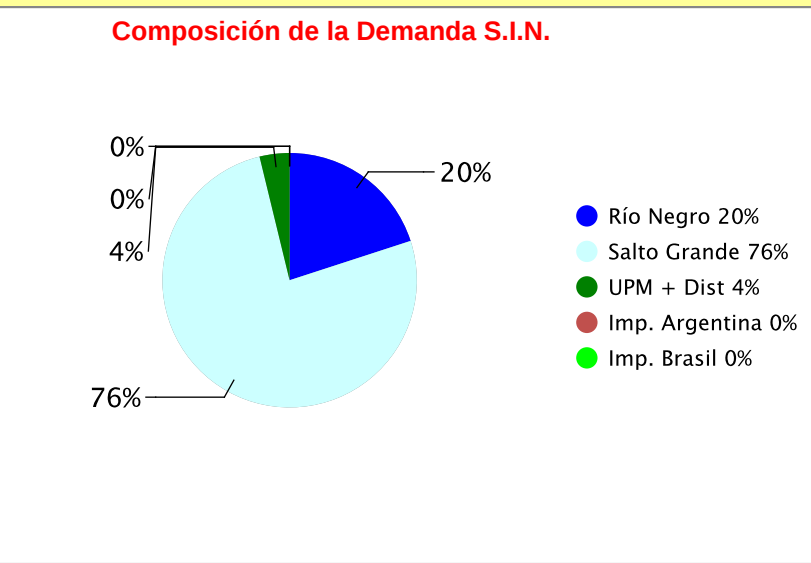



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

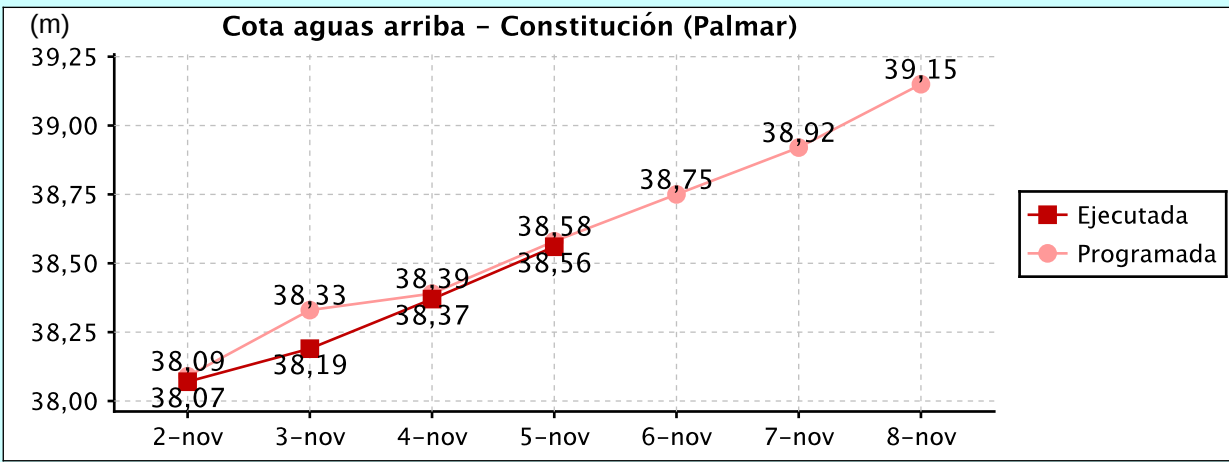
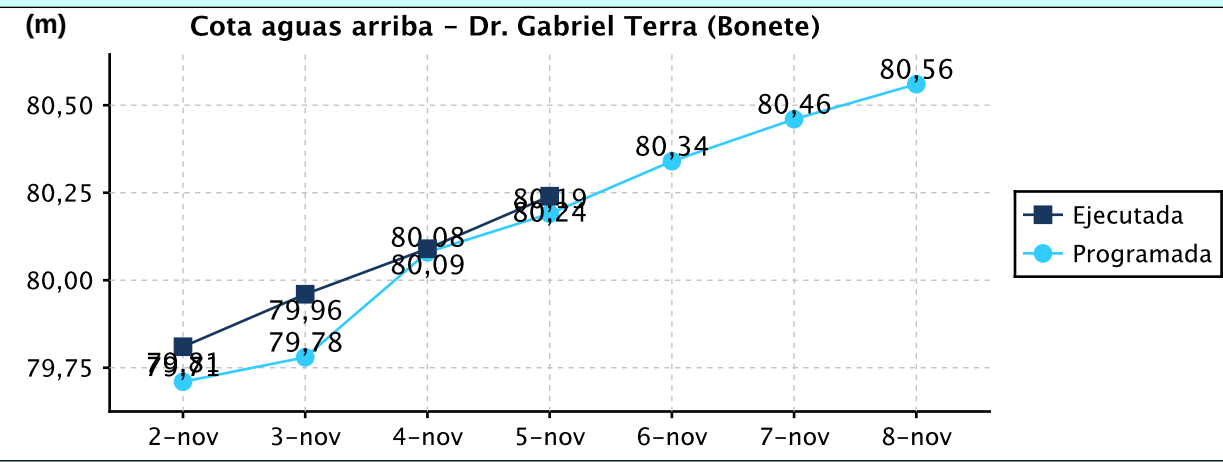


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,19	80,24
Baygorria	53,85	53,87
Palmar	38,58	38,56
SGU	35,06	34,97

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

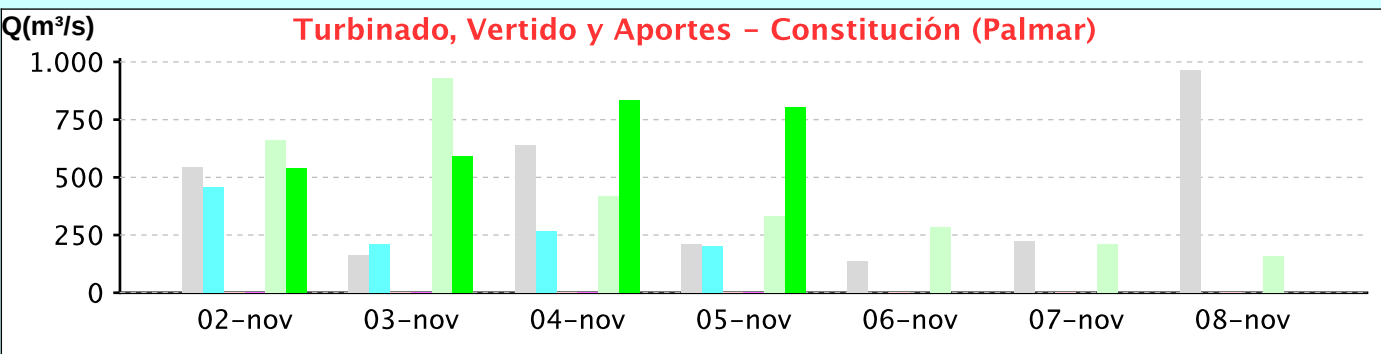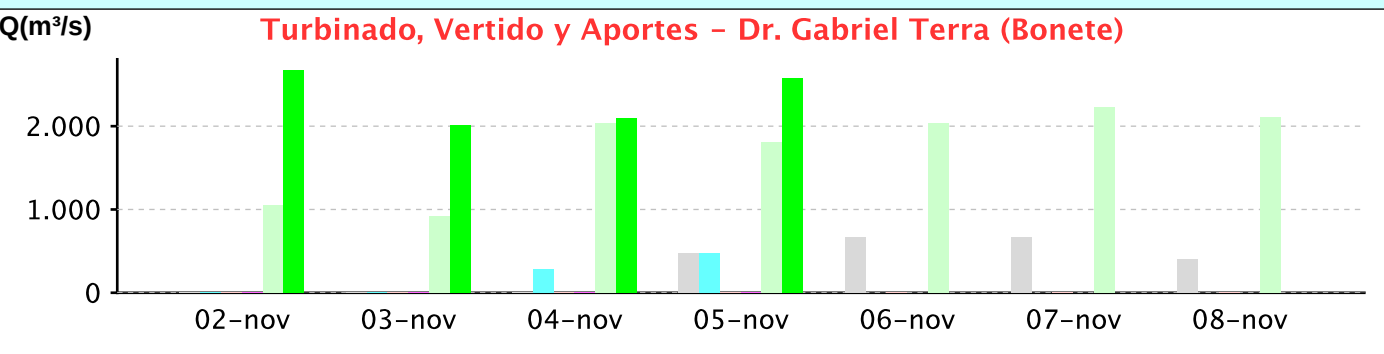

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

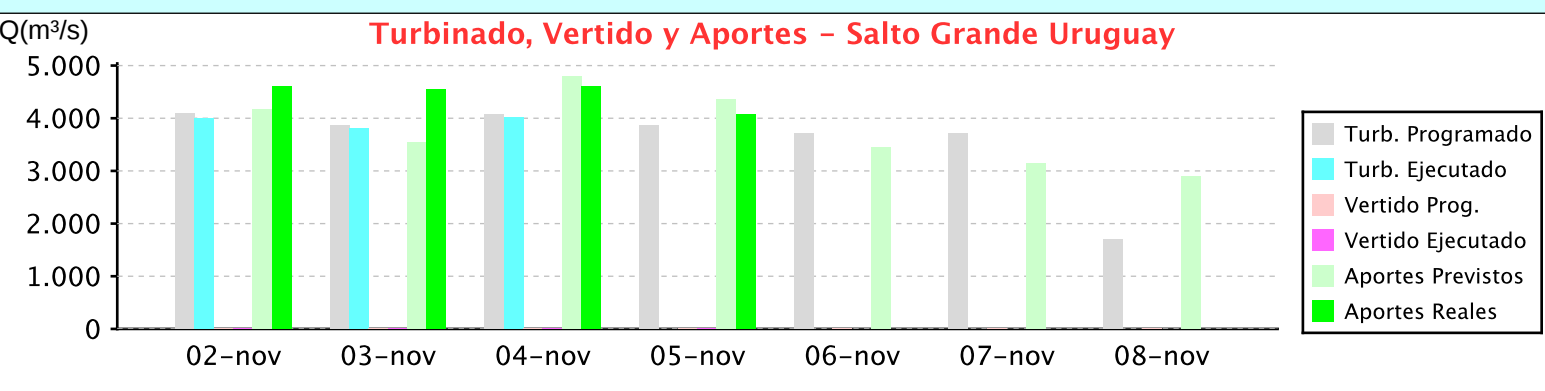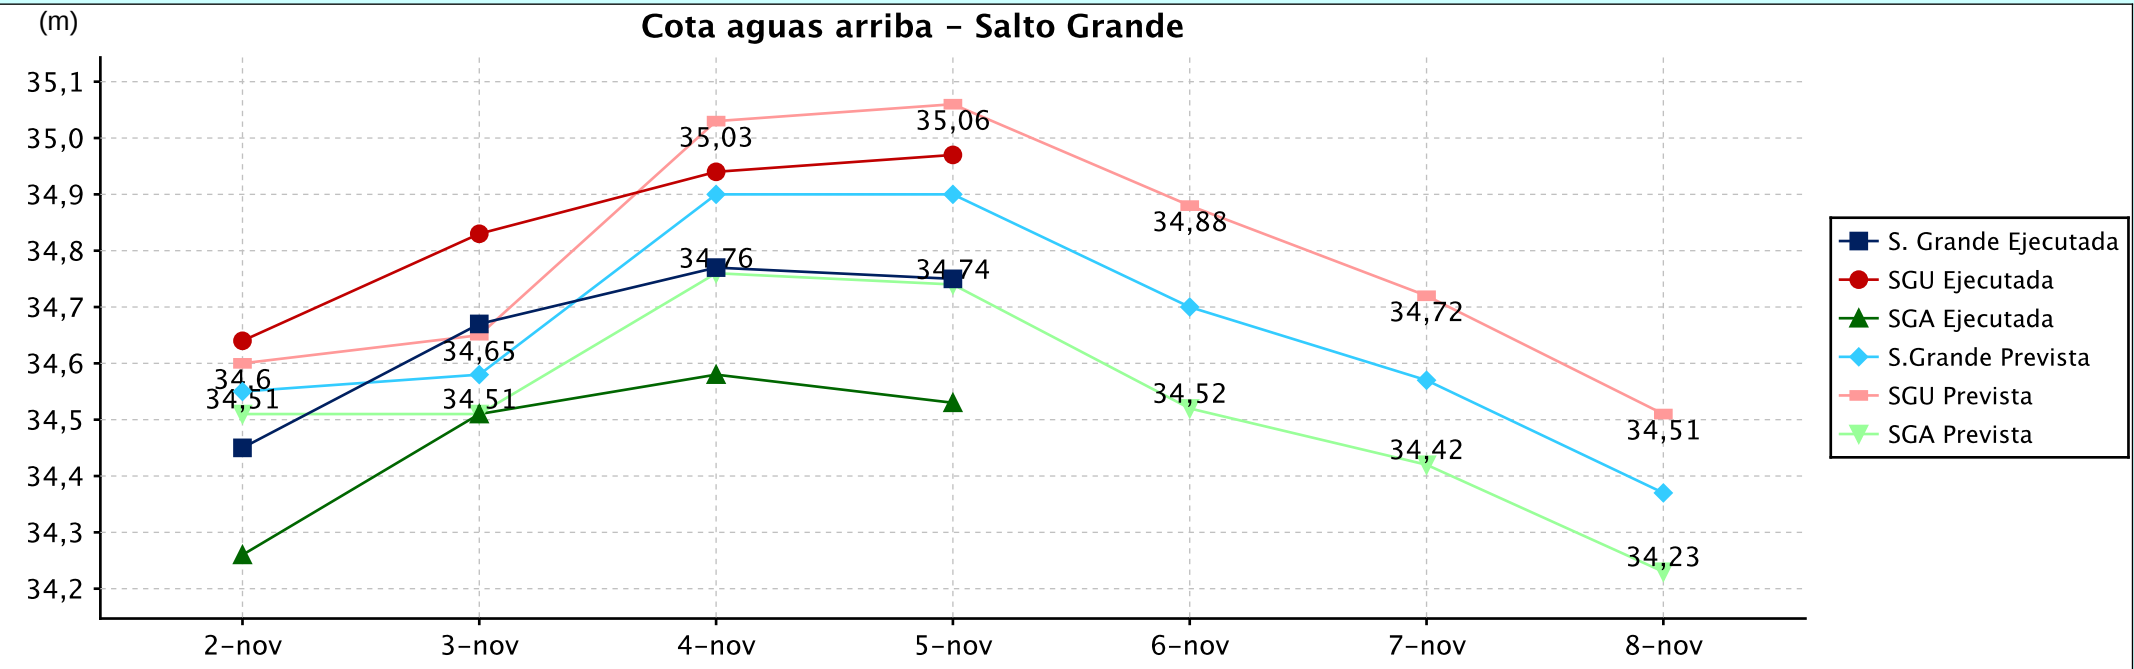

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,97
Cota Vista Arg	34,53
Cota real	34,75

Dif. Energ. (U-A)	10.144
Acumulado MWh	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	476	472
Baygorria	502	504
Palmar	209	201
SGU	3.855	

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.802	2.578
Baygorria	9	528
Palmar	331	804
SGU	4.350	4.064

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Los aportes en SG se mantuvieron en el orden de lo previsto con lluvias y se esperan precipitaciones de relevancia en todas las cuencas de Salto Grande para el Sábado próximo. A su vez, los aportes en Bonete suben de 640 m3/s previstos a 2100 m3/s (ejecutados hasta hoy y previstos para el resto de la semana). Por las cotas actuales y aportes previstos se mantiene el riesgo de Vertimiento en todas las centrales y se cambió el orden de despacho. Al momento no se dispone de valores pico de potencia.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

06/11/2013 18:17
